

EAU DU PAYS DE MONTBÉLIARD

RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE

PM011 PAYS DE MONTBELIARD AGGLOMERATION

opéré par VEOLIA

VEOLIA

SOMMAIRE

1. Présentation du contrat et du service..... 4
1.1. Un dispositif à votre service..... 5
1.2. Données du contrat..... 8
1.3. Chiffres clés du service..... 9
1.4. Principaux indicateurs réglementaires issus du référentiel sispea..... 10
2. L'essentiel de votre service.....16
2.1. Faits marquants du contrat en 2025.....17
2.2. Évolutions réglementaires de 2025 et à venir..... 18
3. Bilan et perspectives du service..... 21
3.1. Bilan conformité et performance des installations.....22
3.2. Bilan énergie.....23
3.3. Gestion de votre patrimoine..... 25
3.4. Sujets à engager pendant le contrat et propositions d'améliorations.....36
3.5. A l'écoute des consommateurs.....40
3.6. Résilience du territoire..... 44
4. Rapport financier du service..... 48
4.1. Compte annuel de résultat de l'exploitation de la délégation.....49
4.2. Situation des biens..... 51
4.3. investissements et renouvellement.....52
5. Données détaillées..... 56
5.1. Collecte.....57
5.2. Traitement..... 62
5.3. Bilan d'exploitation et de conformité..... 65
5.4. Energie et réactifs.....224
5.5. Inventaire des installations.....252
5.6. Gestion des installations.....259
5.7. Réseaux..... 273
5.8. Gestion des réseaux..... 278
5.9. Consommateurs de votre service et leur satisfaction..... 280
6. Annexes.....313
6.1. Engagements à incidence financière..... 314
6.2. Annexes financières.....317
6.3. Détail des textes réglementaires..... 324
6.4. Assurances.....331
6.5. Certificats ISO..... 332
6.6. Autres annexes..... 336
6.7. Glossaire.....337

REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES

Le Règlement Général pour la Protection des Données, entré en vigueur le 25/05/2018, a renforcé les droits et libertés des personnes physiques sur leurs données à caractère personnel. Afin de s'y conformer, les Responsables de traitement des données doivent adapter les mesures de protection les concernant. En conséquence, Veolia Eau France communique à travers le rapport annuel uniquement des données anonymisées ou agrégées.

1. PRÉSENTATION DU CONTRAT ET DU SERVICE

1.1. UN DISPOSITIF À VOTRE SERVICE

VOTRE LIEU D'ACCUEIL

Les usagers des Eaux du Pays de Montbéliard peuvent se rendre sur les 2 lieux d'accueils suivants

Site de Montbéliard
13 Avenue du Président Wilson
25200 Montbéliard

Du lundi au vendredi
de 8h à 11h30
et de 14h à 16h30



Site de Pont de Roide Vermondans
6 Allée Jean Moulin
25150 Pont de Roide Vermondans

Du lundi au vendredi
de 8h à 11h30
et de 14h à 16h30



TOUTES VOS DÉMARCHES SANS VOUS DÉPLACER

Pour toutes les questions relatives aux abonnements contactez-nous du lundi au vendredi de 8h à 19h ou le samedi de 9h à 12h.

03.81.90.25.25

Votre service client en ligne est accessible :

- www.service.eau.veolia.fr
- sur votre smartphone via nos applications iOS et Android.





Vos Urgences 7 Jours Sur 7, 24h Sur 24

Pour toute fuite, incident concernant la qualité de l'eau ou fait anormal touchant le réseau, un branchement, une installation de stockage ou de production d'eau nous intervenons jour et nuit.

03.81.90.25.25

Les interlocuteurs Veolia à vos côtés

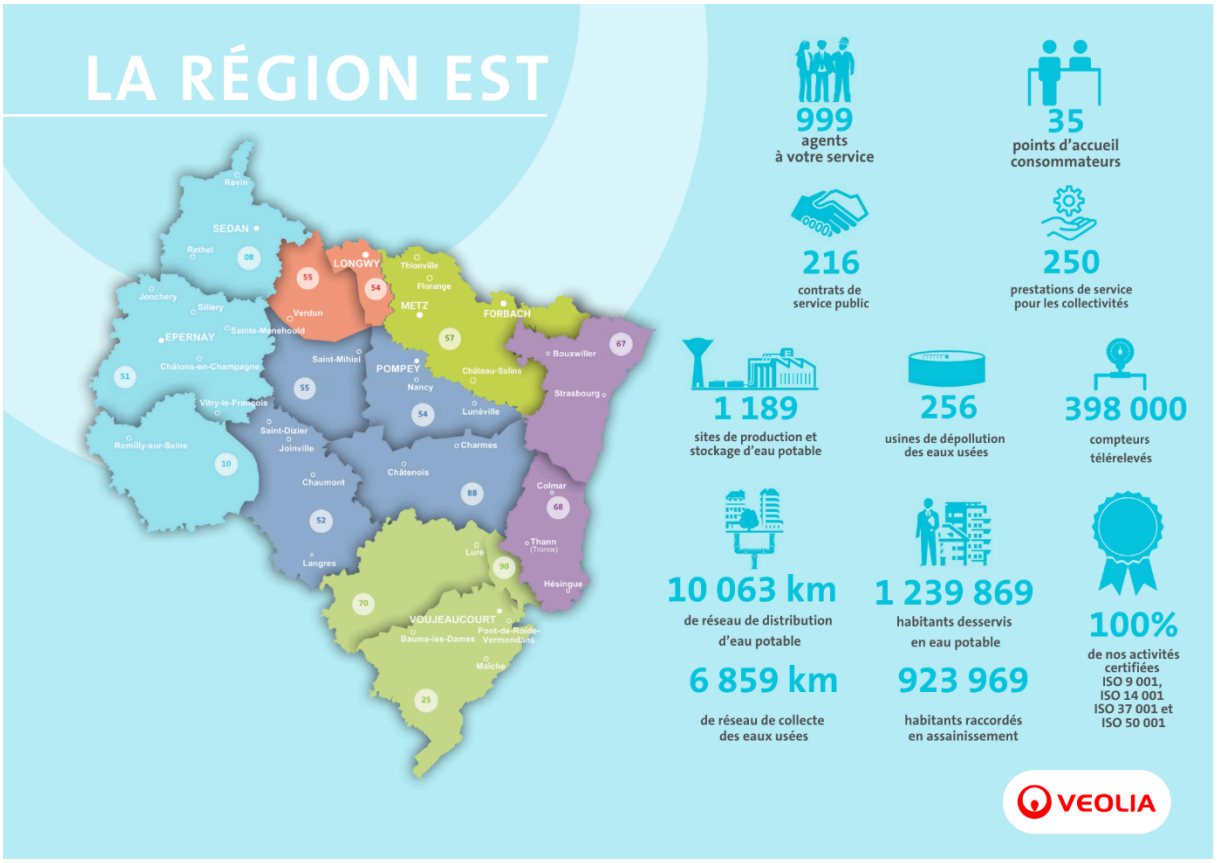

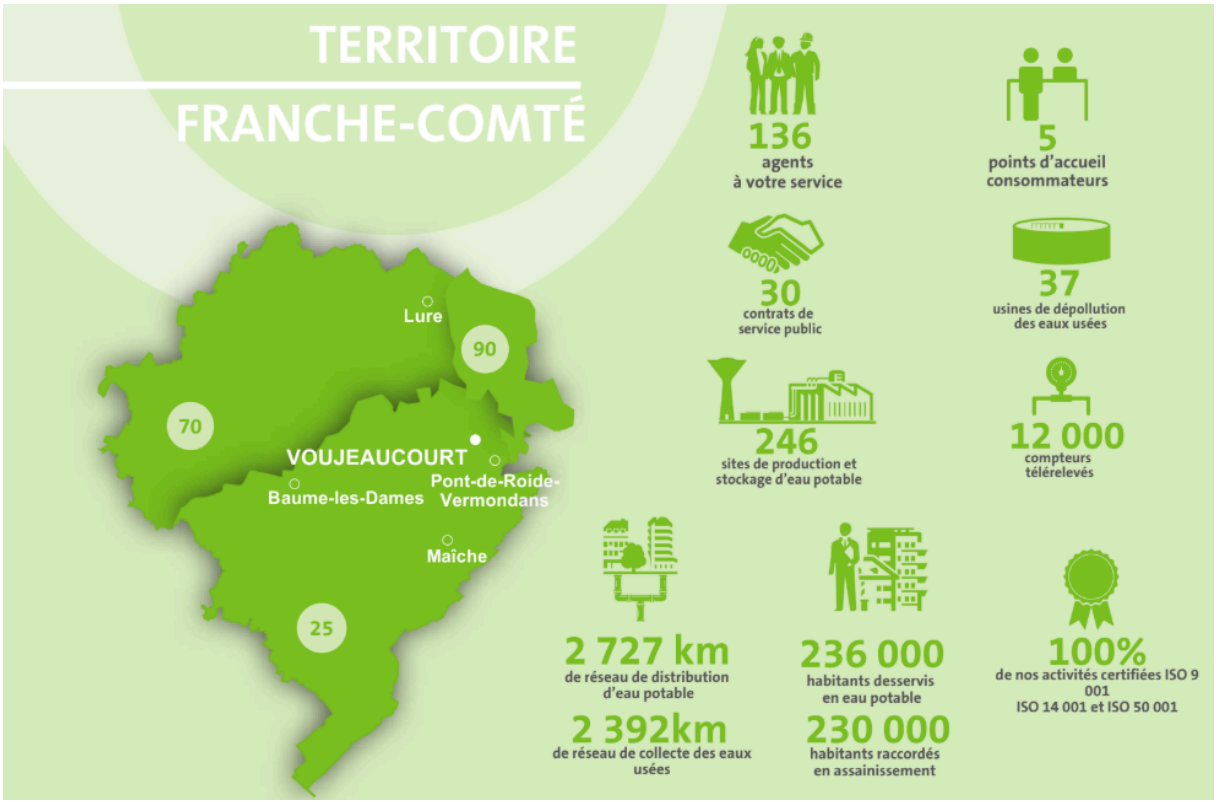

1.2. Données du contrat

- Délégataire : Société des Eaux du Pays de Montbéliard
- Périmètre du service : ABBEVILLERS, ALLENJOIE, ALLONDANS, ARBOUANS, AUDINCOURT, AUTECHAUX ROIDE, BADEVEL, BART, BAVANS, BERCHE, BETHONCOURT, BEUTAL, BLAMONT, BONDEVAL, BOURGUIGNON, BRETIGNEY, BROGNARD, COLOMBIER FONTAINE, COURCELLES LES MONTBELIARD, DAMBELIN, DAMBENOIS, DAMPIERRE LES BOIS, DAMPIERRE SUR LE DOUBS, DAMPJOUX, DASLE, DUNG, ECHENANS, ECOT, ECURCEY, ETOUVANS, ETUPES, EXINCOURT, FESCHES LE CHATEL, FEULE, GLAY, GOUX LES DAMBELIN, GRAND CHARMONT, HERIMONCOURT, ISSANS, LONGEVELLE SUR DOUBS, LOUGRES, MANDEURE, MATHAY, MESLIERES, MONTBELIARD, MONTENOIS, NEUCHATEL URTIERE, NOIREFONTAINE, NOMMAY, PIERREFONTAINE LES BLAMONT, PONT DE ROIDE VERMONDANS, PRESENTEVILLERS, RAYNANS, REMONDANS VAIVRE, ROCHES LES BLAMONT, SAINT JULIEN LES MONTBELIARD, SAINT MAURICE COLOMBIER, SAINTE MARIE, SAINTE SUZANNE, SELONCOURT, SEMONDANS, SOCHAUX, SOLEMONT, TAILLECOURT, VALENTIGNEY, VANDONCOURT, VIEUX CHARMONT, VILLARS LES BLAMONT, VILLARS SOUS DAMPJOUX, VILLARS SOUS ECOT, VOUJEAUCOURT
- Numéro du contrat : PM011
- Nature du contrat : Affermage
- Date de début du contrat : 01/03/2020
- Date de fin du contrat : 28/02/2030


Conventions avec des tiers

Type d'engagement	Tiers engagé	Objet
réception effluent	COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SUD TERRITOIRE	Convention de déversement des effluents de la CCST (Feche l'Eglise) vers PMA
réception effluent	COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES DEUX VALLEES VERTES	Convention de déversement des effluents de CC2VV (Desandans) vers PMA
réception effluent	COMMUNE D'AIBRE	Convention pour le déversement des effluents de la Commune d'Aibre
réception effluent	COMMUNE DE LAIRE	Convention de déversement des effluents de Laire vers PMA
réception effluent	LE VERNOY	Convention de déversement des effluents de Le Vernoy vers PMA

Avenants au contrat

Avenant N°	Date d'effet	Commentaire
1	22/03/2021	Modifications contractuelles
2	01/07/2021	Entretien, contrôle et renouvellement des poteaux incendie
3	01/01/2024	Intégration Dampjoux

1.3. CHIFFRES CLÉS DU SERVICE

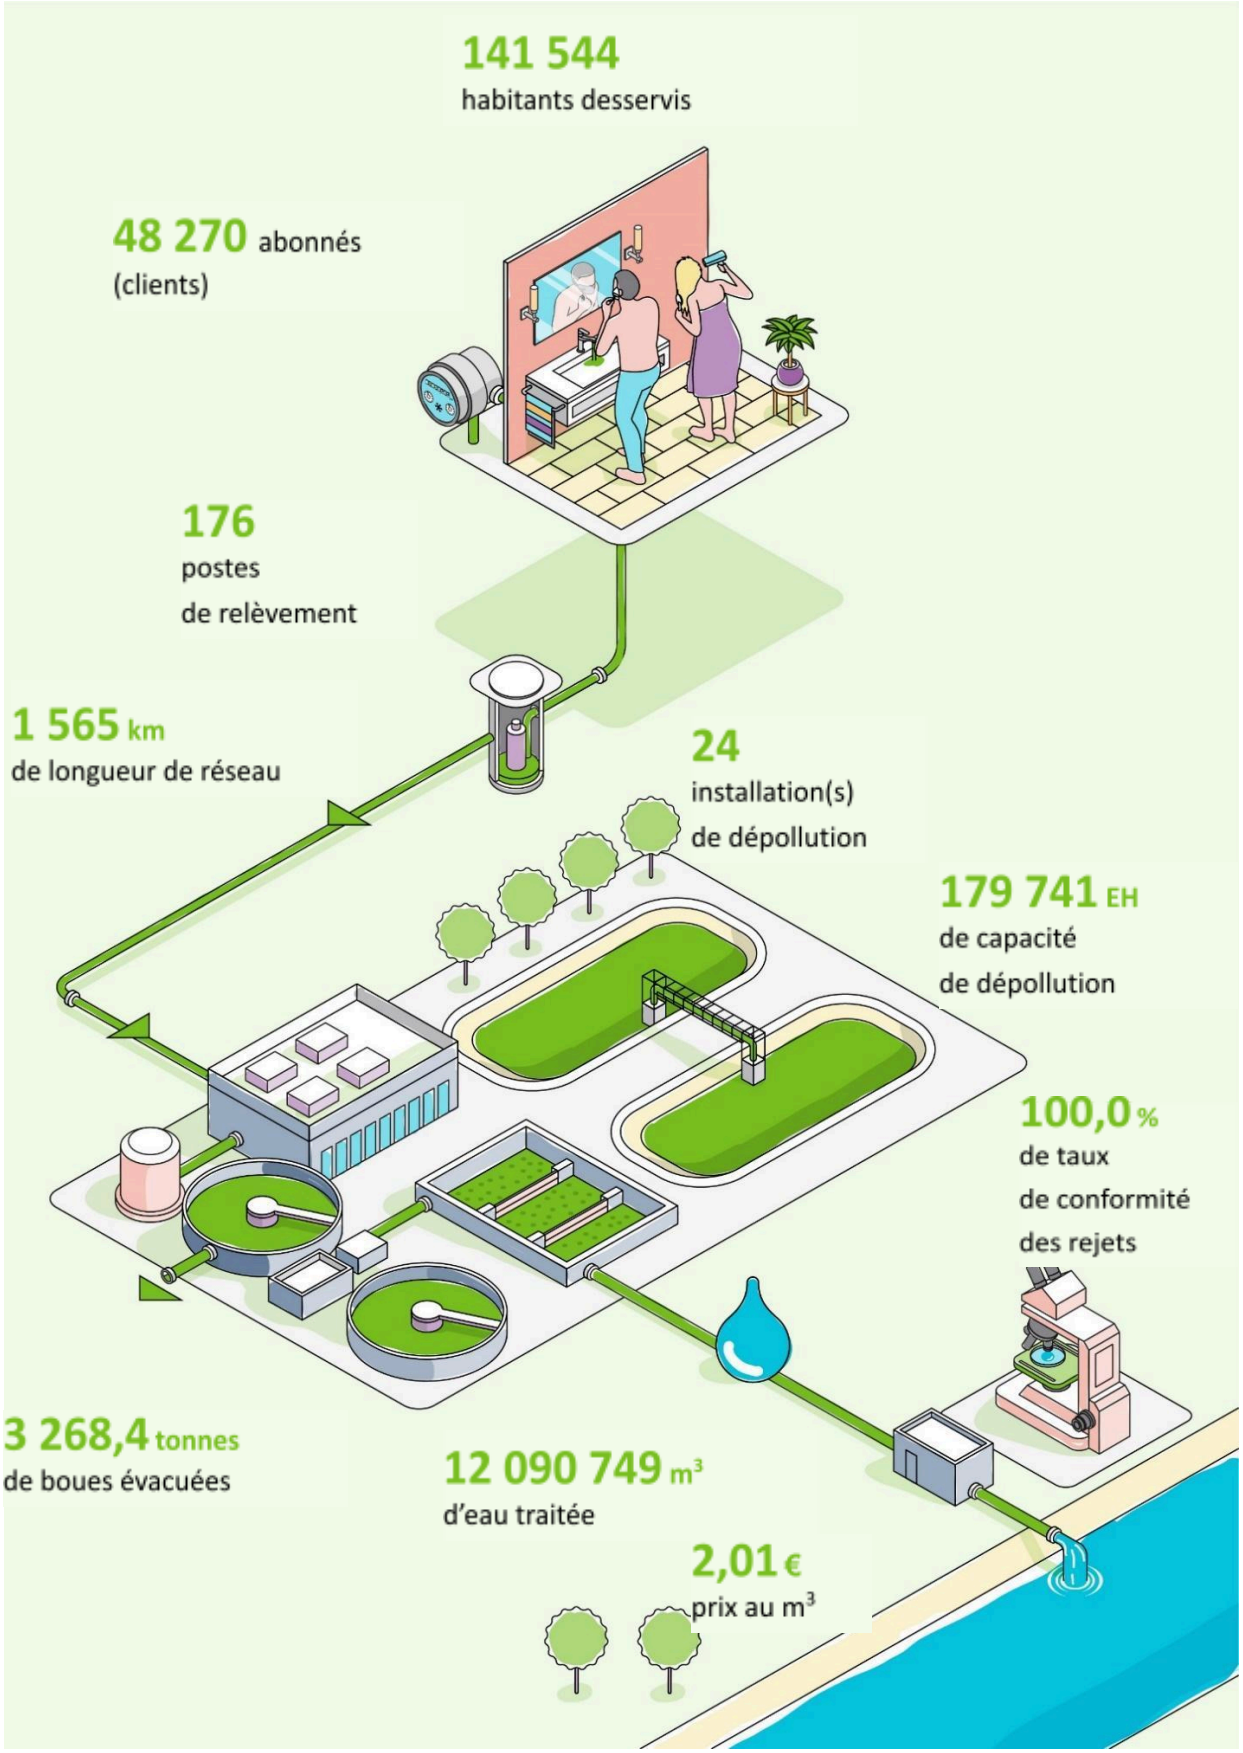

1.4. Principaux indicateurs réglementaires issus du référentiel SISPEA

	2021	2022	2023	2024	2025
D201.0 - Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif (u)	21 720	24 909	142 208	142 278	141 544
D202.0 - Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels (u)	2	2	28	28	27
D203.0 - Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (t)	190,2	161,2	2 417,9	2 742,4	3 268,4
D204.0 - Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ (€\m³)	1,69	1,83	2,04	1,93	2,01
P201.1 - Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées (%)					
P202.2B - Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées (ND)	30	30	70	80	101
P203.3 - Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies aux prescriptions nationales issues de la directive ERU	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
P204.3 - Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (%)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
P205.3 - Conformité de la performance des ouvrages d'épuration du service aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (%)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
P206.3 - Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
P207.0 - Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité (€)	897,59	1 142,75	1 835,78	0,00	618,64
P251.1 - Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers (u/1000 hab.)	0,00	0,00	0,01	0,01	0,03
P252.2 - Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau (u/100 km)	0,88	0,69	3,75	3,76	3,64
P253.2 - Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées (%)	0,00		0,26	0,44	0,28
P254.3 - Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel (%)	87	94	98	97	100
P255.3 - Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées (ND)	20	20	110	110	110
P256.2 - Durée d'extinction de la dette de la collectivité	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
P257.0 - Taux d'impayés sur les factures d'assainissement de l'année précédente (%)	0,85	1,18	1,21	0,66	1,21
P258.1 - Taux de réclamations (u./1000 ab.)	1,02	0,67	0,53	1,55	4,04

(*) Données collectivités
(**) Données Police de l'eau
Les codes mentionnés dans le tableau correspondent aux codes des indicateurs SISPEA.

	2021	2022	2023	2024	2025
Tarifs					
VP.177 - Montant HT de la facture 120m³ au 1er janvier de l'année N+1 revenant au délégataire (€ HT pour 120 m³)			143,50	141,97	139,10
VP.190 - Montant HT de la part fixe annuelle revenant au délégataire sur la facture au 1er janvier de l'année N+1 (€ HT/an)					

VP.178 - Montant HT de la facture 120m³ au 1er janvier de l'année N+1 revenant aux collectivités (€ HT pour 120 m³)			59,46	67,13	76,28
VP.179 -Montant total des taxes et redevances afférentes au service dans la facture 120m³ (€ HT pour 120 m³)			37,66	22,23	25,59
VP.191 - Montant HT de la part fixe annuelle revenant à la collectivité sur la facture au 1er janvier de l'année N+1 (€ HT/an)					
VP.213 - Taux de TVA applicable sur l'ensemble de la facture (%)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
VP.218 - Voies Navigables de France (VNF) Rejets (€HTVA/m³)					
VP.219 - Autres taxes et redevances applicables sur le tarif (€HTVA/m³)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VP.347 - Agence de l'eau - redevance performance des réseaux d'assainissement (€HTVA/m³)				0,0100	0,0307
Réseau					
VP.199 - Linéaire de réseaux de collecte unitaires (km)	44,59	62,55	255,52	245,12	243,63
VP.200 - Linéaire de réseaux de collecte séparatifs eaux usées (hors branchements) (km)	183,93	228,48	703,44	712,01	717,39
VP.077 - Linéaire de réseau hors branchements (km) (Assainissement)	228,51	291,03	958,96	957,13	961,02
VP.046 - Nombre de points noirs (u)	2	2	36	36	35
VP.141 - Linéaire de réseaux renouvelés au cours de l'année (quel que soit le financeur) (km) (*)	0,00	0,15	1,96	2,10	3,81
ICGPR - Plan des réseaux					
VP.250 - Existence d'un plan des réseaux (ND)	10	10	10	10	10
VP.251 - Mise à jour annuelle du plan des réseaux (ND)	5	5	5	5	5
ICGPR - Inventaire des réseaux					
VP.252 - Existence d'un inventaire des réseaux (ND)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres. (%)	97,80	98,20	90,60	91,00	91,60
VP.254 - Mise à jour annuelle de l'inventaire des réseaux à partir d'une procédure formalisée (ND)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
VP.255 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose	2,20	10,70	63,30	64,00	70,00
ICGPR - Autres éléments de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux					
VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie (ND)		52,60	53,80	54,60	55,10
VP.257 - Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes (ND)					10
VP.258 - Inventaire pompes et équipements électromécaniques (ND)			10	10	10
VP.259 - Dénombrement et localisation des branchements sur les plans de réseaux (ND)					
VP.260 - Localisation des autres interventions (ND)			10	10	10
VP.261 - Définition mise en oeuvre plan pluriannuel enquête et auscultation réseau (ND)					10
VP.262 - Mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations (ND)				10	10
ICGPR - Collecte					
VP.158 - Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejets potentiels aux milieux récepteurs (ND)	20	20	20	20	20

VP.159 - Evaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel de rejet (ND)	0	0	10	10	10
VP.160 - Réalisation d'enquêtes de terrain pour reconnaître les points de déversements et mise en œuvre de témoins de rejet au milieu (ND)	0	0	20	20	20
VP.161 - Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet, suivant les prescriptions définies par l'arrêté du 22 décembre 1994 (ND)	0	0	30	30	30
VP.162 - Réalisation d'un rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance des systèmes de collecte et des stations d'épuration (ND)	0	0	10	10	10
VP.163 - Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets sur le milieu récepteur (ND)	0	0	0	0	0
VP.164 - Evaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur (ND)	0	0	10	10	10
VP.165 - Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du système d'assainissement et des rejets des principaux déversoirs d'orage (ND)	0	0	10	10	10

	2021	2022	2023	2024	2025
Boues					
VP.208 - Tonnage total des boues évacuées (tMS)	190,2	161,2	2 417,9	2 742,4	3 268,4
VP.209 - Tonnage total des boues admises par une filière conforme (t)	190,2	161,2	2 417,9	2 742,4	3 268,4
Epuration					
VP.176 - Charge entrante en DBO5 (kg/j)	1 113	1 345	4 738	4 629	4 858
VP.210 - Nombre de bilans sur 24 h réalisés dans le cadre de l'autosurveillance réglementaire conformes (u)	38	73	305	303	319
VP.211 - Nombre de bilans sur 24 h réalisés dans le cadre de l'autosurveillance réglementaire (u)	43	78	316	311	319
Abonnés					
VP.056 - Nombre d'abonnés (u)	8 848	10 420	49 101	48 919	48 270
Gestion Financière					
VP.119 - Somme des abandons de créances et versements à un fonds de solidarité (€) (*)	897,59	1 142,75	1 835,78	0,00	618,64
VP.068 - Volume facturé (m^3)	809 331	957 368	5 704 343	5 967 107	6 222 239
VP.182 - Encours total de la dette	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
VP.183 - Epargne brute annuelle	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
VP.185 - Chiffre d'affaires TTC facturé (hors travaux) au titre de l'année N-1 au 31/12/N) (€)	1 083 212	2 107 812	16 579 472	17 931 010	15 588 675
DC.184 - Montant HT des recettes liées à la facturation pour l'année N (hors travaux) (€HT)					16 134 265
VP.268 - Montant des impayés au 31/12/N des factures émises au titre de l'année N-1 (€)	9 204	24 868	200 692	118 998	188 054
DC.195 - Montant financier des travaux engagés (€)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)

(*) Données collectivités
Les codes mentionnés dans le tableau correspondent aux codes des indicateurs SISPEA.

	VP.210 Nombre de bilans sur 24 h réalisés dans le cadre de l'autosurveillance réglementaire conformes (U)	VP.211 Nombre de bilans sur 24 h réalisés dans le cadre de l'autosurveillance réglementaire (U)	P.254.3 Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel pris en application de la police de l'eau (%)	VP.176 Charge entrante en DBO5 (Kg/j)
LAGUNE BEUTAL village	1	1		9
LAGUNE BRETIGNEY	1	1		4
LAGUNE PRESENTVILLERS	1	1		90
LAGUNE SOLEMONT	1	1		6
STEP ABBEVILLERS	3	3		43
STEP BLAMONT	5	5		54
STEP COLOMBIER FONTAINE	12	12	100	136
STEP DAMBELIN	6	6		32
STEP DUNG	12	12	100	43
STEP ECHENANS	12	12	100	63
STEP ECOT	4	4		23
STEP FEULE Roselière	1	1		9
STEP MONTENOIS	3	3		38
STEP PONT DE ROIDE VERMONDANS	12	12	100	341
STEP ROCHES BLAMONT RIZOSPHÈRE	3	3		
STEP ROCHES LES BLAMONT	3	3		16
STEP SAINT MAURICE COLOMBIER	2	2		29
STEP SAINTE MARIE	2	2		14
STEP VILLARS LES BLAMONT Rhizo	1	1		10
UDEP ARBOUANS	105	105	100	1 805
UDEP BAVANS	24	24	100	317
UDEP SAINTE SUZANNE	105	105	100	1 776

PMA - SECTEUR PERI URBAIN ASS

	VP.210 Nombre de bilans sur 24 h réalisés dans le cadre de l'autosurveillance réglementaire conformes (U)	VP.211 Nombre de bilans sur 24 h réalisés dans le cadre de l'autosurveillance réglementaire (U)	P.254.3 Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel pris en application de la police de l'eau (%)	VP.176 Charge entrante en DBO5 (Kg/j)
LAGUNE BEUTAL village	1	1		9
LAGUNE BRETIGNEY	1	1		4
LAGUNE PRESENTVILLERS	1	1		90

LAGUNE SOLEMONT	1	1		6
STEP ABBEVILLERS	3	3		43
STEP BLAMONT	5	5		54
STEP COLOMBIER FONTAINE	12	12	100	136
STEP DAMBELIN	6	6		32
STEP DUNG	12	12	100	43
STEP ECHENANS	12	12	100	63
STEP ECOT	4	4		23
STEP FEULE Roselière	1	1		9
STEP MONTENOIS	3	3		38
STEP PONT DE ROIDE VERMONDANS	12	12	100	341
STEP ROCHES BLAMONT RIZOSPHÈRE	3	3		
STEP ROCHES LES BLAMONT	3	3		16
STEP SAINT MAURICE COLOMBIER	2	2		29
STEP SAINTE MARIE	2	2		14
STEP VILLARS LES BLAMONT Rhizo	1	1		10

PMA - SECTEUR PMA29 ASS

	VP.210 Nombre de bilans sur 24 h réalisés dans le cadre de l'autosurveillance réglementaire conformes (U)	VP.211 Nombre de bilans sur 24 h réalisés dans le cadre de l'autosurveillance réglementaire (U)	P.254.3 Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel pris en application de la police de l'eau (%)	VP.176 Charge entrante en DBO5 (Kg/j)
UDEP ARBOUANS	105	105	100	1 805
UDEP BAVANS	24	24	100	317
UDEP SAINTE SUZANNE	105	105	100	1 776

2. L'ESSENTIEL DE VOTRE SERVICE

2.1. FAITS MARQUANTS DU CONTRAT EN 2025

Optimisation de la production du digesteur d'Arbouans :	Suite aux opérations de vidange et de maintenance du digesteur, la remise en service en 2024 et une pleine production en 2025, une augmentation significative de la production de biogaz a été constatée.


Installation de débitmètres en sortie des STEP de Blamont, Ecot, Abbévillers, Sainte Marie et Saint Maurice Colombier.	Ces équipements permettent de mieux maîtriser le traitement et d'autre part d'accumuler de la donnée sur le fonctionnement des réseaux. Il s'agit de sonde de mesure radar ou de débitmètre électromagnétique suivant les cas. Ils seront aussi très utiles pour justifier des améliorations du réseau faits chaque année (renouvellements de réseaux assainissement, campagne de contrôle des branchements)







Sur PMA 29, forte diminution des rejets directs, en temps de pluies, au milieu naturel	Le diagnostic permanent a permis un programme de renouvellement ciblé sur 0,28% du réseau (en moyenne sur 5 ans). Ces travaux ont généré une réduction de 50% des volumes d'eaux non traitées déversées dans le milieu naturel lors d'épisodes pluvieux.

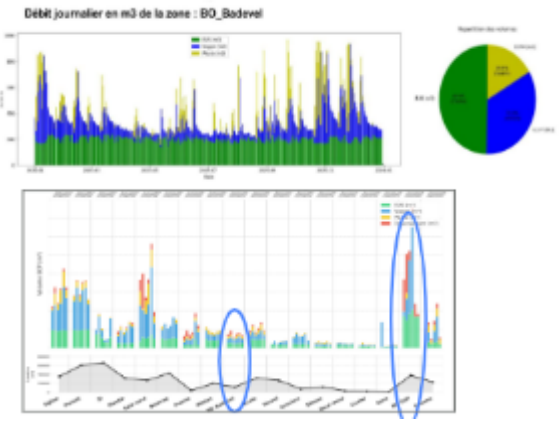





2.2. Évolutions réglementaires de 2025 et à venir

L'année 2025 a été marquée par la publication de textes législatifs et réglementaires particulièrement structurants, ainsi que par des échéances clés pour l'avenir des services d'assainissement à court et moyen termes.

Ces évolutions législatives et les échéances à venir nécessitent une attention particulière pour assurer la pérennité et l'adaptation des services d'eau, plus particulièrement les enjeux relatifs à la qualité de l'eau usée traitée.

Vos interlocuteurs se tiennent à votre disposition pour répondre à vos différentes questions et échanger de manière approfondie sur leurs conséquences particulières pour votre service.

Des échéances structurantes pour les services d'assainissement

- Réforme anti-endommagements sur les réseaux non-sensibles et cartographie des réseaux
- Nouvelles modalités de réalisation de repérage de l'amiante avant travaux
- Entrée en vigueur de la réforme des redevances des agences de l'eau
- Transposition de deux directives européennes en droit français sur la résilience des services d'eau et la cybersécurité
- Réutilisation des Eaux Usées Traitées (REUT)

Commande publique

- Nouveaux seuils européens applicables au 1er janvier 2026
- Nouveaux seuils pour le Code de la Commande Publique (CCP) effectifs en 2026.
- Simplification du code de la commande publique

Le détail des évolutions réglementaires est disponible en annexe. Nous développons ci-après les enjeux relatifs à la surveillance des PFAS dans les eaux usées et la révision de la Directive Européenne Eaux Résiduaires Urbaines (DERU 2).

Surveillances des PFAS dans les eaux usées

Dans le domaine de la santé et de l'environnement, le sujet des substances alkyl perfluorées (famille de substances communément nommées 'PFAS') a jalonné l'actualité 2025 : sur le plan législatif, réglementaire, institutionnel, voire même, médiatique.

En avril 2024, le gouvernement avait publié une mise à jour de son précédent plan d'actions interministériel. Plusieurs actions de ce nouveau plan concernent l'assainissement urbain, notamment en matière de surveillance des effluents et des boues à l'instar des dispositions déjà effectives pour certaines ICPE (suite à un arrêté d'août 2023).

Ainsi, l'arrêté du 3 septembre 2025 (JO du 7/09/25) est venu préciser les modalités de réalisation des campagnes d'analyse de substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les eaux en entrée et sortie de station de traitement des eaux usées urbaines de plus de 10.000 E.H.

L'arrêté prévoit une campagne de surveillance comportant trois mesures (prélèvement et analyse) en entrée et trois en sortie à réaliser en 2026 dans des conditions représentatives du fonctionnement normal de chaque station. Toutefois, quand ces dernières présentent des pics de charge annuels associés à des activités significatives, une des trois mesures est effectuée pendant cette période. Les substances à rechercher sont les 20 PFAS de la liste de la directive Eau potable et deux substances d'intérêt, le 6:2 FTSA et 6:2 FTAB, qui sont notamment liés aux mousses anti-incendie.

Les stations qui recueillent les rejets d'ICPE pour lesquels des PFAS ont déjà été quantifiés devront également rechercher les substances retrouvées dans les effluents de ces ICPE. Dans cette optique, les ICPE raccordées à la station concernée, ainsi que les substances visées, devaient être préalablement listées et transmises à la police de l'eau d'ici au 8 décembre 2025.

Cette surveillance des effluents est susceptible d'être complétée en 2026 par de nouvelles dispositions réglementaires imposant la surveillance des PFAS dans les boues issues des stations d'épuration urbaines, dans la continuité de la publication, désormais prochaine, du cadre réglementaire nommé "socle commun" prévu par la loi "AGEC" du 10 février 2020. Ce "socle commun" encadrera les conditions de retour au sol des différents engrais, fertilisants, amendements et produits résiduaires organiques recyclés en agriculture, dont les boues d'épuration urbaines.

NOUVELLE DIRECTIVE EAUX RÉSIDUAIRES URBAINES (DERU2)

La révision de la Directive Eaux Résiduaires Urbaines de 1991 (DERU) a été publiée au JOUE du 12 décembre 2024 (Directive 2024/3019 du 27 novembre 2024 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines). La France doit procéder à sa transposition en droit national au plus tard le 31 juillet 2027.

Par rapport à la précédente directive, cette révision introduit de nouvelles dispositions :

- l'élargissement du domaine d'application de la DERU aux agglomérations d'assainissement entre 1 000 et 2 000 EH , avec obligation de collecte et de traitement secondaire des eaux usées. L'assainissement non collectif devient une exception à justifier ;
- la réduction de la pollution issue du déversement direct d'eaux usées non traitées par temps de pluie, avec l'établissement de plans de gestion (incluant des objectifs et des mesures de réduction), pour les agglomérations de plus de 100 000 EH et de plus de 10 000 EH déversant en zone à risques pour l'environnement et la santé ;
- la réduction des rejets en nutriments pour les stations de plus de 150 000 EH et celles de plus de 10 000 EH rejetant en zone sensible à l'eutrophisation ;
- la mise en place de traitements quaternaires pour le traitement des micropolluants, pour les stations de plus de 150 000 EH et les agglomérations de plus de 10 000 EH rejetant dans des milieux considérés comme présentant une sensibilité particulière ;
- une responsabilité élargie du producteur de substances pour supporter le coût de traitement des micropolluants ciblant certaines filières industrielles comme les produits cosmétiques et pharmaceutiques ;
- un objectif de neutralité énergétique, à décliner à l'échelle de chaque État membre, pour les stations de plus de 10 000 EH.

Par ailleurs, cette nouvelle directive vise à promouvoir la réutilisation des eaux usées traitées et la récupération des ressources (par exemple, le phosphore) en assurant la maîtrise des pollutions à la source, à renforcer la surveillance des effluents et des boues (antibiorésistance, microplastiques, épidémies, …), l'accès à l'assainissement pour tous, et l'information du public.

3. BILAN ET PERSPECTIVES DU SERVICE

Ce chapitre vous présente une synthèse du bilan de l'activité de l'année 2025 et des perspectives de votre contrat.
L'ensemble des données chiffrées et factuelles pour évaluer la qualité et la performance du service rendu sont disponibles en partie 5 – Données détaillées.

3.1. Bilan conformité et performance des installations

Dans le contexte de la réforme des redevances des agences de l'eau, qui instaure une redevance pour performance des systèmes d'assainissement, la conformité et la performance de vos installations sont présentées selon les trois thèmes évalués pour déterminer le coefficient de modulation globale du système d'assainissement : l'autosurveillance, la conformité réglementaire, et l'efficacité du système.

Il s'agit là de vous apporter de la visibilité sur les indicateurs réglementaires susceptibles d'impacter la redevance. Toutefois, nous attirons votre attention sur le fait que certains indicateurs nécessaires au calcul du coefficient de modulation sont estimés ou non disponibles. De la même manière, les seuils retenus sont susceptibles d'être modifiés. Il s'agit donc d'une estimation partielle que nous vous apportons.

Les critères de mesure de la performance par thème sont décrits ci-après.

Nous sommes à votre disposition pour étudier avec vos services les solutions d'amélioration de vos systèmes d'assainissement permettant de vous assurer le meilleur coefficient de modulation possible.

Autosurveillance du système

<table>
<tr><th colspan="3">Station de Traitement des Eaux Usées (STEU)</th></tr>
<tr><th>STEU ≥ 2000 Équivalents Habitant</th><th>2000 > STEU ≥ 200 Équivalents Habitant</th><th>200 > STEU ≥ 20 Équivalents Habitant</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Indicateur relatif à la validation de l'autosurveillance du système de collecte : conformité du manuel d'autosurveillance et proportion de données validées par l'Agence de l'Eau</td><td>Indicateur relatif à la présence d'équipements d'autosurveillance</td><td rowspan="3">Coefficient fixe</td></tr>
<tr><td>Indicateur relatif à la réalisation des bilans d'autosurveillance et à la transmission des données d'autosurveillance</td></tr>
<tr><td>Indicateur relatif à la validation de l'autosurveillance de la station : conformité du manuel d'autosurveillance</td><td>Indicateur relatif à la transmission d'un rapport d'autosurveillance, selon prescriptions ministérielles</td></tr>
</table>

Conformité réglementaire

Station de Traitement des Eaux Usées (STEU)	
STEU ≥ 2000 Équivalents Habitant	**2000 > STEU ≥ 20 Équivalents Habitant**
Indicateur relatif à la **conformité réglementaire en performance de la station** validé par le Service de la Police des Eaux	**Conformité globale du système d'assainissement** validée par le Service de la Police des Eaux
Indicateur relatif à la **conformité réglementaire en performance du système de collecte par temps sec** validé par le Service de la Police des Eaux	
Indicateur relatif à la **conformité réglementaire en performance du système de collecte par temps de pluie** : en fonction du niveau de validation, total ou partiel, par le Service de la Police des Eaux	
Indicateur relatif à la **limitation des rejets par temps de pluie**	

Les indicateurs suivants permettent d'estimer le niveau de conformité du système :

- [P203.3] - Conformité de la collecte des effluents
- [P204.3] - Conformité des équipements d'épuration
- [P254.3] - Conformité des performances des équipements d'épuration

EFFICACITÉ DU SYSTÈME

Station de Traitement des Eaux Usées (STEU)		
STEU ≥ 2000 Équivalents Habitant	**2000 > STEU ≥ 200 Équivalents Habitant**	**200 > STEU ≥ 20 Équivalents Habitant**
Indicateur de **rendement performant** de la station portant sur DBO5, DCO et MES	Indicateur relatif à la **bonne destination des boues selon réutilisation, recyclage ou valorisation**	**Absence de pollution** constatée par l'Office Français de la Biodiversité ou le Service de Police des Eaux
Indicateur relatif à la **bonne destination des boues selon réutilisation, recyclage ou valorisation**	Indicateur relatif à la **production / évacuation des boues** en fonction du procédé de traitement	

Les indicateurs suivants permettent d'estimer le niveau de performance du système :


- [D203.0] - Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration
- [P206.3] - Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes
- Taux de rendement des stations
- Qualité de traitement des boues

3.2. Bilan énergie

Consommation d'énergie à l'échelle du service

Le détail des consommations par installation est disponible dans les données détaillées.

	2021	2022	2023	2024	2025	N/N-1
Energie relevée consommée (kWh)	**65 629**	**554 975**	**7 585 749**	**8 586 399**	**7 900 276**	**-8,0%**
Usine de dépollution	65 629	554 975	6 462 856	6 921 223	6 740 483	-2,6%
Postes de relèvement et refoulement			1 098 576	1 628 424	1 138 162	-30,1%
Autres installations assainissement			24 317	36 752	21 631	-41,1%
Energie consommée facturée (kWh)	**1 140 207**	**1 037 170**	**8 157 292**	**8 322 818**	**7 855 498**	**-5,6%**
Usine de dépollution	834 114	825 332	6 733 295	6 736 262	6 619 923	-1,7%
Postes de relèvement et refoulement	306 093	211 838	1 397 683	1 547 276	1 214 400	-21,5%
Autres installations assainissement		0	26 314	39 280	21 175	-46,1%

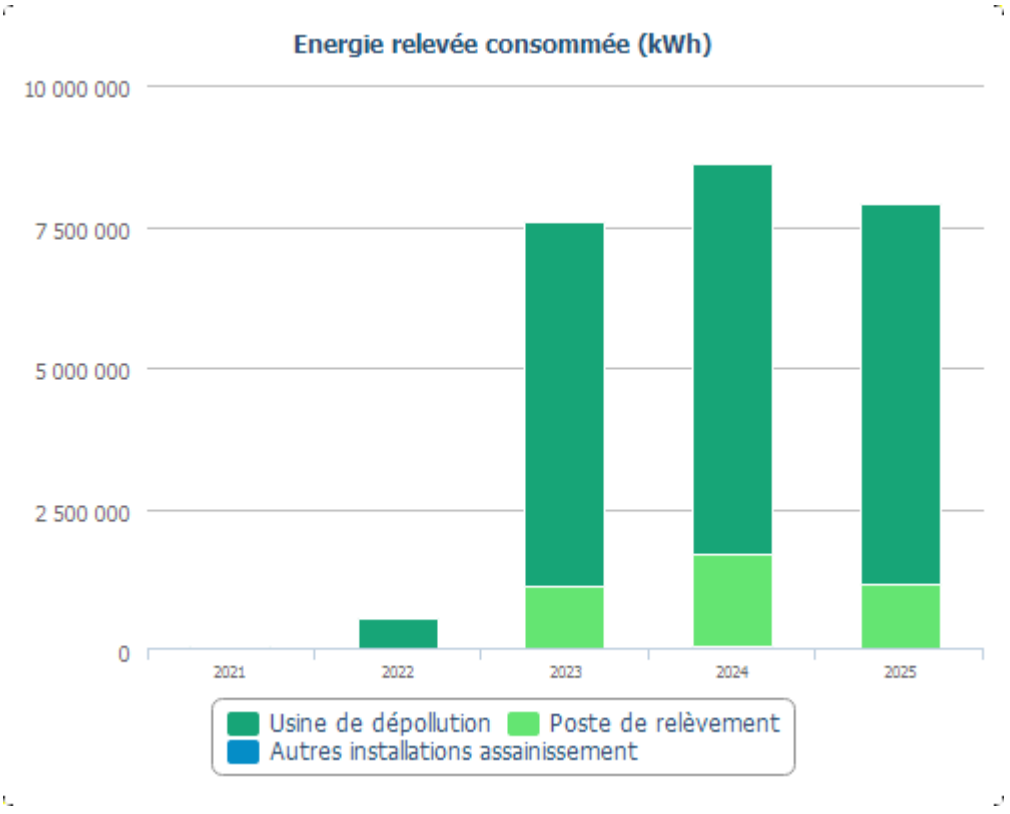

3.3. GESTION DE VOTRE PATRIMOINE

BILAN

USINES PMA 29

L'utilisation de l'intelligence artificielle dans le pilotage des 3 stations d'épurations du secteur Urbain, permet une adaptation rapide aux modifications de conditions de traitement, et un ajustement fin du traitement. Cette solution ajuste précisément les cycles d'aération :

- Prédiction intelligente de la charge en Nh4 (sonde virtuelle)
- Calcul précis du fonctionnement des aérateurs selon la charge

Station d'Arbouans :
L'ensemble de la détection de gaz de l'usine a été renouvelé sur le site. Ce renouvellement renforce la sécurité face aux risques majeurs d'anoxie, d'explosion et de toxicité inhérents à l'assainissement. Cette modernisation garantit une surveillance plus précise. Cet investissement structurel protège durablement l'intégrité physique des intervenants et sécurise l'exploitation de nos infrastructures.

Station de Sainte-Suzanne :
Depuis juin 2025, grâce à la mise en place des Speed O'Clar, le processus d'extraction des boues a été optimisé. Désormais, les boues sont extraites directement depuis le fond des clarificateurs plutôt que depuis le bassin d'aération. Cette modification technique permet d'obtenir des boues 2 à 3 fois plus concentrées avant leur envoi vers les tables d'égouttage. Cette amélioration présente plusieurs avantages : elle réduit les volumes de boues liquides à traiter, optimise le fonctionnement des tables d'égouttage, diminue la consommation de polymère et améliore le rendement global de la filière boues, contribuant ainsi à une meilleure performance énergétique et économique de la station.

Afin de sécuriser les étapes de traitement de l'usine, nous avons procédé au remplacement du classificateur des bassins d'orage. Cette intervention permet une extraction optimale des sables et graviers dès l'entrée de filière. En éliminant ces particules abrasives avant le renvoi des effluents vers la station, nous protégeons durablement les équipements hydrauliques en aval (pompes, vannes, agitateurs).



Les boues produites par les systèmes d'assainissement de PMA Urbains s'élèvent à 2 004 TMS, en augmentation de 7,4% par rapport à 2024. Ces données témoignent d'une amélioration globale des systèmes d'assainissement, ainsi que d'une année 2025 moins pluvieuse.

USINES PMA PÉRI-URBAIN

-Mise en service de la nouvelle station d'épuration de Roche Les Blamont fin 2025. Avec des impacts visibles à court terme sur la qualité du rejet au milieu naturel. Il s'agit de lits de roseaux, associés à une zone de rejets végétalisés (les plantations seront visibles dès le printemps 2026)






-Renouvellement de l'automate de la step de Colombier-Fontaine.




-Mise en place d'un débitmètre DN 300 sur le trop-plein de la step d'Echenans en février 2025 (mesure A2 fiabilisée)

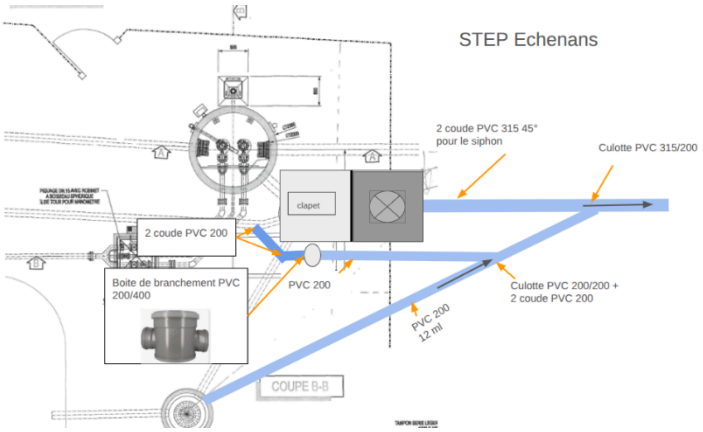



-Renouvellement en avril des tuyauterie et sécurisation de la plateforme du PR Bourguignon Pont (dangereux)

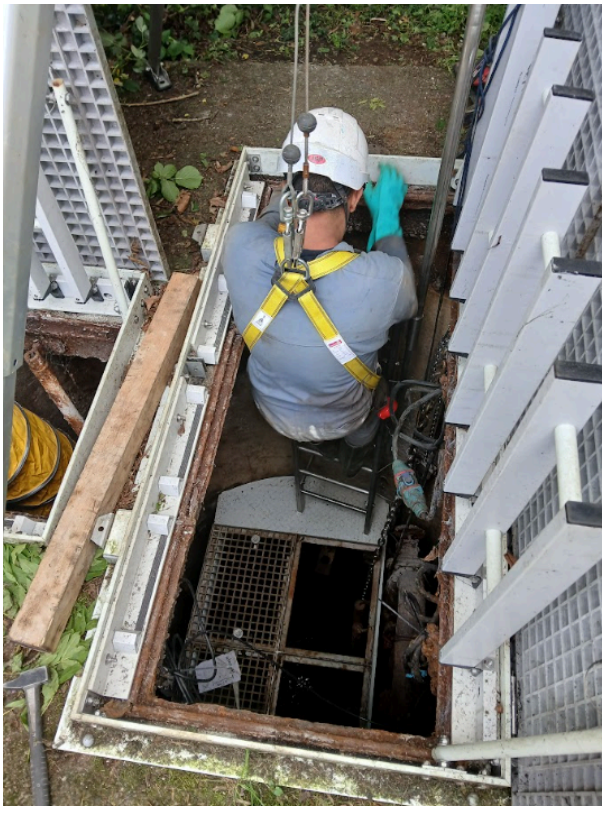



-Installation de débitmètres en sortie des STEP de Blamont, Ecot, Abbévillers, Saint Maurice Colombier.
Permettant de mieux maîtriser le traitement et d'accumuler de la donnée sur le fonctionnement des réseaux.

-Renouvellement d'un des surpresseurs d'air de STEP Montenois :



-Remplacement de la pompe reprise boues épaissies STEP Colombier Fontaine :



-Vidange complète des lagunes de Beutal en filière agricole (2 bassins).



-Vidange des derniers lits de boues de Montenois (bassin 3 à 6).



-Step de Sainte Marie : vidange du clarificateur pour renouvellement lame pont racleur, échange conduite et pied d'assise du poste de recirculation





-Mise en place de deux débitmètres en entrée de la step de Colombier Fontaine + un débitmètre sur la production de boues.





-Renouvellement de la couronne et du collecteur électrique du pont racleur de la STEP de Saint Maurice Colombier. Il s'agit d'équipements anciens, qui bien que modestes en termes de tailles, posent des difficultés techniques assez importantes pour retrouver et adapter des pièces de remplacement.





Les boues produites par les systèmes d'assainissement de PMA péri-urbains s'élèvent à 229 TMS, en augmentation de 24,7% par rapport à 2024. Ces données témoignent d'une amélioration globale des systèmes d'assainissement, ainsi que d'une année 2025 moins pluvieuse.

RÉSEAUX PMA 29

Sélection d'opérations de renouvellement prioritaires

Le diagnostic permanent a permis d'établir une liste d'opérations de renouvellement essentielles. Pour illustrer notre programme, nous détaillons ci-dessous deux interventions majeures choisies pour leur impact sur des secteurs très sensibles aux apports d'Eaux Claires Parasites (ECP) : le bassin de Sainte-Suzanne et celui d'Arbouans. D'autres opérations significatives ont été menées et sont intégrées au bilan général.

1 Opération de renouvellement : Chemisage du collecteur intercommunal à Montbéliard

Une intervention majeure de chemisage a été réalisée sur le collecteur intercommunal de la commune de Montbéliard. Cette opération visait à rétablir l'étanchéité de l'ouvrage et à éliminer les raccordements abandonnés qui collectaient des eaux claires parasites (ECP).





Ces travaux stratégiques ont concerné un gros collecteur de transport de diamètres ø 800 mm et ø 1000 mm. La complexité de l'opération a nécessité la mise en place d'une gestion alternative complète des effluents par pompage, assurant ainsi la continuité du service tout au long de la phase d'exécution.



2 Modification des déversoirs d'orage et optimisation du réseau à Valentigney rue des Graviers


Une opération d'envergure a consisté en la modification de deux déversoirs d'orage situés rue des Graviers. Cette intervention avait pour objectif d'optimiser la collecte des eaux usées en supprimant la liaison existante entre les collecteurs unitaires et le réseau intercommunal de transport.

Parallèlement, la pose de deux clapets anti-crue neufs et le renouvellement de deux clapets existants ont été réalisés, une mesure essentielle pour empêcher l'entrée du Doubs dans le collecteur.

De plus, ces travaux ont été associés à l'installation de deux vannes de régulation "f-reg" en aval du réseau. Ce dispositif permet de réguler les flux et d'utiliser le volume du collecteur comme un volume de stockage

tampon à un coût optimisé. L'ensemble de ces aménagements ont permis de limiter la charge déversée au milieu naturel, se traduisant par une baisse significative du volume et de la charge polluante déversée .



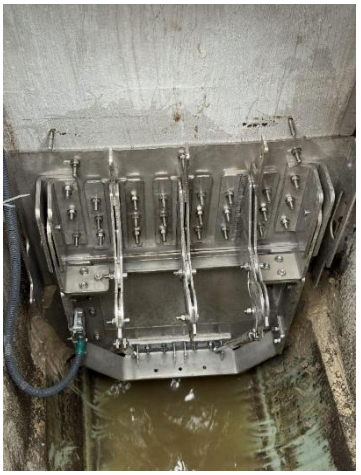

RÉSEAUX PMA PÉRI-URBAIN

Outres les réparations de réseau, les reprises de fond de cunette et les scellements et reprises de tampons, nous citons quelques-unes des actions significatives:



-Renouvellement réseau EU AEP et pluvial, restructuration Dambelin Rue Du Parc 20/05/2025



-Installation en décembre de clapets antiretour sur 2 trop pleins - poste de relèvement Passerelle et Déversoir d'orage la Rochette à Pont De Roide - vecteur d'eau claire parasite lors des crues du Doubs.



-Modification du déversoir d'orage rue du Melenot de Villars sous Dampjoux avec ajout de clapets anti-odeur dans 5 avaloirs.





-Renouvellement/extension d'un collecteur pluvial rue des Fontaines à Ecot -travaux PMA.

-Rénovation du DO rue Principale à Issans avec pose d'une lame inox



3.4. Sujets à engager pendant le contrat et propositions d'améliorations

3.4.1. Sur le bilan énergie

Réduire ses consommations énergétiques

Veolia Eau France est certifiée ISO 50 001 pour son système de management de l'énergie.
Dans ce cadre, un plan d'actions national 2024-2027 fixe des objectifs de gains énergétiques en fonction de différents leviers actionnables.
Ainsi, après étude de chacun de ces leviers, des actions sont menées si elles s'avèrent utiles et favorables à l'environnement.

Cela peut notamment concerner les bassins biologiques avec le renouvellement des surpresseurs, le renouvellement des diffuseurs d'air ou la mise en œuvre de systèmes de régulation.

Des actions de renouvellement de pompes peuvent également être menées en s'assurant de leur dimensionnement correct et adapté aux besoins.
Des consignes de pilotage permettent de nous assurer de la maîtrise quotidienne des consommations énergétiques (taux de boues, etc.).

Au-delà des actions classiques d'optimisation énergétique, le marché de l'électricité est de plus en plus dynamique et volatile.
Votre contrat bénéficie de tarifs négociés par nos services, de notre expertise sur la flexibilité électrique.

Produire des énergies locales pour maîtriser ses coûts d'énergie et réduire son empreinte carbone

Production de biogaz à partir des boues

Un digesteur permet de réduire la quantité de boues produites pour limiter la quantité de déchets mais il permet également la production de biogaz.

Ce biogaz peut être utilisé sous différentes formes :

- en étant injecté sur le réseau GRDF (après un traitement) ;
- en étant converti en électricité via une cogénération. La chaleur issue de ce process de transformation peut également être récupérée ;
- en étant brûlé dans une chaudière. La chaleur produite peut être utilisée pour maintenir la température dans le digesteur par exemple.

Suite aux opérations de vidange et de maintenance du digesteur, la remise en service en 2024 et une pleine production en 2025, une augmentation significative de la production de biogaz a été constatée. Ce résultat encourageant permet de réévaluer favorablement le projet de cogénération sur site pour la valorisation du biogaz.

L'énergie solaire

La mise en place d'une centrale solaire, c'est une énergie :

- compétitive sans subvention partout en France ;
- locale, bas carbone et décentralisée ;
- qui réduit le risque d'exposition au marché de gros et rend le service plus résilient et indépendant des énergies fossiles,



C'est un projet concret et exemplaire qui s'inscrit dans les ambitions de transition énergétique portées dans le PCAET.

Une centrale solaire couplée à un fonctionnement sur les heures solaires (8h - 18h) permet de produire jusqu'à 25% de la consommation des sites. Veolia vous accompagne sur l'ensemble de cette chaîne de valeur.

3.4.2. SUR LA GESTION DU PATRIMOINE

UN PATRIMOINE SOUS SURVEILLANCE

La formation et la présence d'H_2S dans les réseaux et ouvrages d'assainissement est un fléau aux multiples effets :

- dangers pour la santé humaine ;
- nuisances olfactives pour les riverains ;
- dégradation du structurelle des ouvrages, des canalisations et des équipements ;
- dysfonctionnement sur l'usine d'épuration.

Ces phénomènes ne vont pas s'atténuer dans les prochaines années et augmenteront les nuisances en raison de plusieurs facteurs tels que la réduction des débits en période d'étiage, la réduction des rejets aux réseaux unitaires et l'augmentation des températures maximum liées au changement climatique.

Par notre expérience acquise sur de nombreux contrats d'exploitation en France comme à l'étranger ainsi que différents partenariats stratégiques, nous sommes en mesure de vous accompagner dans la maîtrise des nuisances olfactives et l'assurance de disposer d'un patrimoine optimal sous surveillance permanente.

Les bénéfices pour la collectivité :

- gestion patrimoniale optimisée ;
- maîtrise des nuisances olfactives.

ABANDON DES TECHNOLOGIES RTC, 2G ET 3G

Les installations de tous types utilisent des équipements destinés à communiquer et partager des informations sur le fonctionnement des ouvrages et alerter en cas de dysfonctionnement. Ces données transitent sur des réseaux téléphoniques filaires de type RTC ou des réseaux sans fil.

A la résiliation automatique des services RTC, 2G/3G les informations des ouvrages d'eau potable concernés par ces réseaux ne pourront plus parvenir aux délégataires et collectivités. Plus aucune alerte ne parviendra pour prévenir d'un manque d'eau par exemple.
L'abandon des technologies cuivre (RTC), 2G et 3G nécessite un remplacement par les équipes Veolia des équipements concernés afin de les basculer sur les nouveaux supports de communication (4G/5G).

A date, l'extinction des services 2G interviendra dès la fin 2026, tandis que la 3G prendra fin en 2028.
La fin des lignes RTC est programmée par zones géographiques, avec des échéances échelonnées jusqu'à 2030.

Actuellement, PMA a commandé les travaux relatifs au remplacement des équipements utilisant la 2G. Ces coûts sont financés grâce à l'adaptation du programme des primo-investissements. Ce travail doit être poursuivi avec les dispositifs fonctionnant en 3G.

Nous reviendrons vers vous rapidement pour vous présenter le plan d'actions de remplacement des équipements concernés ainsi que le devis associé.

3.4.3. Propositions et améliorations attendues

L'ensemble des propositions d'améliorations de SEPM pour le service d'eau de PMA sont échangés en réunions de service hebdomadaires. PMA a réalisé un schéma directeur d'eau potable dont les travaux doivent être réalisés conformément à la programmation.

3.4.4. Focus sur la sécurité opérationnelle

La sécurité de nos personnels, des riverains et d'éventuels visiteurs des installations est une absolue nécessité pour votre service d'eau.
Le groupe Veolia dispose d'une culture Sécurité forte, animée et organisée autour de Standards Sécurité, qui nous permettent de hiérarchiser les axes de travail.
Notre politique de prévention nous amène donc à régulièrement réévaluer le niveau de sécurité des installations que vous nous avez confiées, vérifier leur adéquation à la réglementation, et prendre en compte les retours d'expérience que nous avons sur d'autres installations. Cette politique permet de répondre à toute intervention possible de l'Inspection du Travail qui mettrait en évidence le caractère accidentogène de vos installations, et en chercherait alors la responsabilité.

La sécurisation des installations signalées non conformes suite à des audits, contrôles réglementaires ou par nos équipes d'interventions ou managers peut nécessiter des remises à niveau qui relèvent de votre responsabilité de Maître d'Ouvrage.

<u>Usines PMA 29</u>

Les non-conformités identifiées sur vos installations sont les suivantes :

- Udep Sainte Suzanne : la trappe d'accès au By-pass station n'est pas équipé de Barreaudage, le risque de chute est important.

Il est nécessaire d'envisager la modernisation et la sécurisation de l'aire de dépotage des sables par les hydrocureurs de l'usine d'Arbouans. L'installation actuelle n'est plus adaptée, ce qui engendre des opérations

non sécurisées pour les agents (interventions non-sécurisées dans les déchets) et nécessite un temps considérable pour le nettoyage afin d'éviter les débordements.

USINES PMA PÉRI-URBAIN

Des travaux sont à mener sur les aires de dépotage des produits chimique des STEP de Colombier-Fontaine, Montenois et Pont de roide, Echenans, pour respecter les obligations réglementaires.

Le dessableur de la STEP de Villars lès Blamont serait à sécuriser par un grillage, ainsi que le canal venturi.



Les silos à boues de Echenans et Pont de Roide sont en risque ATEX. Des travaux ont été proposés à la collectivité, avec plusieurs hypothèses (notamment des travaux structurels sur le GC). Finalement l'hypothèse retenue pour 2026 est la pose d'extracteurs d'air.

Des détecteurs de gaz fixe sont à étudier dans la zone GDD et dégrilleur de Pont de Roide, ainsi que dans le local boues de Colombier-Fontaine.

Le génie civil de certains ouvrages est en mauvais état. Par exemple, les bandes de roulement des pont racleur de Dung, Saint Maurice Colombier, Sainte Marie ; ce qui nous pose des difficultés pour renouveler les moteurs et roues au PPR.

RÉSEAUX PMA 29

Les interventions sur les postes de refoulement du Haut des Roches (Seloncourt) et du Pied des Gouttes (Montbéliard) sont rendues difficiles et dangereuses par la vétusté des ouvrages et la complexité d'accès aux équipements.

L'accès aux grilles d'orage, notamment celles de Hérimoncourt et de Dampierre-les-Bois, pose également des problèmes. Il serait nécessaire d'étudier une modification de ces ouvrages.

RÉSEAUX PMA PÉRI-URBAIN

Il reste quelques postes de relèvement à équiper de barreaudage (PR en Presles, PR Blamont Orée du bois, etc..). Une liste sera produite en 2026.

Nous souhaitons attirer votre attention sur un point important : l'INRS a publié en 2024 des mesures

concernant l'empoussièrement en amiante lors des opérations d'hydrocurage.

Cette publication a conduit à l'élaboration de nouvelles préconisations de prévention et de sécurisation du travail de nos opérateurs. Il est important de noter que ces nouvelles dispositions auront un impact direct sur les services d'assainissement.

Par ailleurs, des évolutions réglementaires et études récentes précisent les exigences de sécurité concernant le repérage des matériaux avant travaux et font des recommandations concernant les interventions sur les matériaux contenant de l'amiante (enrobés, canalisations), avec un impact sur les coûts, notamment du curage et des réparations sur réseaux amiantés. Nous nous rapprocherons de vos services pour étudier comment prendre en compte ces impacts sur l'équilibre économique du contrat.

3.5. A L'ÉCOUTE DES CONSOMMATEURS

3.5.1. L'ANCRAGE LOCAL DE NOS CENTRES DE RELATION CLIENT

L'engagement de Veolia en faveur d'un service consommateurs de proximité et de grande qualité, s'appuyant sur la densité de son ancrage territorial, a permis à Veolia de devenir le premier opérateur de services d'eau et d'assainissement à obtenir l'attestation "Relation Client 100% France".
Veolia dispose de **8 centres de Relation Client implantés en France et répartis sur le territoire** : Liévin, Vaulx en Velin, Montpellier, Caen, Metz, La Rochelle, Toulouse, Chalon-sur-Saône.




3.5.2. LE PRIX DU SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT

En France, l'intégralité des coûts du service public est supportée par la facture d'eau. La facture type de 120m^3 représente l'équivalent de la consommation d'eau d'une année pour un ménage de 3 à 4 personnes.
A titre indicatif sur la commune de **MONTBELIARD** l'évolution du prix du service d'assainissement par m^3 **[D204.0]** et pour 120 m^3, au 1er janvier est la suivante :

MONTBELIARD **Prix du service de l'assainissement collectif** *	Volume	Prix Au 01/01/2026	Montant Au 01/01/2025	Montant Au 01/01/2026	N/N-1
Part délégataire			**141,97**	**139,10**	**-2,02%**
Consommation	120	1,1592	141,97	139,10	-2,02%
Part collectivité			**67,13**	**76,28**	**13,63%**
Consommation	120	0,6357	67,13	76,28	13,63%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
Total € HT			**210,30**	**219,06**	**4,17%**
TVA			21,03	21,91	4,18%
Total TTC			**231,33**	**240,97**	**4,17%**
Prix TTC du service au m3 pour 120 m3			**1,93**	**2,01**	**4,15%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

Le graphique ci-dessous présente la répartition du prix pour 120 m^3 pour la commune de **MONTBELIARD**

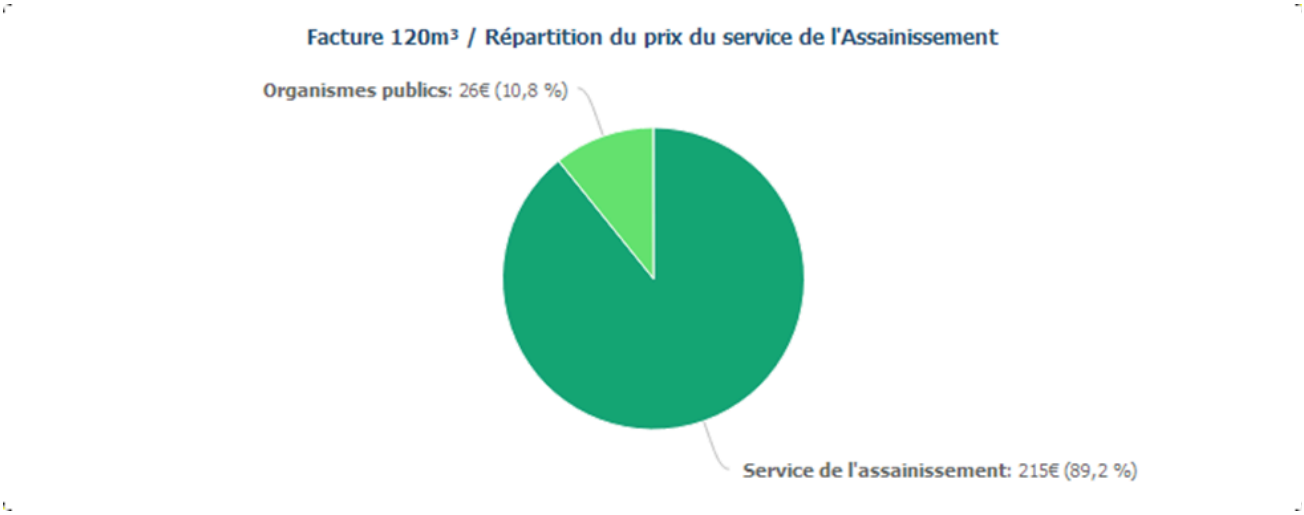

Après 6 ans de convergence tarifaire, le prix de l'eau est désormais unifié sur PMA.

La diminution de 2 % de la part délégataire du tarif s'explique par une baisse de l'indice d'électricité utilisé dans la formule d'actualisation des tarifs, considérée comme anormalement élevée.

En effet, la suppression du dispositif ARENH (Accès Régulé à l'Énergie Nucléaire Historique), adoptée tardivement dans le projet de loi de Finances 2026 (voté le 20 février 2026), combinée à la spécificité de la consommation énergétique des distributeurs, fait que l'évolution de l'indice énergie n'est plus représentative de celle des charges d'énergie supportées par la SEPM (voir note INSEE du 13 avril 2026).

3.5.3. VOLUMÉTRIE ET NATURE DES CONTACTS AVEC NOS ABONNÉS

CANAUX DE COMMUNICATION UTILISÉS PAR LES CONSOMMATEURS

Canal du contact	Nombre de demandes
Téléphone	329
Internet	55
Courrier	15
Visite en Agence	8

OBJET DES DEMANDES DES CONSOMMATEURS

Motif de la demande	Nombre de demandes traitées
Intervention	308
Autres	19

3.5.4. Satisfaction des consommateurs

Satisfaire les consommateurs des services que nous exploitons commence par recueillir régulièrement le jugement qu'ils portent sur ces services.
Le baromètre de satisfaction réalisé par Veolia porte sur les principaux critères d'appréciation de nos prestations.

Le tableau ci-dessous présente les taux de satisfaction à l'échelle nationale.

	2021	2022	2023	2024	2025	N/N-1
Satisfaction globale	74	77	76	77	76	-1
La continuité de service	91	94	89	88	89	+1
Le niveau de prix facturé	50	55	55	54	55	+1
La qualité du service client offert aux abonnés	72	73	71	73	74	+1
Le traitement des nouveaux abonnements	71	74	76	77	71	-6
L'information délivrée aux abonnés	70	72	70	72	73	+1

Engagements de service

Nos 8 engagements témoignent de notre mobilisation quotidienne pour la qualité de l'eau et de celle de tous les services qu'attendent les consommateurs. Qu'il s'agisse d'intervenir quand ils ont besoin de nous, de les aider à gérer leurs budgets eau, de les accompagner dans l'adaptation à la transition écologique ou de mettre à leur disposition tous les canaux d'échanges dont ils souhaitent disposer.

Ces engagements sont détaillés sur le site internet eau.veolia.fr.

3.5.5. Nouveau système de facturation

Régulièrement, nous faisons évoluer nos procédures et outils pour améliorer et renforcer l'expérience consommateurs. Nous avons modernisé notre logiciel de facturation pour simplifier les démarches des usagers et rendre nos services plus réactifs.

Les évolutions mises en place permettent par exemple :

- un choix des dates de prélèvement et de mensualisation en ligne, à tout moment par l'usager ;
- une possibilité de télécharger directement des justificatifs de domicile ;
- une diminution des délais entre le relevé de compteur et la réception de la facture par le consommateur.

3.6. Résilience du territoire

3.6.1. Adaptation au changement climatique

La Réutilisation des Eaux Usées Traitées (REUT)

La REUT BOX est une solution innovante de Veolia pour répondre au stress hydrique lié au dérèglement climatique.



La REUT BOX est composée d'une filtration sur média, d'une désinfection UV et d'une chloration avant stockage. La REUT BOX a un faible encombrement au sol sur site, proposée soit en skid pour intégration dans des locaux existants soit en container de 20 pieds.

C'est une solution intégralement automatisée avec un minimum d'exploitation, c'est une solution modulaire, standardisée et évolutive qui permet de s'adapter aux besoins des usages internes comme externes.

La REUT BOX permet de traiter les eaux usées en sortie de station d'épuration. Elle élimine les matières en suspension ainsi que les virus et bactéries présents dans l'eau et produit une eau de qualité A française, uniquement installée sur des STEP au rejet conforme.

Depuis 2022, plusieurs dizaines de collectivités, petites ou grosses, ont engagé la mise en place de REUT BOX pour des usages variés comme :

- substitution de l'eau potable sur une station d'épuration urbaine pour ses usages internes ou pour l'hydrocurage des réseaux d'assainissement ;
- nettoyage de voiries ;
- - arrosage de stades, hippodromes, espaces verts et golfs ;
- - irrigation de cultures (vignes, oliviers, maraichages…) ;
- - protection incendie, réserves en eau ;
- - complément d'eau de chaudière, d'eau de process, d'eau de refroidissement pour les industriels implantés sur votre territoire.



La mise en place de ces dispositifs, désormais largement subventionnés par les agences de l'eau, passe par un processus d'autorisations administratives que le plan Eau du gouvernement tend à simplifier.

Des villes comme Narbonne, Bergerac, Antibes, Lens, Chaumont, Romilly sur Seine, Dinard, Bressuire ont déjà utilisé cette technologie.

Anticiper les phénomènes météorologiques importants

L'expertise d'exploitation des installations par Veolia, combinée aux années d'expériences de PREDICT dans l'anticipation et l'assistance au cours d'événements hydrométéorologiques permettent de s'organiser préventivement face à des phénomènes à risques pouvant être dommageables pour l'exploitation des infrastructures du territoire.
L'équipe d'experts PREDICT fournit des recommandations précises et adaptées aux besoins des exploitants Veolia pour l'activation des différents niveaux d'alerte avec des mesures de protection et de sauvegarde spécifiques, validés au préalable avec vos services.

Les bénéfices pour votre collectivité :

- assurer la sécurité des habitants et maintenir la continuité de la circulation routière ;
- garantir la sécurité des opérateurs Veolia en leur fournissant les informations nécessaires pour décider si une sortie d'astreinte est sécurisée ou non ;
- protéger votre patrimoine et les équipements essentiels qui servent à l'exploitation ;
- sécuriser les réseaux et les infrastructures vitales ;
- assurer la continuité du service par l'anticipation et l'organisation préventive ;
- assurer le retour progressif à la normale.

Adapter les infrastructures aux aléas climatiques

Déjà une réalité sur le territoire, le changement climatique va avoir dans la durée des répercussions profondes sur le service d'assainissement. Vagues de chaleur, sécheresses, tempêtes et fortes pluies vont en effet se succéder plus fréquemment et plus intensément qu'auparavant, avec des conséquences très concrètes :

- modification de la structure des sols, entraînant une dégradation des canalisations et des bâtis ;
- augmentation des quantités d'H_2S, entraînant des risques d'odeurs et de sécurité ;
- rupture de télécommunications ou d'alimentation électrique des installations ;
- augmentation des volumes d'eaux collectées, avec des risques de débordements et de non-conformités plus importants ;
- échauffement des équipements électriques et électromécaniques, pouvant entraîner des départs de feux ou des casses plus fréquentes ;
- restrictions d'usage de l'eau potable en raison de la raréfaction de la ressource en eau ;
- etc.

Il est donc nécessaire de **mettre à jour le schéma directeur du service** pour évaluer les actions à engager à court, moyen et long terme. Cette mise à jour viendra notamment répondre aux mesures 9 et 10 du Plan Eau du Gouvernement, relatives à la déclinaison au niveau de chaque territoire :

- d'un plan d'adaptation au changement climatique ;
- de scénarios prospectifs sur les prélèvements en lien avec les SAGE et PTGE.

Face aux aléas climatiques, de nombreuses solutions et petits travaux sont bénéfiques pour renforcer la résilience des infrastructures du service, installations comme réseaux :

- **protection des Automates Programmables Industriels et autres instruments électroniques sensibles** contre les fortes chaleurs, avec des solutions de monitoring et de rafraîchissement des locaux existants ;
- **protection des infrastructures implantées en lisière ou dans des forêts** à risque d'incendie avec la mise en place de réseaux d'humidification utilisant des eaux recyclées (REUT) ou création de réserves pour les pompiers ;

- **déploiement de solutions pour sécuriser l'approvisionnement en électricité** des installations les plus sensibles : solutions de sobriété énergétique (re-lamping par LED, pose de variateurs de vitesse CEE…), production autonome d'électricité (production solaire, groupes électrogènes…) ;
- **création d'îlots de fraîcheur et développement de ressources alternatives** à l'eau potable à partir de l'eau de REUT ou encore des eaux pluviales ;
- **protection des canalisations contre le retrait gonflement des argiles**, avec des solutions de monitoring et des renouvellements ciblés avec des matériaux adaptés ;
- **protection des installations contre les inondations**, via des solutions de protection physique du bâti, la mise en sécurité des équipements critiques, l'installation de capteurs de niveau d'eau en extérieur, etc. En particulier, une solution de sécurisation physique existe pour les bâtiments les plus sensibles : il s'agit d'une solution technique de protection du bâti, installée autour de l'infrastructure à protéger, qui agit comme une barrière de protection permanente. Son activation est automatique et passive (sans électricité). Ce dispositif préventif dispose d'un atout supplémentaire majeur : il est totalement invisible une fois installé. Innovant et efficace, ce dispositif anti-inondation est adaptable à tous types de constructions en zone à risques. Cette barrière isole de l'eau l'infrastructure pendant toute la durée du sinistre. Déclenché automatiquement lors d'une inondation, il peut aussi inclure un dispositif manuel d'activation en option. Performant en zone inondable, il s'adapte à différents types d'aléa d'inondation : le ruissellement pluvial urbain, les débordements de cours d'eau, les inondations et les submersions marines. C'est un système réutilisable de protection des inondations ;
- **tropicalisation des armoires électriques et des automates**.

Réalimentation de nappes et création de zones de rejets végétalisées : des solutions adaptées à votre territoire

La réalimentation des nappes et la création d'une Zone de Rejet Végétalisée (ZRV) sont des pratiques qui visent, via des solutions fondées sur la nature, à minimiser voire compenser certains effets dus au dérèglement climatique en contribuant à la gestion des crues et au soutien à la biodiversité.
Ces pratiques sont également des atouts de dialogues et de liens avec les citoyens via une meilleure sensibilisation et acculturation aux solutions fondées sur la nature en conditions hydro-climatiques instables.

Les bénéfices pour votre Territoire :

- gestion des eaux pluviales ;
- amélioration de la résilience ;
- atout de dialogue et liens avec les citoyens.

Nos propositions pour la biodiversité

Face au déclin du vivant, qui est essentiel pour réguler le climat, garantir la santé et l'accès à Face au déclin du vivant, qui est essentiel à la régulation du climat, à la santé et à l'accès à des ressources de qualité, le service d'eau a un vrai rôle à jouer dans la préservation de la biodiversité du territoire.
En raison des importantes surfaces d'espaces verts incluses dans le périmètre du contrat, et dans un souci d'exemplarité du service public, Veolia vous propose d'engager des actions ciblées à l'efficacité éprouvée :

- **réalisation d'un Audit Biodiversité par un tiers expert** pour mieux connaître votre patrimoine naturel, le relier à la trame verte et bleue plus globale du territoire, et in fine cibler les actions à mener pour avoir un effet levier maximal sur la biodiversité et communiquer auprès de vos administrés ;
- **élaboration d'un plan de gestion différenciée des espaces verts**, qui garantit un entretien respectueux de la biodiversité, tout en tenant compte des différents usages des sites ;

- **déploiement du suivi automatisé de la santé des écosystèmes des sites avec LEKO** : fruit d'une collaboration entre Veolia et le Muséum National d'Histoire Naturelle, LEKO est un service qui permet d'écouter la biodiversité autour d'un point donné pour en déduire l'état de santé des écosystèmes. Il s'appuie pour ce faire sur des groupes bio-indicateurs que sont les chauves-souris, les sauterelles et les oiseaux. Grâce à un capteur acoustique qui fonctionne en permanence, les données générées permettent de comparer, dans le temps ou l'espace, l'évolution des communautés de ces espèces bio-indicatrices, et ainsi :
    - d'évaluer les impacts d'aménagements programmés, de changements des modalités de gestion des espaces verts, de changement des systèmes d'éclairage… ;
    - de cataloguer une partie du patrimoine biodiversité, pour permettre notamment la prise en compte des espèces les plus menacées.

Un affichage web permet de suivre dans le temps de valoriser les résultats obtenus. Les données collectées sont versées à l'inventaire national du patrimoine naturel ;

- **mise en œuvre d'aménagements techniques légers pour la faune ou de projets de végétalisation**, sur la base des résultats de l'Audit biodiversité : nichoirs à oiseaux, gîtes à chauves-souris, chandelles à pollinisateurs, passages pour la petite faune, espaces de renaturation, plantation de haies… ;
- **prise en compte du risque de pollution lumineuse** générée par le service d'eau, grâce à une cartographie des éclairages extérieurs des sites permettant de cibler les sites et les actions les plus pertinents dans un double souci de préservation de la biodiversité et d'économies d'énergie !

4. RAPPORT FINANCIER DU SERVICE

4.1. COMPTE ANNUEL DE RÉSULTAT DE L'EXPLOITATION DE LA DÉLÉGATION

Le présent chapitre est présenté conformément aux dispositions du décret 2016-86 du 1er février 2016.

4.1.1. LE CARE

Le compte annuel et l'état détaillé des produits figurent ci-après. Les modalités retenues pour la détermination des produits et des charges et l'avis des Commissaires aux Comptes sont présentés en annexe du présent rapport « Annexes financières ».
Les données ci-dessous sont en Euros.

SEPM **Version Finale**

Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation
Année 2025
(en application du décret du 14 mars 2005)

Collectivité: PM011 - PMA PERI URBAIN ASS **Assainissement**

LIBELLE	2024	2025	Ecart %
PRODUITS	**16 300 918**	**14 526 226**	**-10,89 %**
Exploitation du service	11 865 504	11 444 301	
Collectivités et autres organismes publics	4 424 499	3 065 623	
Produits accessoires	10 915	16 302	
CHARGES	**15 127 408**	**14 211 538**	**-6,05 %**
Personnel	2 347 929	2 361 201	
Energie électrique	1 449 516	1 009 121	
Produits de traitement	487 082	459 597	
Analyses	91 753	274 645	
Sous-traitance, matièreset fournitures	851 358	1 130 305	
Impôts locaux et taxes	64 145	79 012	
Autres dépenses d'exploitation	167 174	259 100	
télécommunications, poste et telegestion	*64 030*	*44 207*	
engins et véhicules	*507 891*	*504 841*	
informatique	*21 236*	*10 367*	
assurances	*10 177*	*6 405*	
locaux	*158 892*	*176 266*	
autres	*- 595 047*	*- 482 980*	
Frais de contrôle	254 751	158 481	
Redevances contractuelles	513 340	830 500	
Contribution des services centraux et recherche	1 616 288	1 589 164	
Collectivités et autres organismes publics	4 424 499	3 065 623	
Charges relatives aux renouvellements	2 772 797	2 900 539	
pour garantie de continuité du service	*291 216*	*388 948*	
fonds contractuel (renouvellements)	*2 481 581*	*2 511 591*	
Charges relatives aux investissements	39 804	55 853	
programme contractuel (investissements)	*39 804*	*55 853*	
Pertes sur créances irrécouvrables-Contentieux recouvrement	46 971	38 394	
RESULTAT AVANT IMPOT	**1 173 509**	**314 688**	**NS**
Impôt sur les sociétés (calcul normatif)	293 341	78 630	
RESULTAT	**880 169**	**236 058**	**NS**

Conform e à la circulaire FP2E de janvier 2006 04/03/2026

4.1.2. L'ÉTAT DÉTAILLÉ DES PRODUITS

L'état suivant détaille les produits figurant sur la première ligne du CARE :
Les données ci-dessous sont en Euros.

SEPM **Version Finale**

Etat détaillé des produits (1)
Année 2025

Collectivité: PM011 - PMA PERI URBAIN ASS **Assainissement**

LIBELLE	2024	2025	Ecart %
Recettes liées à la facturation du service	7 260 453	6 896 860	-5,01 %
dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)	*6 638 688*	*8 093 295*	
dont variation de la part estimée sur consommations	*621 765*	*- 1 196 435*	
Autres recettes liées à l'exploitation du service	4 605 051	4 547 441	-1,25 %
dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)	*4 605 051*	*4 547 441*	
Exploitation du service	**11 865 504**	**11 444 301**	**-3,55 %**
Produits : part de la collectivité contractante	3 402 028	3 411 360	0,27 %
dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)	*2 733 340*	*3 730 825*	
dont variation de la part estimée sur consommations	*668 688*	*- 319 466*	
Redevance Modernisation réseau	1 022 472	- 345 737	NS
dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)	*871 712*	*89 033*	
dont variation de la part estimée sur consommations	*150 760*	*- 434 770*	
Collectivités et autres organismes publics	**4 424 499**	**3 065 623**	**-30,71 %**
Produits accessoires	**10 915**	**16 302**	**49,35 %**

(1) Cette page contient le détail de la première ligne du CARE (produits hors TVA). 04/03/26

Compte tenu des arrondis effectués pour présenter la valeur sans décimale, le total des produits ci-dessus peut être différent à quelques euros près du total des produits inscrits sur le compte annuel de résultat de l'exploitation.

INFORMATION COMPLEMENTAIRE

La rubrique « Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement » du CARE inclus dans le présent rapport annuel reprend essentiellement les pertes sur les créances devenues définitivement irrécouvrables, comptabilisées au cours de l'exercice. Celles-ci peuvent être enregistrées plusieurs années après l'émission des factures correspondantes compte tenu des délais notamment administratifs nécessaires à leur constatation définitive. Elle ne traduit par conséquent qu'avec un décalage dans le temps l'évolution des difficultés liées au recouvrement des créances dans le contexte réglementaire actuel.

L'amélioration des systèmes d'information et des processus de gestion de Veolia Eau permet de fournir maintenant une information complémentaire importante compte tenu des limites évoquées ci-dessus.

A ce jour, et en application du principe de prudence, les créances de plus d'un an à la clôture de l'exercice font l'objet d'une provision pour dépréciation dans les comptes sociaux de la Société. Cette provision (qui a pour seule vocation de constater « en temps réel » mais de manière estimative le coût des impayés) est

reprise soit lorsque la créance est définitivement admise en irrécouvrable, soit si la créance est encaissée (la provision devenant alors sans objet).

Cette provision est calculée sur l'ensemble du stock de créances d'exploitation de plus d'un an de la Société, à hauteur de la part des produits qui lui revient (en excluant les produits facturés pour le compte des Collectivités et autres organismes) par application d'un taux moyen de produits propres uniforme pour toute la Société.

Cette provision comptable peut être déterminée sur les différents contrats de la Société en appliquant aux impayés de plus d'un an attachés à chaque contrat le taux moyen de produits propres ci-dessus.

Les principales évolutions des produits et des charges sont les suivantes :

- Pour les produits :
  - Baisse des produits d'exploitation correspondant à la contrepartie de la surévaluation des provisions 2024 (environ - 800 k€ pour l'eau et l'assainissement), et l'augmentation des volumes facturés,
  - Baisse des produits reversée à l'agence de l'eau
- Pour les charges :
  - Baisse des coûts de l'énergie consécutive de la baisse du coût de l'électron en 2025 par rapport à 2024, aux efforts d'efficacité sur les usines de dépollution.
  - Nos coûts de sous-traitance augmentent et intègrent la reprise de l'évacuation des boues (en 2024, les conditions climatiques n'avaient pas permis une mise en oeuvre complète des plans d'épandage des boues),
  - Frais d'analyses intègre un décalage de facturation de PMA de 2024 sur 2025
  - Autres dépenses d'exploitation en augmentation consécutivement au changement d'imputation des coûts d'éditique et d'affranchissement et à l'amortissement des nouveaux camions de curage,
  - Frais de contrôle 2024 constataient une régularisation de frais antérieurs. Retour à la normale en 2025,
  - Redevances contractuelles en augmentation suite à évolution de l'intéressement contractuel versé,
  - La contribution des services centraux et recherche correspond à la facturation des prestations réalisées par Veolia pour le compte de SEPM (service technique, service clients, informatique, juridique, RH, comptabilité, Achat, recherche et développement). Ces dépenses correspondent aux montants prévus dans la convention Veolia/SEPM, annexée au contrat DSP,
  - les montants indiqués en garantie de Continuité de Service correspondent aux dépenses engagées et comptabilisées sur l'année au titre du fonds fonctionnel non-programmé. Les montants indiqués au titre des autres fonds contractuels correspondent à la dotation prévisionnelle telle que prévue dans le budget initial, indexée *selon une* formule d'actualisation. Un suivi extra-comptable, pluri-annuel, de ces dépenses est par ailleurs réalisé afin de constater la tenue de nos engagements contractuels sur ce sujet,
  - Les charges relatives aux investissements correspondent aux redevances d'usages des investissements réalisés depuis l'origine du contrat.

4.2. Situation des biens

4.2.1. Inventaire des biens

L'inventaire au 31 décembre de l'exercice est établi selon les préconisations de la FP2E. Les biens désignés comme biens de retour ou biens de reprise sont ceux expressément désignés comme tels au contrat, conformément au décret 2016-86 du 1er février 2016. S'il y a lieu, l'inventaire distingue les biens propres du délégataire.

4.2.2. Situation des biens

La situation des biens est consultable dans la partie 5 "Données détaillées - Inventaire des installations".

Par ce compte rendu, Veolia présente une vue d'ensemble de la situation du patrimoine du service délégué, à partir des constats effectués au quotidien (interventions, inspections, auto-surveillance, astreinte, ...) et d'une analyse des faits marquants, des études disponibles et d'autres informations le cas échéant.
Ce compte rendu permet ainsi à la collectivité, par une connaissance précise des éventuels problèmes, de leur probable évolution et des solutions possibles, de mieux programmer ses investissements.
Les biens dont l'état ou le fonctionnement sont satisfaisants, ou pour lesquels Veolia n'a pas décelé d'indice négatif, et qui à ce titre n'appellent pas ici de commentaire particulier, ne figurent pas dans ce compte rendu.

4.2.3. Variation du patrimoine immobilier

Cet état retrace les opérations d'acquisition, de cession ou de restructuration d'ouvrages financées par le délégataire, qu'il s'agisse de biens du domaine concédé ou de biens de reprise.

4.3. INVESTISSEMENTS ET RENOUVELLEMENT

Les états présentés permettent de tracer, selon le format prévu au contrat, la réalisation des programmes d'investissement et/ou de renouvellement à la charge du délégataire, et d'assurer le suivi des fonds contractuels d'investissement.
La méthode de calcul de la charge économique imputée au compte de la délégation est présentée dans l'annexe financière « Les modalités d'établissement du CARE ».

4.3.1. PROGRAMME CONTRACTUEL D'INVESTISSEMENT

Installations électromécaniques	Montant en €
1ER ETABLISSEMENT	
1ER ETABLISSEMENT	
Diag Amont PMA29 (Y6K44) 2025	48 459,39
Sécurisation Usines assainissement (Y6K25) 2025	62 855,64
SEPM Télégestion 2G ASST (Y6K48) 2025	725,60
Télégestion assainissement (Y6K24) 2025	16 027,59

4.3.2. LES DÉPENSES DE RENOUVELLEMENT

Les états présentés dans cette section permettent de suivre les dépenses réalisées dans le cadre d'une obligation en garantie pour la continuité du service ou d'un fonds contractuel de renouvellement.
La méthode de calcul de la charge économique imputée au compte de la délégation est présentée dans l'annexe financière « Les modalités d'établissement du CARE ».

DÉPENSES RELEVANT D'UNE GARANTIE POUR LA CONTINUITÉ DU SERVICE


Cet état fournit, sous la forme préconisée par la FP2E, les dépenses de renouvellement réalisées au cours de l'exercice dans le cadre d'une obligation en garantie pour la continuité du service.

Nature des biens	2025
Canalisations et accessoires (€)	118 420,82
Branchements (€)	28 026,66
Equipements (€)	242 500,07

DÉPENSES RELEVANT D'UN FONDS DE RENOUVELLEMENT


Un fonds de renouvellement a été défini au contrat. Les dépenses et la situation du fonds relatif à l'exercice sont résumées dans les tableaux suivants :

Etat du fonds de renouvellement fonctionnel programmé au 31/12/2025

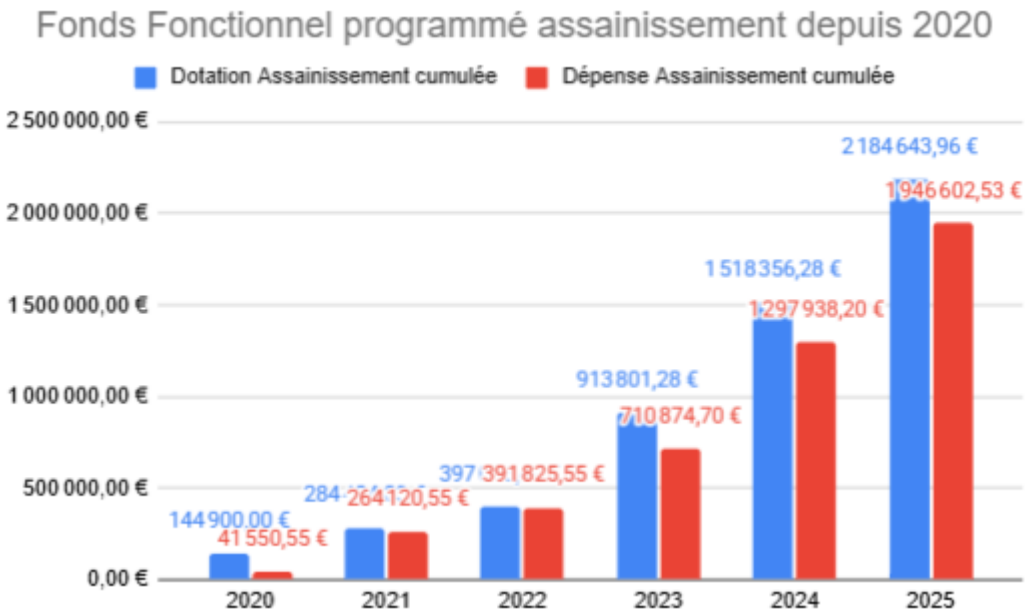

Le détail des 141 opérations sur la partie usines est disponible sur simple demande.

Etat du fonds de renouvellement patrimonial au 31/12/2025

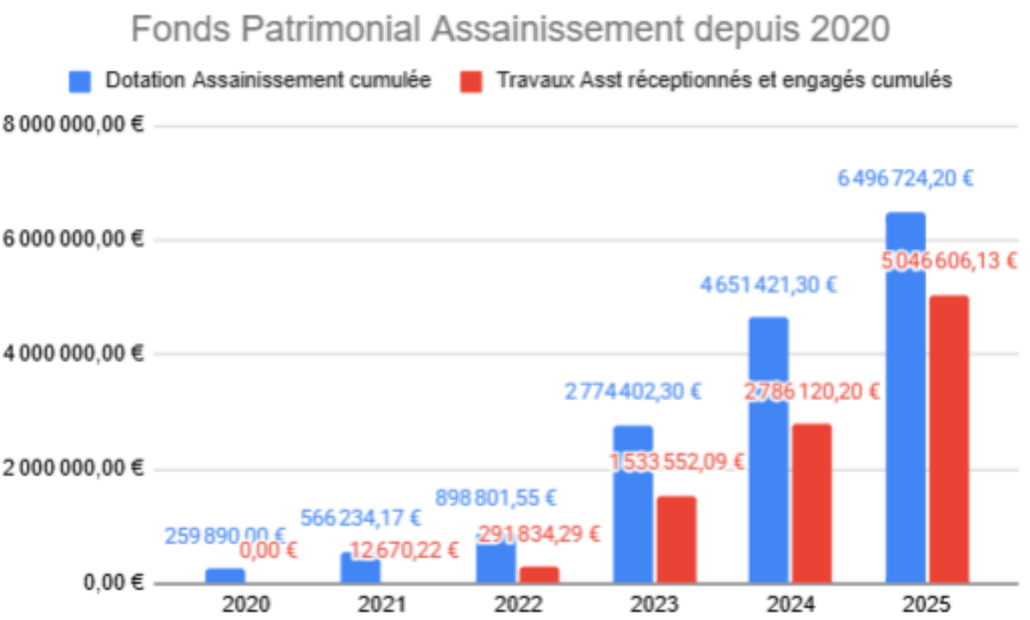

La liste des opérations du fond de renouvellement patrimonial de l'exercice 2025 sont listées dans ce tableau :

Commune	Rue	Description des travaux
Audincourt	Rue de la Musique	Renouvellement collecteur assainissement et AEP
Bavans	1 rue du Jardin	Réduction Eaux Claires Parasites
Bethoncourt	Rue de Bussurel	Restructuration des réseaux d'assainissement
Hérimoncourt	Rue de la Chauve-Souris	Suppression Eaux Claires Parasites
Montbéliard	Chemin halage Pont Ludwigsbourg --> BO ZUP route d'Audincourt	Lot 1 Chemisage réseau EU sous chemin halage - Secteur EDF - BO ZUP (rive gauche)
Montbéliard	Prés La Rose	Suppression ancien collecteur au niveau du PR Prairie
Montbéliard	Secteur canal et Faubourg Besançon	Etude hydrodynamique FREG sur collecteur intercommunaux
PMA - SIEA Abbevillers	SIE Abbévillers	Refacturation assainissement SIE Abbevillers Oct 2024-Oct 2025
Valentigney	Rue des Graviers	Restructuration de 2 déversoirs d'orage auto surveillé, pose 3 clapets et 2 vannes hydrodynamiques de régulation
PMA	5 stations d'épuration péri-urbaines : Ecot, Saint Maurice, Sainte Marie, Abbevillers et Blamont	Mesures de la débitmétrie en sortie

5. Données détaillées

5.1. Collecte

Bilan des arrêtés d'autorisation et de conventions

	2021	2022	2023	2024	2025
Nombre arrêtés d'autorisation de déversement	2	2	28	28	27

Commune	Etablissement	Adresse
Audincourt	Allrim	ZI des Arbletiers
Audincourt	EDF-GDF	10 rue des Refroidières
Audincourt	Flex n Gate Audincourt	18 bis rue de Verdun
Bavans	Forvia Bavans	Bois sur Prés
Courcelles les Montbéliard	Prothéos	Parc d'activité de l'aérodrome
Dasle	Lisi Automotive	1 rue Centrale
Etupes	Glaces Erhard	Rue Pierre Marti
Etupes	Onyx Est Veolia	258 avenue René Jacot
Etupes	Sotrefi	48 rue des Tonneliers
Etupes	Trevest	91 allée Adolphe Kégresse
Fesches le Châtel	Cristel	Parc d'activité du Moulin
Hérimoncourt	Peugeot Hérimoncourt	Rue du Commandant Rolland
Mandeure	Fuji Autotech	95 rue du 17 Novembre
Mandeure	Peugeot Motocycles	103 rue du 17 Novembre
Montbeliard	Société de fromagerie de Montbéliard	Pied des gouttes
Montbéliard	Cora	Route de Béthoncourt
Montbéliard	EDF-GDF	1 rue de Beau de Rochas
Montbéliard	Franche Comté Salaisons	Rue Frédéric Japy
Montbéliard	Leclerc	Rue Jacques Foillet
Pont de Roide Vermondans	ETPA	6 rue des Marronniers
Pont de Roide Vermondans	Imprimerie IJK-Baumann	51 rue de Besançon
Seloncourt	Galvanoplast	Rue de la Pâle
Valentigney	Lingenet	Rue de la Forge
Valentigney	TS EST	Rue de la Forge
Vieux Charmont	Lehmann	ZAC de l'Allan
Voujeaucourt	Bourbon Automotive Plastic	Rue de la Prate
Voujeaucourt	Stellantis Site de Belchamp	Route d'Audincourt

Conformité des branchements

Maîtrise des déversements vers le milieu naturel

Nombre de points de rejet	2021	2022	2023	2024	2025
Nombre d'usines de dépollution	22	23	23	23	24
Nombre de déversoirs d'orage	42	42	225	265	266
Nombre de trop-pleins de postes de relèvement/refoulement	13	13	41	41	41

L'augmentation du nombre d'usines de dépollution en 2025 (passant de 23 à 24) est due à la **mise en service de la nouvelle station d'épuration de Roches Les Blamont** fin 2025.

Durant cette période de transition, l'ancienne STEP et la nouvelle installation, de type **Rhizosphère**, ont été comptabilisées simultanément. Cette modernisation est un investissement stratégique qui se traduira par des **impacts positifs visibles à court terme sur la qualité du rejet au milieu naturel**.

Dès 2026, seule la nouvelle usine de dépollution sera comptabilisée.

PMA - SECTEUR PERI URBAIN ASS

Nombre de points de rejet	2021	2022	2023	2024	2025
Nombre d'usines de dépollution	20	20	20	20	21
Nombre de trop-pleins de postes de relèvement/refoulement			13	13	13

L'augmentation du nombre d'usines de dépollution en 2025 (passant de 20 à 21) est due à la **mise en service de la nouvelle station d'épuration de Roches Les Blamont** fin 2025.

PMA - SECTEUR PMA29 ASS

Nombre de points de rejet	2021	2022	2023	2024	2025
Nombre d'usines de dépollution	3	3	3	3	3
Nombre de trop-pleins de postes de relèvement/refoulement			28	28	28

	2021	2022	2023	2024	2025
Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte	20	20	110	110	110

Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte	Barème	Valeur ICR
Partie A : Eléments communs à tous les types de réseaux (100 points)		
Identification des points de rejets potentiels aux milieux récepteurs	20	20
Évaluation de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel de rejet	10	10
Etude terrain des points de déversements - id moment et taille du déversement	20	20
Mesures débit et pollution sur les points de rejet	30	30
Réalisation rapport sur la surveillance des systèmes de collecte et stations d'épuration	10	10
Connaissance qualité des milieux récepteurs et évaluation impact des rejets sur le milieu récepteur	10	0

Total Partie A	**100**	**90**
Partie B : Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs (10 points qui ne sont comptabilisés que si 80 points au moins ont été obtenus en partie A)		
Évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur	10	10
Partie C : Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou mixtes (10 points qui ne sont comptabilisés que si 80 points au moins ont été obtenus en partie A)		
Mise en place suivi de la pluviométrie des principaux déversoirs d'orage	10	10
Total:	**120**	**110**

Le cumul des points de la partie A s'arrête à la première réponse négative.

CONFORMITÉ DE LA COLLECTE

PMA - SECTEUR PERI URBAIN ASS

Hauteur de pluie totale (mm)

Pas de déversoir d'orage de plus de 2 000 EQH sur le secteur périurbain donc pas de données sur périurbain même si il y a des pluviomètres

PMA - SECTEUR PMA29 ASS

Hauteur de pluie totale (mm)	2023	2024	2025
BO SOCHAUX-BO ET DO SO1	1 097	1 192	989
DO AUDINCOURT AUD12	1 047	1 210	1 067
DO AUDINCOURT AUD13 SUPER U	1 047	1 210	1 067
DO AUDINCOURT AUD17 ACACIAS	1 041	1 210	1 067
DO AUDINCOURT AUD25	1 041	1 210	1 067
DO BADEVEL BO RUE DU STADE	1 071	1 270	1 089
DO BAVANS BAV4 PHARMACIE	999	1 139	937
DO BETHONCOURT BET02 EX UDEP	1 097	1 192	989
DO DAMPIERRE DOUBS PR EGLISE	999	1 139	937
DO EXINCOURT EXN15 CLÉMENCEAU	1 080	1 251	1 120
DO GRAND CHARMONT GCH01	1 097	1 192	989
DO MONTBELIARD MON57	1 071	1 270	1 089
DO MONTBELIARD MON58	1 097	1 192	989
DO MONTBELIARD MON60 BO ZUP	1 072	1 270	1 089
DO MONTBELIARD MON61 HELVÉTIE	1 071	1 270	1 089
DO MONTBELIARD MON62 CHIFFOGNE	1 096	1 221	1 013
DO VALENTIGNEY VAL10 MAIRIE	999	1 139	937
DO VALENTIGNEY VAL3 ABATTOIRS	999	1 139	937
DO VALENTIGNEY VAL4 DOUBS	999	1 139	937
DO VIEUX CHARMONT BROGNARD	1 097	1 192	989

DO VOUJEAUCOURT VOU7 SERVICE	1 041	1 210	1 067
DO VOUJEAUCOURT VOU8 DAMPIERRE	999	1 139	937
PR AUDINCOURT TEMPLE	993	1 150	943
PR BETHONCOURT ECOLE	1 097	1 192	989
PR ETUPES ZI	1 071	1 270	1 089
PR EXINCOURT NORD	1 097	1 192	989
PR FESCHES LE CHATEL DORMOY	1 071	1 270	1 089
PR MANDEURE ROMAINE	999	1 139	937
PR VALENTIGNEY CYCLES	999	1 139	937
PR VIEUX CHARMONT MOULIN	1 097	1 192	989
Moyenne	**1 053**	**1 198**	**1 012**

PMA - SECTEUR PERI URBAIN ASS

Volumes totaux déversés (par temps sec et par temps de pluie) (en m3)

Pas de déversoir d'orage de plus de 2 000 EQH sur le secteur périurbain donc pas de données sur périurbain

PMA - SECTEUR PMA29 ASS

Volumes totaux déversés (par temps sec et par temps de pluie) (en m3)	**2023**	**2024**	**2025**
BO SOCHAUX-BO ET DO SO1	8 568	24 689	15 189
DO AUDINCOURT AUD12	7 314	9 588	9 773
DO AUDINCOURT AUD13 SUPER U	0	0	0
DO AUDINCOURT AUD17 ACACIAS	10 025	16 323	15 160
DO AUDINCOURT AUD25	4 336	4 008	2 283
DO BADEVEL BO RUE DU STADE	34 964	21 457	16 192
DO BAVANS BAV4 PHARMACIE	14 467	13 686	11 468
DO BETHONCOURT BET02 EX UDEP	25 602	24 998	15 852
DO DAMPIERRE DOUBS PR EGLISE	31 737	30 963	19 038
DO EXINCOURT EXN15 CLÉMENCEAU	50 701	73 456	49 079
DO GRAND CHARMONT GCH01	22 461	11 619	3 898
DO MONTBELIARD MON57	3 607	11 892	3 240
DO MONTBELIARD MON58	0	0	0
DO MONTBELIARD MON60 BO ZUP	144 707	166 288	35 618
DO MONTBELIARD MON61 HELVÉTIE	48 625	58 909	42 539
DO MONTBELIARD MON62 CHIFFOGNE	54 271	66 442	21 876
DO VALENTIGNEY VAL10 MAIRIE	19 104	25 460	34 583
DO VALENTIGNEY VAL3 ABATTOIRS	19 200	26 908	6 720
DO VALENTIGNEY VAL4 DOUBS	19 009	16 301	3 350
DO VIEUX CHARMONT BROGNARD	3 677	7 167	7 071
DO VOUJEAUCOURT VOU7 SERVICE	141 401	56 025	40 673
DO VOUJEAUCOURT VOU8 DAMPIERRE	3 091	4 643	8 815
PR AUDINCOURT TEMPLE	149 859	185 779	76 848
PR BETHONCOURT ECOLE	0	289	0

PR ETUPES ZI	2 573	1 061	1 028
PR EXINCOURT NORD	7 807	9 182	9 089
PR FESCHES LE CHATEL DORMOY	67		0
PR MANDEURE ROMAINE	0	0	0
PR VALENTIGNEY CYCLES	0	0	0
PR VIEUX CHARMONT MOULIN	2 002	5 189	17 640
Total	**829 174**	**872 321**	**467 019**

PMA - SECTEUR PERI URBAIN ASS

Charges totales déversées (par temps sec et par temps de pluie) (en kgDBO5)

.Pas de déversoir d'orage de plus de 2 000 EQH sur le secteur péri urbain

PMA - SECTEUR PMA29 ASS

Charges totales déversées (par temps sec et par temps de pluie) (en kgDBO5)	**2023**	**2024**	**2025**
BO SOCHAUX-BO ET DO SO1	489	1 475	947
DO AUDINCOURT AUD12	828	753	888
DO AUDINCOURT AUD13 SUPER U		0	0
DO AUDINCOURT AUD17 ACACIAS	878	1 282	1 377
DO AUDINCOURT AUD25	380	315	207
DO BADEVEL BO RUE DU STADE		1 282	1 009
DO BAVANS BAV4 PHARMACIE	1 267	237	602
DO BETHONCOURT BET02 EX UDEP	2 243	1 494	988
DO DAMPIERRE DOUBS PR EGLISE	2 780	535	999
DO EXINCOURT EXN15 CLÉMENCEAU	4 441	4 390	3 059
DO GRAND CHARMONT GCH01	1 968	694	243
DO MONTBELIARD MON57	408	711	202
DO MONTBELIARD MON58		0	0
DO MONTBELIARD MON60 BO ZUP	8 263	9 937	2 220
DO MONTBELIARD MON61 HELVÉTIE	2 776	3 520	2 651
DO MONTBELIARD MON62 CHIFFOGNE	3 099	3 970	1 363
DO VALENTIGNEY VAL10 MAIRIE	1 673	2 000	3 141
DO VALENTIGNEY VAL3 ABATTOIRS	1 682	2 113	610
DO VALENTIGNEY VAL4 DOUBS	1 665	1 280	304
DO VIEUX CHARMONT BROGNARD		428	441
DO VOUJEAUCOURT VOU7 SERVICE	12 387	4 400	3 694
DO VOUJEAUCOURT VOU8 DAMPIERRE	271	80	463
PR AUDINCOURT TEMPLE	13 128	14 592	6 980
PR BETHONCOURT ECOLE		17	0
PR ETUPES ZI	147	63	64
PR EXINCOURT NORD	446	549	566
PR FESCHES LE CHATEL DORMOY	6	0	0

PR MANDEURE ROMAINE		0	0
PR VALENTIGNEY CYCLES		0	0
PR VIEUX CHARMONT MOULIN	175	310	1 099
Total	**61 400**	**56 430**	**34 119**

5.2. Traitement

Conformité globale

Conformité réglementaire des rejets	à l'arrêté préfectoral
	100,00
LAGUNE BEUTAL village	100,00
LAGUNE BRETIGNEY	100,00
LAGUNE PRESENTVILLERS	100,00
LAGUNE SOLEMONT	100,00
STEP ABBEVILLERS	100,00
STEP BLAMONT	100,00
STEP COLOMBIER FONTAINE	100,00
STEP DAMBELIN	100,00
STEP DUNG	100,00
STEP ECHENANS	100,00
STEP ECOT	100,00
STEP FEULE Roselière	100,00
STEP MONTENOIS	100,00
STEP PONT DE ROIDE VERMONDANS	100,00
STEP ROCHES BLAMONT RIZOSPHÈRE	100,00
STEP ROCHES LES BLAMONT	100,00
STEP SAINT MAURICE COLOMBIER	100,00
STEP SAINTE MARIE	100,00
STEP VILLARS LES BLAMONT Rhizo	100,00
UDEP ARBOUANS	100,00
UDEP BAVANS	100,00
UDEP SAINTE SUZANNE	100,00

Pour établir la performance globale, dans le cas de plusieurs usines de dépollution, le taux de chaque usine est pondéré par la charge en DBO5 arrivant sur le système de traitement.

PMA - SECTEUR PERI URBAIN ASS

Conformité réglementaire des rejets	à l'arrêté préfectoral
	100,00
LAGUNE BEUTAL village	100,00
LAGUNE BRETIGNEY	100,00
LAGUNE PRESENTVILLERS	100,00
LAGUNE SOLEMONT	100,00
STEP ABBEVILLERS	100,00
STEP BLAMONT	100,00
STEP COLOMBIER FONTAINE	100,00
STEP DAMBELIN	100,00

STEP DUNG	100,00
STEP ECHENANS	100,00
STEP ECOT	100,00
STEP FEULE Roselière	100,00
STEP MONTENOIS	100,00
STEP PONT DE ROIDE VERMONDANS	100,00
STEP ROCHES BLAMONT RIZOSPHÈRE	100,00
STEP ROCHES LES BLAMONT	100,00
STEP SAINT MAURICE COLOMBIER	100,00
STEP SAINTE MARIE	100,00
STEP VILLARS LES BLAMONT Rhizo	100,00

Pour établir la performance globale, dans le cas de plusieurs usines de dépollution, le taux de chaque usine est pondéré par la charge en DBO5 arrivant sur le système de traitement.

PMA - SECTEUR PMA29 ASS

Conformité réglementaire des rejets	**à l'arrêté préfectoral**
	100,00
UDEP ARBOUANS	100,00
UDEP BAVANS	100,00
UDEP SAINTE SUZANNE	100,00

Pour établir la performance globale, dans le cas de plusieurs usines de dépollution, le taux de chaque usine est pondéré par la charge en DBO5 arrivant sur le système de traitement.

Conformité des performances des équipements d'épuration	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Performance globale du service (%)	**87**	**94**	**98**	**97**	**100**

Pour établir la performance globale, dans le cas de plusieurs usines de dépollution, le taux de chaque usine est pondéré par la charge en DBO5 arrivant sur le système de traitement.

PMA - SECTEUR PERI URBAIN ASS

Conformité des performances des équipements d'épuration	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Performance globale du service (%)			**95**	**86**	**100**
STEP COLOMBIER FONTAINE			100	92	100
STEP DUNG			83	100	100
STEP ECHENANS			100	100	100
STEP PONT DE ROIDE VERMONDANS			91	75	100

Pour établir la performance globale, dans le cas de plusieurs usines de dépollution, le taux de chaque usine est pondéré par la charge en DBO5 arrivant sur le système de traitement.

PMA - SECTEUR PMA29 ASS

Conformité des performances des équipements d'épuration	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Performance globale du service (%)			**99**	**99**	**100**
UDEP ARBOUANS			100	99	100
UDEP BAVANS			100	100	100
UDEP SAINTE SUZANNE			97	99	100

Pour établir la performance globale, dans le cas de plusieurs usines de dépollution, le taux de chaque usine est pondéré par la charge en DBO5 arrivant sur le système de traitement.

	2021	2022	2023	2024	2025
Taux de boues évacuées selon une filière conforme (%)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
LAGUNE BEUTAL village					100
STEP ABBEVILLERS	100	100	100	100	100
STEP BLAMONT	100	100	100	100	100
STEP COLOMBIER FONTAINE	100	100	100	100	100
STEP DAMBELIN	100	100	100	100	100
STEP DUNG		100	0	100	100
STEP ECHENANS		100	100	100	100
STEP ECOT	100	100	100	100	100
STEP MONTENOIS	100		100		100
STEP PONT DE ROIDE VERMONDANS	100	100	100	100	100
STEP ROCHES LES BLAMONT	100	100	100	100	100
STEP SAINT MAURICE COLOMBIER	100	100	100	100	100
STEP SAINTE MARIE		100	100	100	100
UDEP ARBOUANS			100	100	100
UDEP BAVANS			100	100	100
UDEP SAINTE SUZANNE			100	100	100

PMA - SECTEUR PERI URBAIN ASS

	2021	2022	2023	2024	2025
Taux de boues évacuées selon une filière conforme (%)			**100**	**100**	**100**
LAGUNE BEUTAL village					100
STEP ABBEVILLERS				100	100
STEP BLAMONT			100	100	100
STEP COLOMBIER FONTAINE			100	100	100
STEP DAMBELIN				100	100
STEP DUNG			100	100	100
STEP ECHENANS			100	100	100
STEP ECOT			100	100	100
STEP MONTENOIS			100		100
STEP PONT DE ROIDE VERMONDANS			100	100	100
STEP ROCHES LES BLAMONT				100	100
STEP SAINT MAURICE COLOMBIER			100	100	100
STEP SAINTE MARIE				100	100

PMA - SECTEUR PMA29 ASS

	2021	2022	2023	2024	2025
Taux de boues évacuées selon une filière conforme (%)			**100**	**100**	**100**
UDEP ARBOUANS			100	100	100
UDEP BAVANS			100	100	100
UDEP SAINTE SUZANNE			100	100	100

5.3. Bilan d'exploitation et de conformité

Bilan d'exploitation et de conformité par station

PMA - SECTEUR PERI URBAIN ASS

LAGUNE BEUTAL village

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le tableau qui suit. Il s'agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté préfectoral d'autorisation, ou à défaut manuel d'autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de conformité


	2025
Débit de référence (m3/j)	41
Capacité nominale (kg/j)	16


Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*)

	DCO	DBO5	MES	NTK	NGL	NH4	Ptot
Concentration maximale à respecter (mg/L) (*)							
moyenne journalière par bilan		35,00					
Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L)							
moyenne journalière par bilan		70,00					
Charge maximale à respecter (kg/j)							
Rendement minimum moyen (%)							
moyen journalier par bilan	60,00	60,00					

* : En général, pour les paramètres NTK, NGL et Ptot, les conformités se jugent en moyennes annuelles, et pour les autres paramètres en moyennes journalières par bilan, cela sous réserve d'absence d'indications complémentaires d'arrêtés préfectoraux locaux.

File Eau

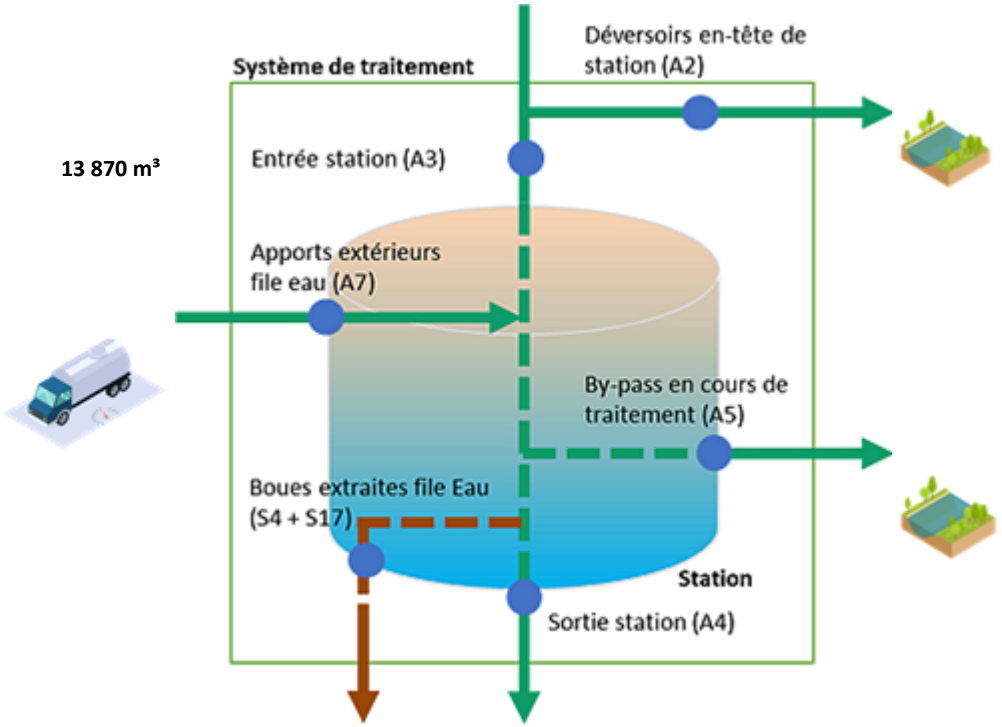

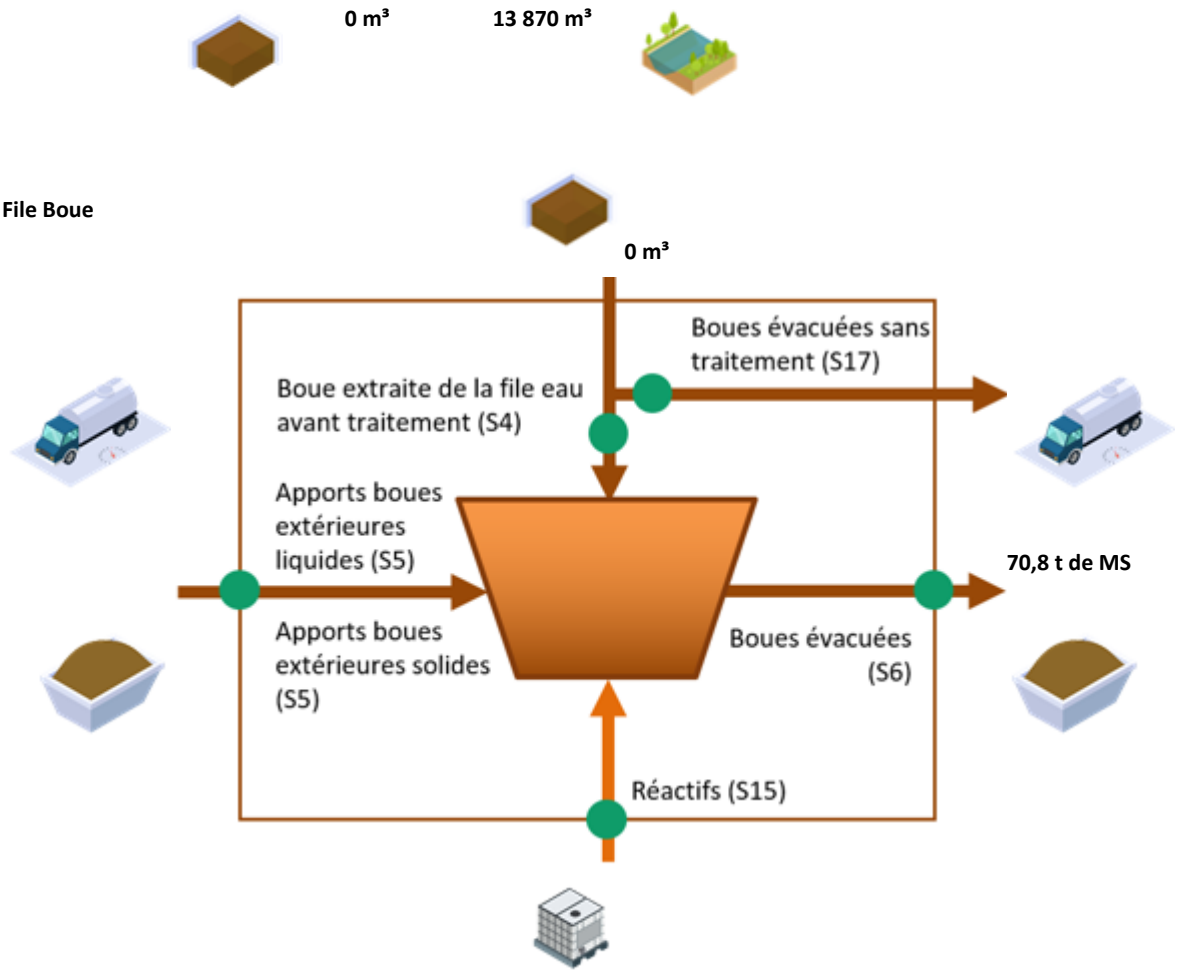
0 m³
13 870 m³
File Boue
0 m³
Boues évacuées sans traitement (S17)
Boue extraite de la file eau avant traitement (S4)
Apports boues extérieures liquides (S5)
70,8 t de MS
Apports boues extérieures solides (S5)
Boues évacuées (S6)
Réactifs (S15)


Fréquences d'analyses


Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre.


	2025
DCO	1
DBO5	1
MES	1
NTK	1
NGL	1
Ptot	1


Concentrations en sortie et rendements épuratoires


Les graphiques suivants présentent la qualité d'eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les rendements épuratoires obtenus :

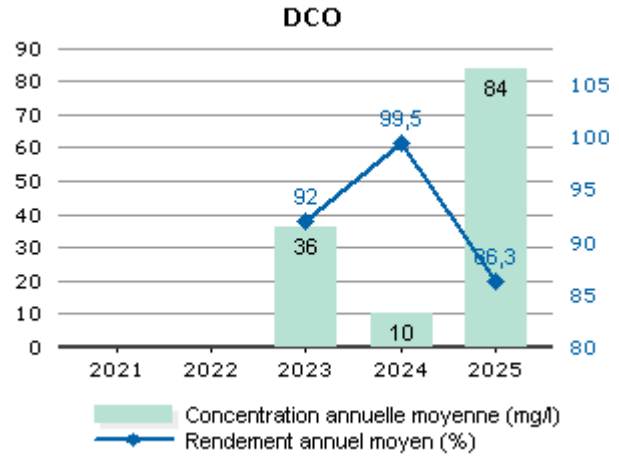

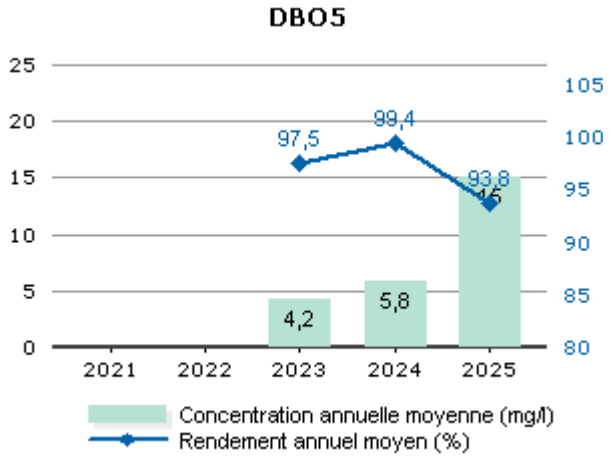

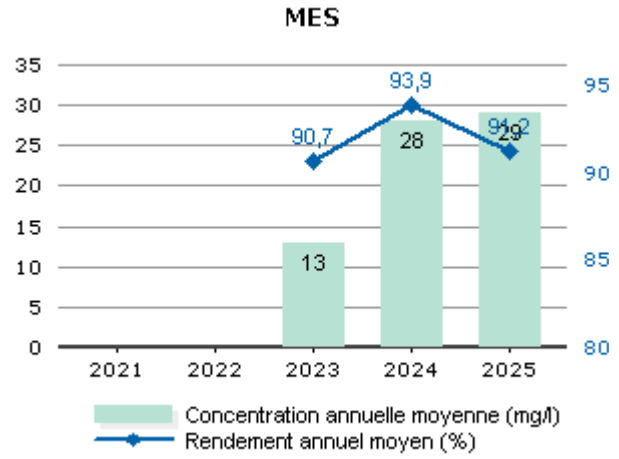

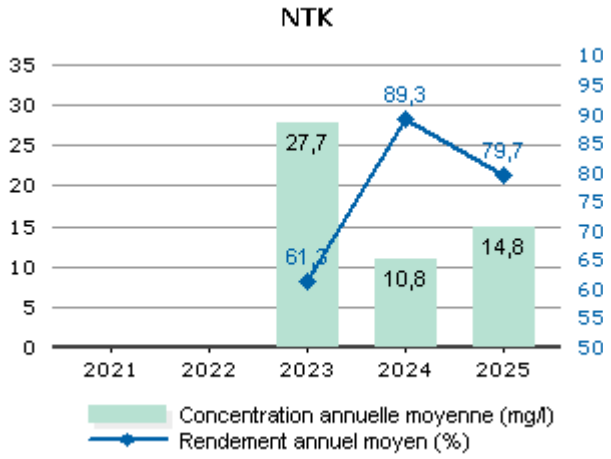

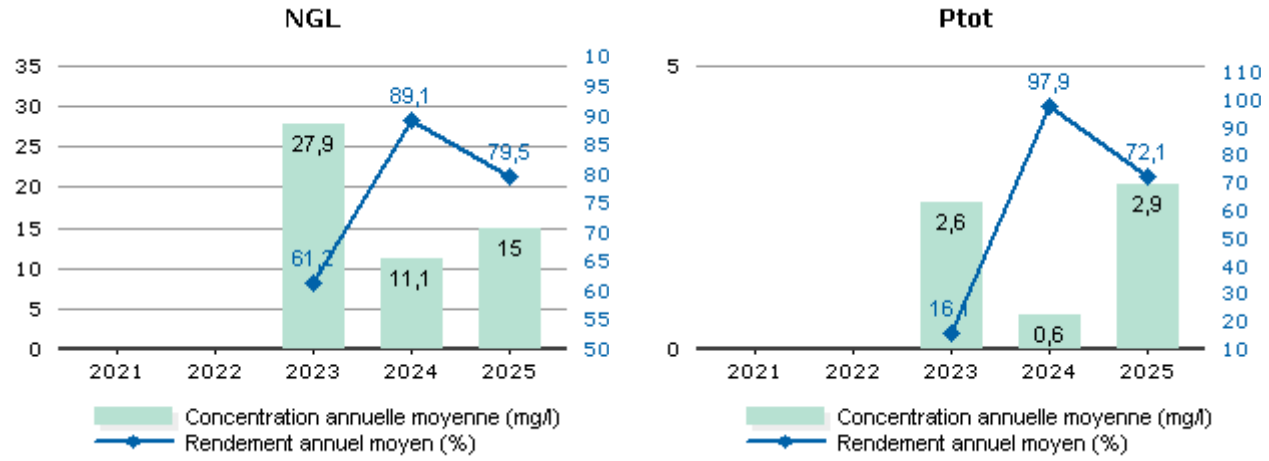

Les valeurs moyennes observées en sortie du système de traitement (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la prescription qui est à présent à calculer en considérant les débits à hauteur du débit de référence. L'évaluation du taux de respect fait l'objet de l'indicateur de conformité locale présenté dans la suite de la présente section.

Conformité de la performance

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations, …). La conformité locale est définie au regard des prescriptions de l'arrêté préfectoral.

	2021	2022	2023	2024	2025
Conformité à l'arrêté préfectoral			100,00	100,00	100,00

A partir de 2019, cette conformité est évaluée suivant les nouvelles règles de calcul que celles des outils du Ministère (prise en compte des débits à hauteur du débit de référence en entrée et sortie, prise en compte du débit entrant en station pour définir si la station est en ou hors condition normale de fonctionnement, prise en compte du débit de référence mentionné dans l'acte administratif (arrêté préfectoral local). Cette évaluation reste fournie à titre indicatif. Seule l'évaluation transmise par le Service de Police de l'Eau en mars a une valeur officielle.

Qualité du traitement des boues

Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration

Cet indicateur permet d'évaluer l'efficacité de dépollution des usines (extraction et concentration de la pollution de l'effluent traité). Il s'exprime en tonnage de matières sèches.

	2021	2022	2023	2024	2025
Boues évacuées (Tonnes de MS) (S6)					70,8

Boues évacuées par destination et proportion évacuée selon une filière conforme

Ce tableau présente la proportion de boues évacuées selon une filière conforme.

	2021	2022	2023	2024	2025
Taux de boues évacuées selon une filière conforme (%)					100,0

Destination des boues évacuées

Ce tableau présente le détail pour l'année des destinations des boues évacuées.

	Produit brut (t)	Siccité (%)	Matières sèches (t)	Destination conforme (%) *
Valorisation agricole	1026	6,90	70,8	100,00
Total	**1026**	**6,90**	**70,8**	**100,00**

* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches.

Sous-produits évacués par destination

Ce tableau présente les sous-produits générés et leur devenir.

	2021	2022	2023	2024	2025
Centre de stockage de déchets (t) Refus			0,2		
Total (t)			0,2		

LAGUNE BRETIGNEY

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le tableau qui suit. Il s'agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté préfectoral d'autorisation, ou à défaut manuel d'autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de conformité


	2025
Débit de référence (m3/j)	33
Capacité nominale (kg/j)	6


Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*)

	DCO	DBO5	MES	NTK	NGL	NH4	Ptot
Concentration maximale à respecter (mg/L) (*)							
moyenne journalière par bilan		35,00					
Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L)							
moyenne journalière par bilan		70,00					
Charge maximale à respecter (kg/j)							
Rendement minimum moyen (%)							
moyen journalier par bilan	60,00	60,00					


* : En général, pour les paramètres NTK, NGL et Ptot, les conformités se jugent en moyennes annuelles, et pour les autres paramètres en moyennes journalières par bilan, cela sous réserve d'absence d'indications complémentaires d'arrêtés préfectoraux locaux.

File Eau

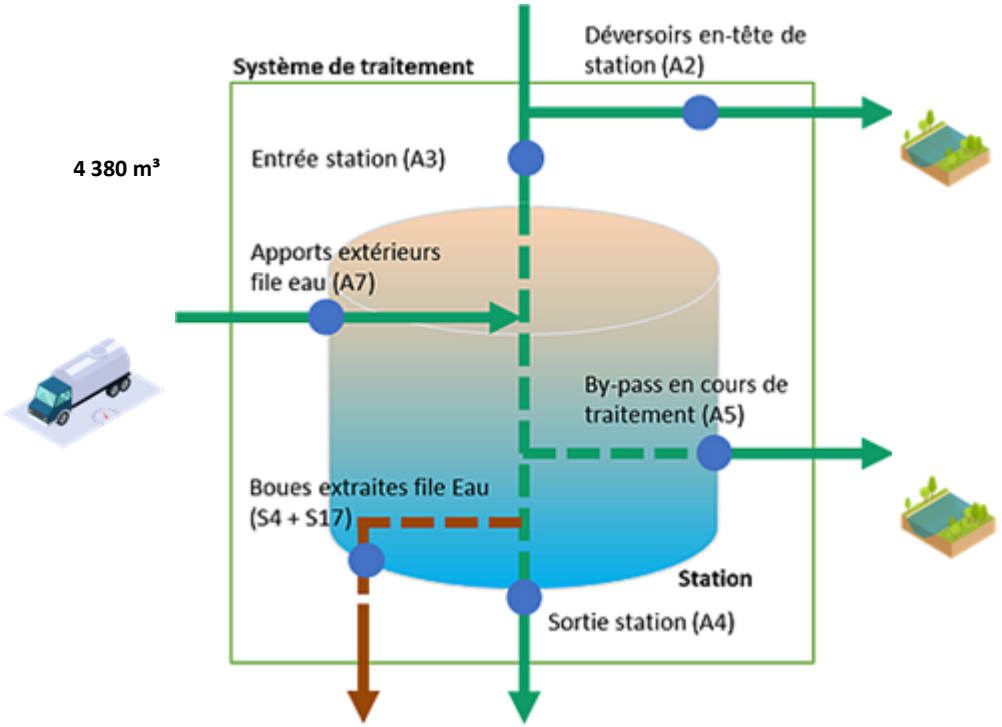


0 m³
4 380 m³

File Boue

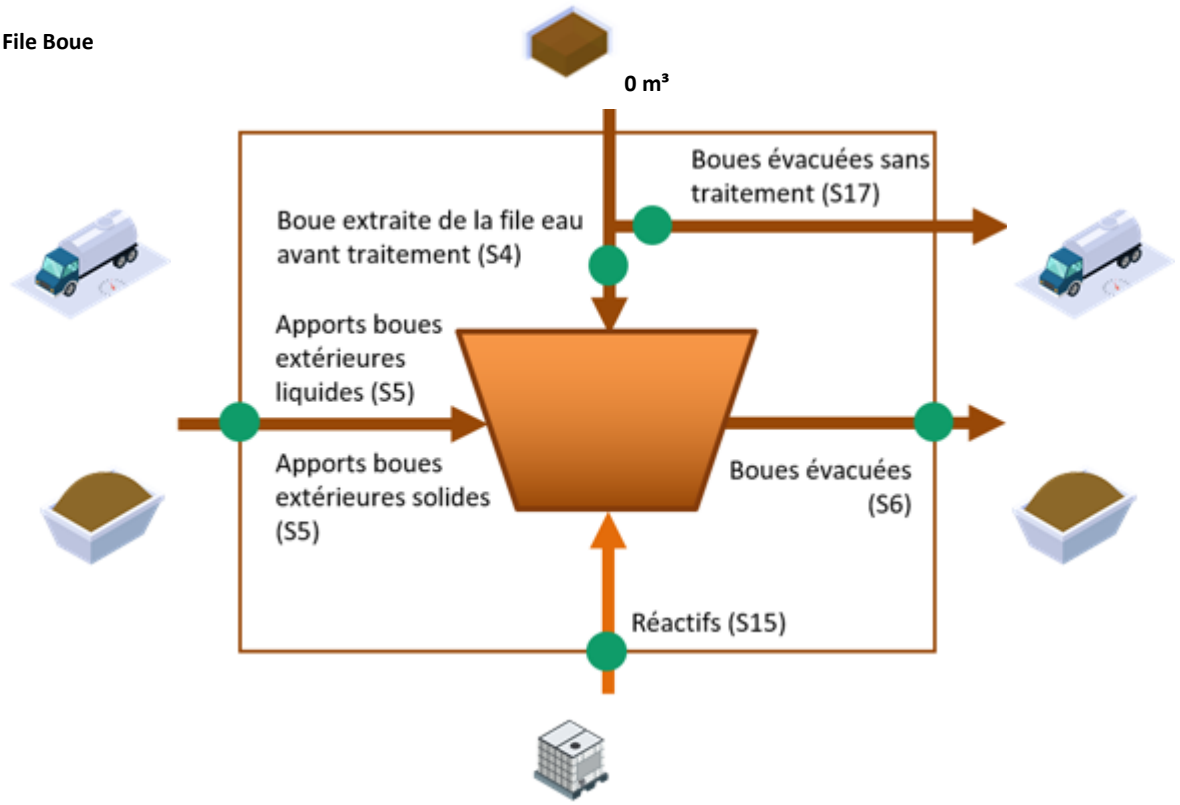
0 m³
Boues évacuées sans traitement (S17)
Boue extraite de la file eau avant traitement (S4)
Apports boues extérieures liquides (S5)
Apports boues extérieures solides (S5)
Boues évacuées (S6)
Réactifs (S15)


Fréquences d'analyses


Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre.


	2025
DCO	1
DBO5	1
MES	1
NTK	1
NGL	1
Ptot	1


Concentrations en sortie et rendements épuratoires


Les graphiques suivants présentent la qualité d'eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les rendements épuratoires obtenus :

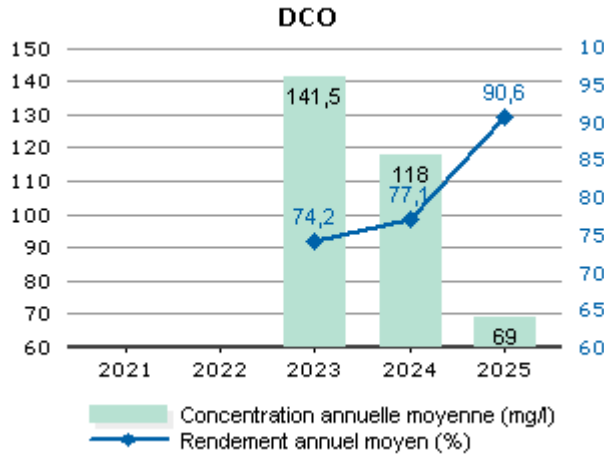


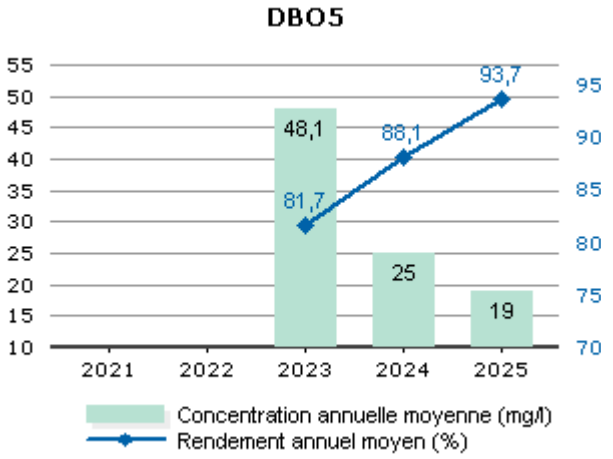

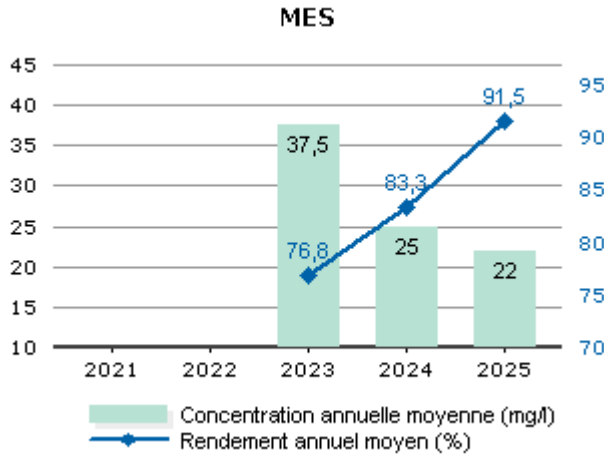

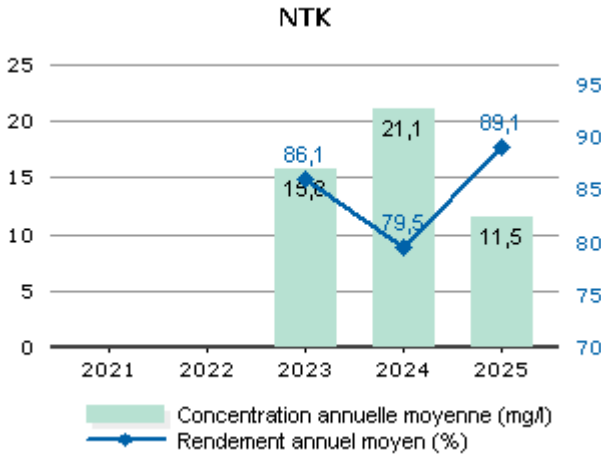

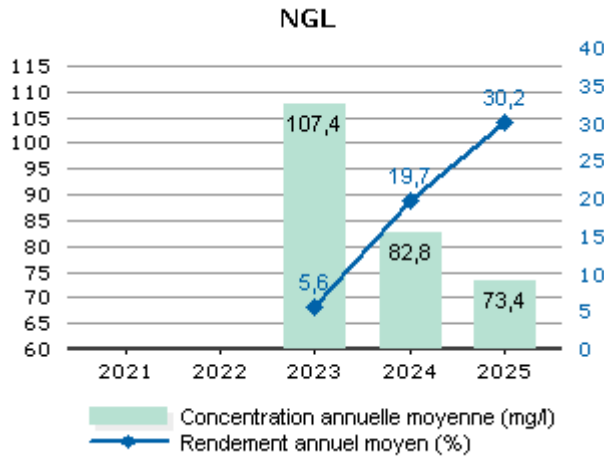

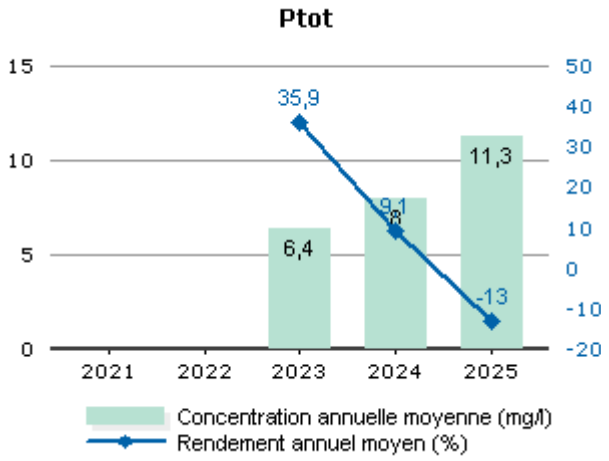

Les valeurs moyennes observées en sortie du système de traitement (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la prescription qui est à présent à calculer en considérant les débits à hauteur du débit de référence. L'évaluation du taux de respect fait l'objet de l'indicateur de conformité locale présenté dans la suite de la présente section.

Conformité de la performance

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations, …). La conformité locale est définie au regard des prescriptions de l'arrêté préfectoral.

	2021	2022	2023	2024	2025
Conformité à l'arrêté préfectoral			100,00	100,00	100,00

A partir de 2019, cette conformité est évaluée suivant les nouvelles règles de calcul que celles des outils du Ministère (prise en compte des débits à hauteur du débit de référence en entrée et sortie, prise en compte du débit entrant en station pour définir si la station est en ou hors condition normale de fonctionnement, prise en compte du débit de référence mentionné dans l'acte administratif (arrêté préfectoral local). Cette évaluation reste fournie à titre indicatif. Seule l'évaluation transmise par le Service de Police de l'Eau en mars a une valeur officielle.

Qualité du traitement des boues

LAGUNE PRESENTVILLERS

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le tableau qui suit. Il s'agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté préfectoral d'autorisation, ou à défaut manuel d'autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de conformité


	2025
Débit de référence (m3/j)	1 320
Capacité nominale (kg/j)	30


Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*)

	DCO	DBO5	MES	NTK	NGL	NH4	Ptot
Concentration maximale à respecter (mg/L) (*)							
moyenne journalière par bilan		35,00					
Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L)							
moyenne journalière par bilan		70,00					
Charge maximale à respecter (kg/j)							
Rendement minimum moyen (%)							
moyen journalier par bilan	60,00	60,00					


* : En général, pour les paramètres NTK, NGL et Ptot, les conformités se jugent en moyennes annuelles, et pour les autres paramètres en moyennes journalières par bilan, cela sous réserve d'absence d'indications complémentaires d'arrêtés préfectoraux locaux.

File Eau

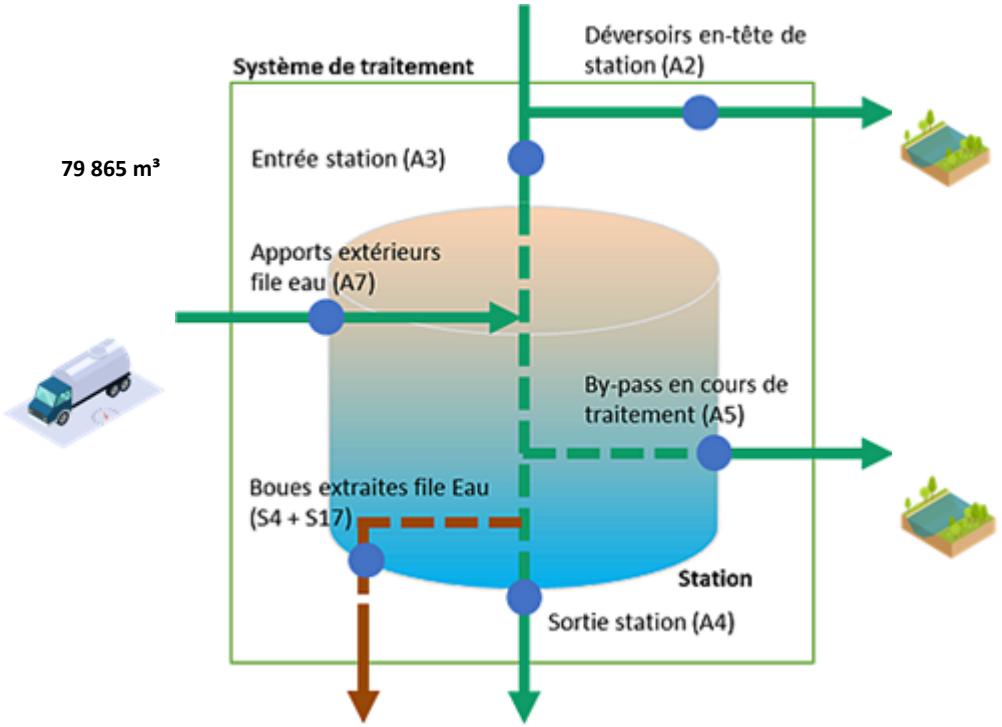


0 m³
79 865 m³

File Boue

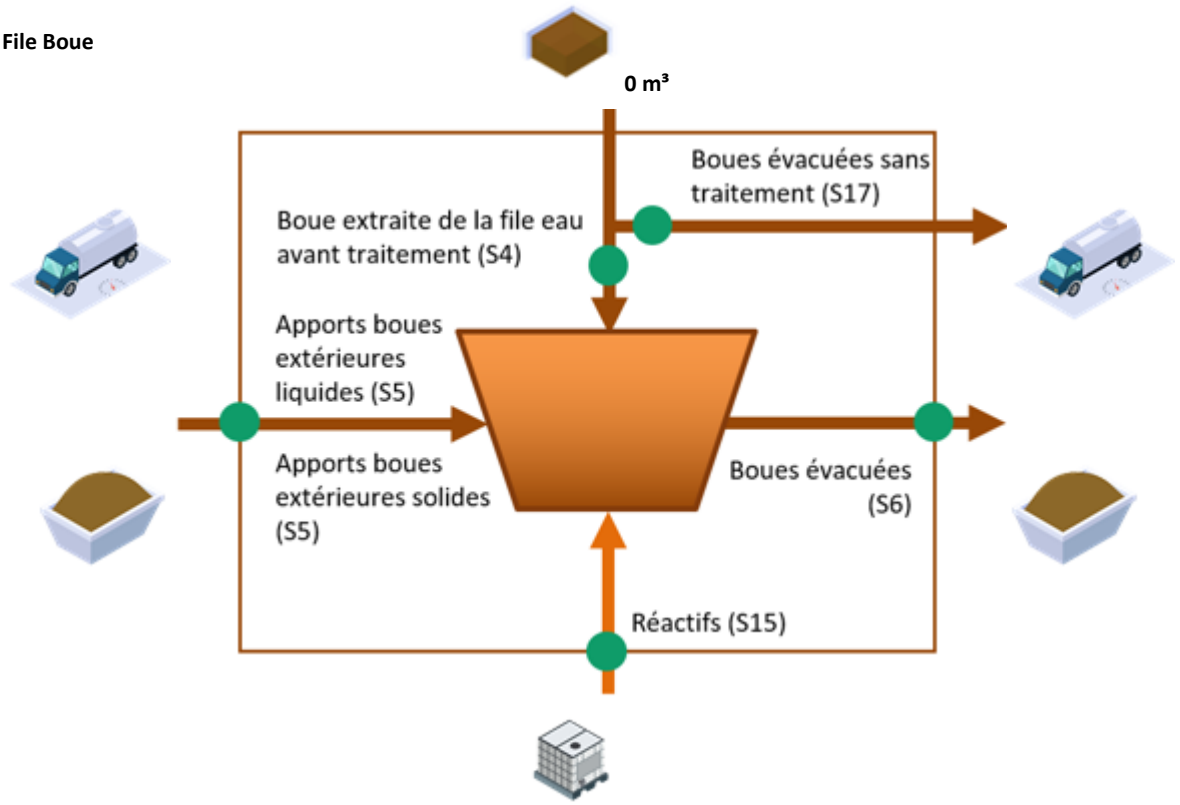
0 m³
Boues évacuées sans traitement (S17)
Boue extraite de la file eau avant traitement (S4)
Apports boues extérieures liquides (S5)
Apports boues extérieures solides (S5)
Boues évacuées (S6)
Réactifs (S15)


Fréquences d'analyses


Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre.


	2025
DCO	1
DBO5	1
MES	1
NTK	1
NGL	1
Ptot	1


Concentrations en sortie et rendements épuratoires


Les graphiques suivants présentent la qualité d'eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les rendements épuratoires obtenus :

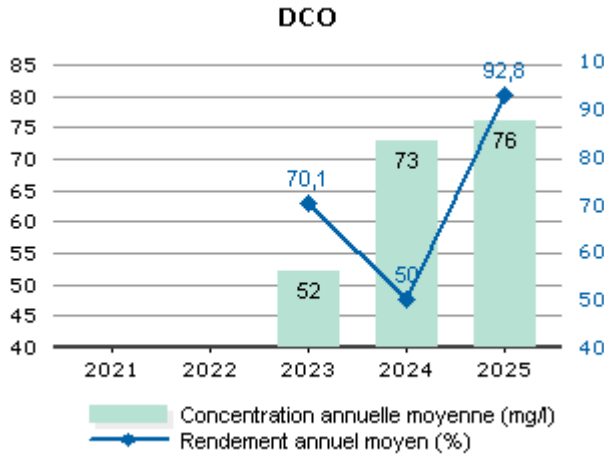


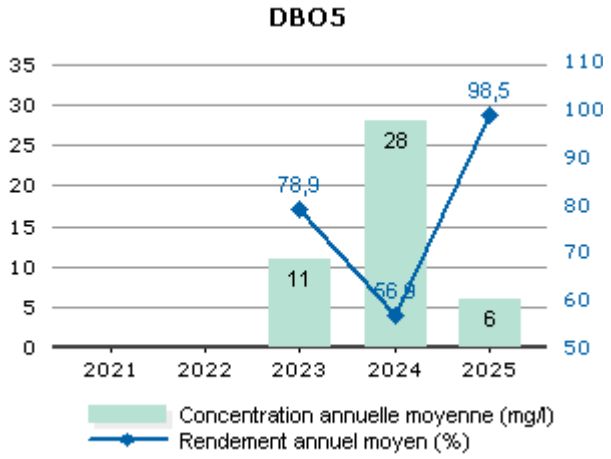

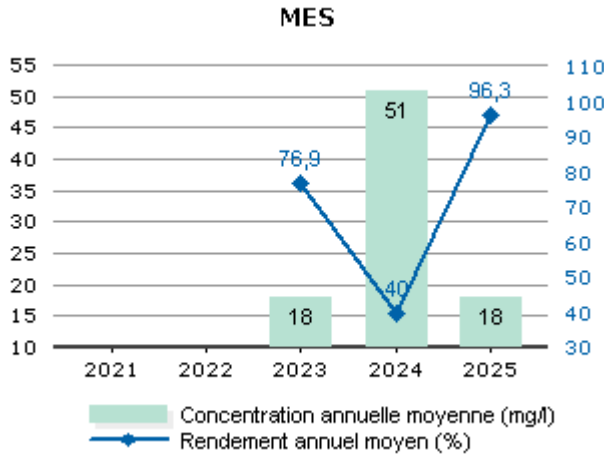

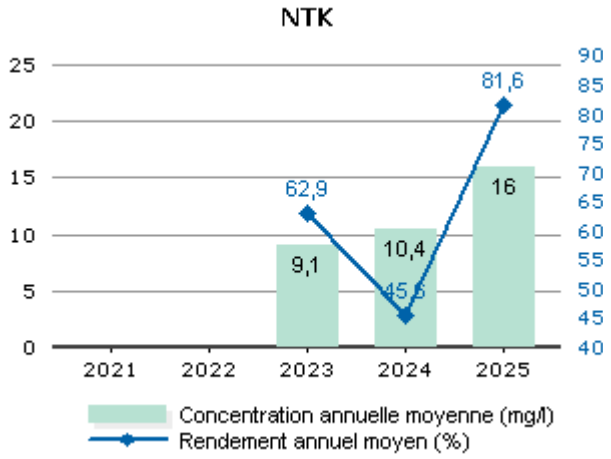

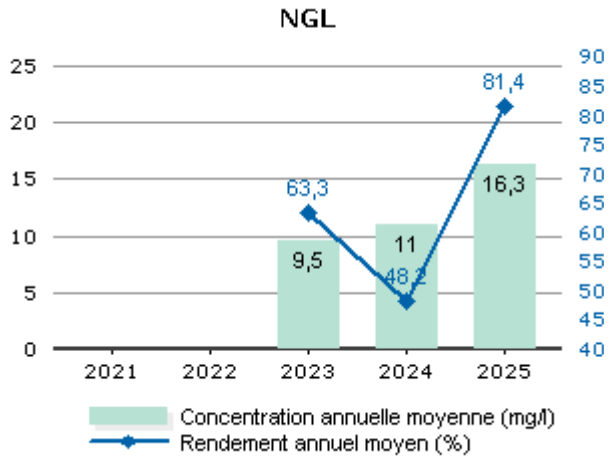

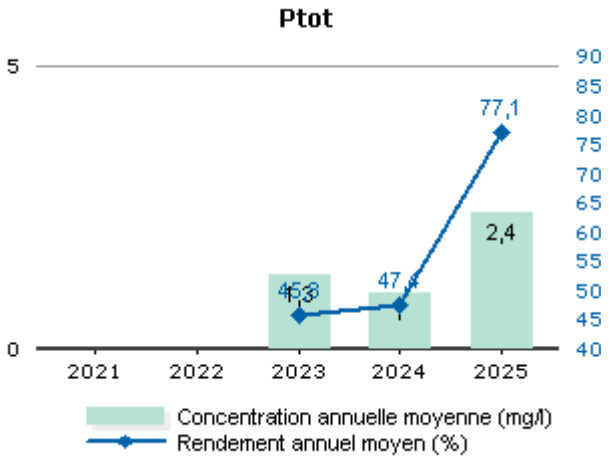

Les valeurs moyennes observées en sortie du système de traitement (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la prescription qui est à présent à calculer en considérant les débits à hauteur du débit de référence. L'évaluation du taux de respect fait l'objet de l'indicateur de conformité locale présenté dans la suite de la présente section.

Conformité de la performance

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations, …). La conformité locale est définie au regard des prescriptions de l'arrêté préfectoral.

	2021	2022	2023	2024	2025
Conformité à l'arrêté préfectoral			100,00	0,00	100,00

A partir de 2019, cette conformité est évaluée suivant les nouvelles règles de calcul que celles des outils du Ministère (prise en compte des débits à hauteur du débit de référence en entrée et sortie, prise en compte du débit entrant en station pour définir si la station est en ou hors condition normale de fonctionnement, prise en compte du débit de référence mentionné dans l'acte administratif (arrêté préfectoral local). Cette évaluation reste fournie à titre indicatif. Seule l'évaluation transmise par le Service de Police de l'Eau en mars a une valeur officielle.

LAGUNE SOLEMONT

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le tableau qui suit. Il s'agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté préfectoral d'autorisation, ou à défaut manuel d'autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de conformité


	2025
Débit de référence (m3/j)	38
Capacité nominale (kg/j)	15

Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*)

	DCO	DBO5	MES	NTK	NGL	NH4	Ptot
Concentration maximale à respecter (mg/L) (*)							
moyenne journalière par bilan	90,00	25,00	25,00	20,00			
Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L)							
moyenne journalière par bilan	400,00	70,00	85,00				
Charge maximale à respecter (kg/j)							
Rendement minimum moyen (%)							
moyen journalier par bilan	75,00	70,00	90,00	80,00			


* : En général, pour les paramètres NTK, NGL et Ptot, les conformités se jugent en moyennes annuelles, et pour les autres paramètres en moyennes journalières par bilan, cela sous réserve d'absence d'indications complémentaires d'arrêtés préfectoraux locaux.

File Eau

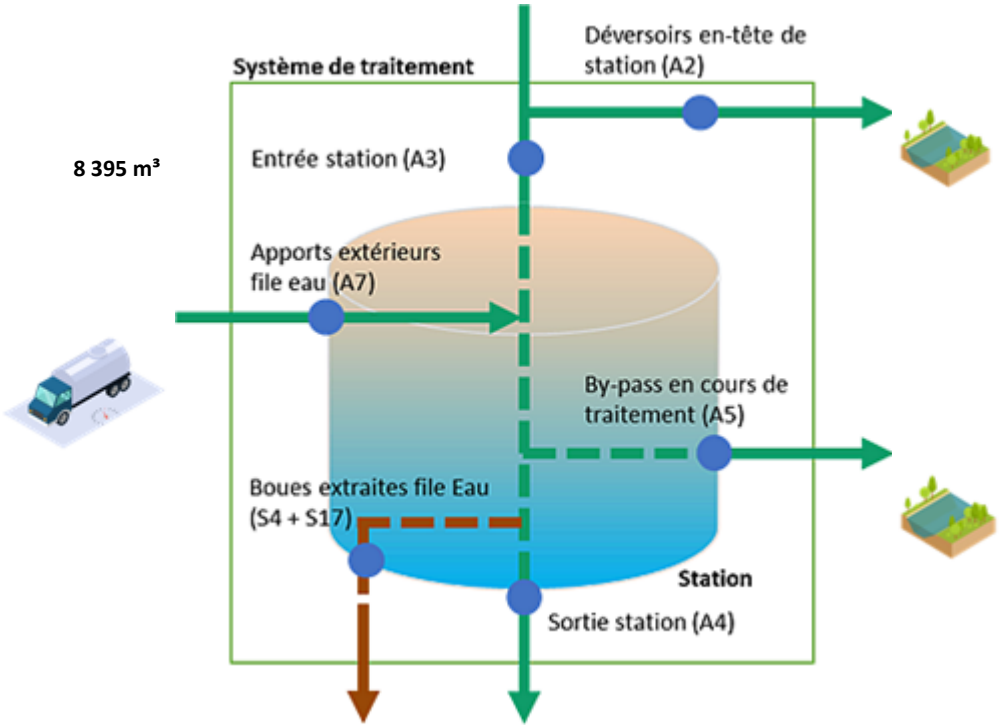


0 m³
8 395 m³

File Boue

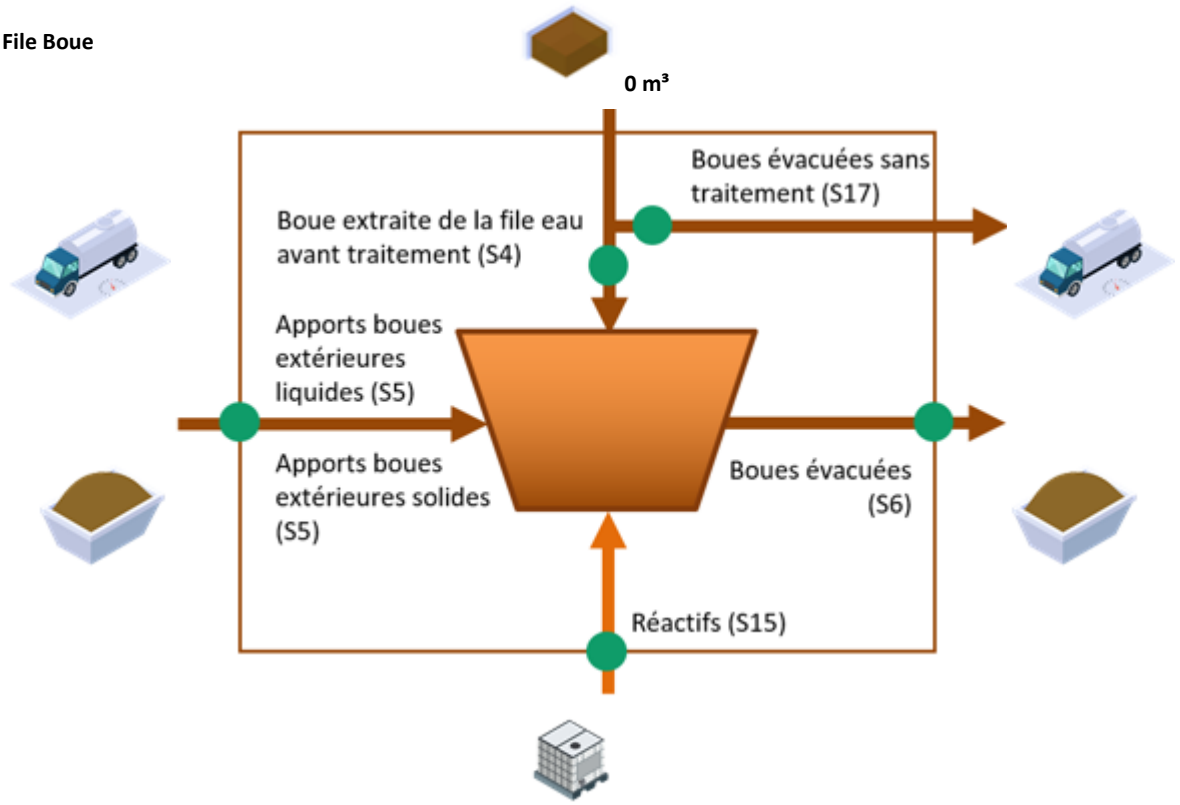
0 m³
Boues évacuées sans traitement (S17)
Boue extraite de la file eau avant traitement (S4)
Apports boues extérieures liquides (S5)
Apports boues extérieures solides (S5)
Boues évacuées (S6)
Réactifs (S15)


Fréquences d'analyses


Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre.


	2025
DCO	1
DBO5	1
MES	1
NTK	1
NGL	1
Ptot	1


Concentrations en sortie et rendements épuratoires


Les graphiques suivants présentent la qualité d'eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les rendements épuratoires obtenus :

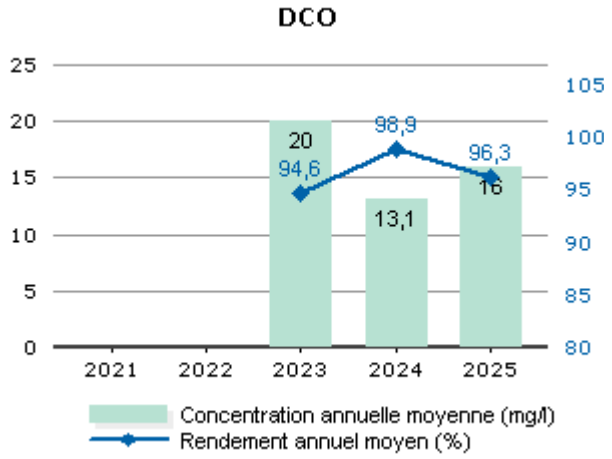


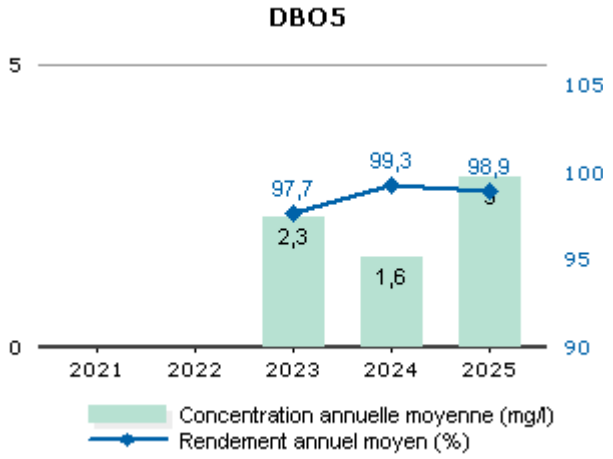

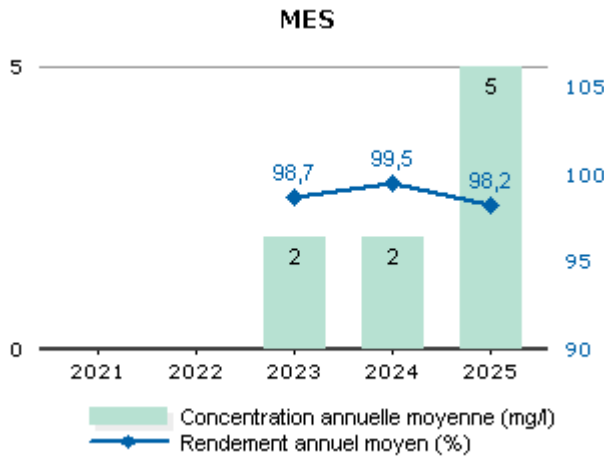

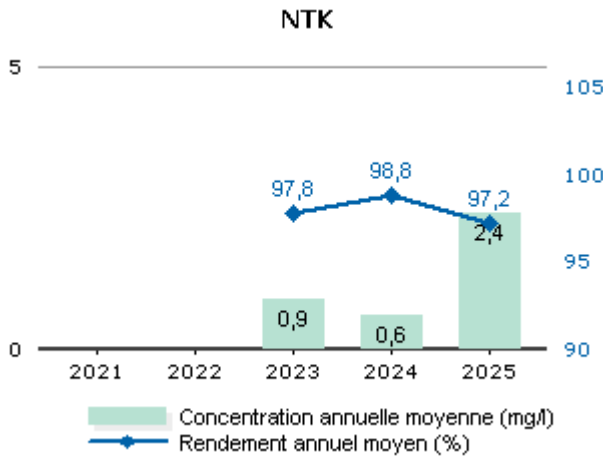

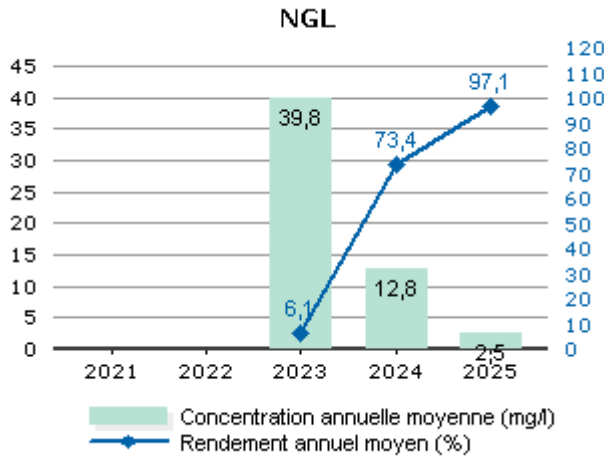

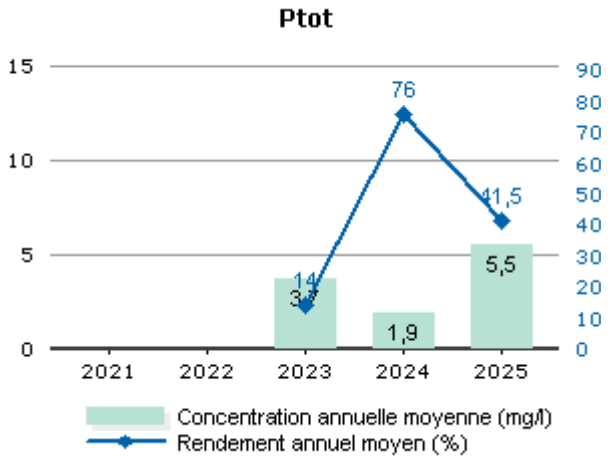

Les valeurs moyennes observées en sortie du système de traitement (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la prescription qui est à présent à calculer en considérant les débits à hauteur du débit de référence. L'évaluation du taux de respect fait l'objet de l'indicateur de conformité locale présenté dans la suite de la présente section.

Conformité de la performance

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations, …). La conformité locale est définie au regard des prescriptions de l'arrêté préfectoral.

	2021	2022	2023	2024	2025
Conformité à l'arrêté préfectoral			100,00	100,00	100,00

A partir de 2019, cette conformité est évaluée suivant les nouvelles règles de calcul que celles des outils du Ministère (prise en compte des débits à hauteur du débit de référence en entrée et sortie, prise en compte du débit entrant en station pour définir si la station est en ou hors condition normale de fonctionnement, prise en compte du débit de référence mentionné dans l'acte administratif (arrêté préfectoral local). Cette évaluation reste fournie à titre indicatif. Seule l'évaluation transmise par le Service de Police de l'Eau en mars a une valeur officielle.

STEP ABBEVILLERS

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le tableau qui suit. Il s'agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté préfectoral d'autorisation, ou à défaut manuel d'autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de conformité


	2025
Débit de référence (m3/j)	240
Capacité nominale (kg/j)	66


Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*)

	DCO	DBO5	MES	NTK	NGL	NH4	Ptot
Concentration maximale à respecter (mg/L) (*)							
moyenne journalière par bilan	125,00	35,00	35,00				
moyenne annuelle				40,00			
Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L)							
moyenne journalière par bilan	400,00	70,00	85,00				
Charge maximale à respecter (kg/j)							
Rendement minimum moyen (%)							
moyen journalier par bilan	60,00	60,00	50,00				
moyen annuel							80,00

* : En général, pour les paramètres NTK, NGL et Ptot, les conformités se jugent en moyennes annuelles, et pour les autres paramètres en moyennes journalières par bilan, cela sous réserve d'absence d'indications complémentaires d'arrêtés préfectoraux locaux.

File Eau

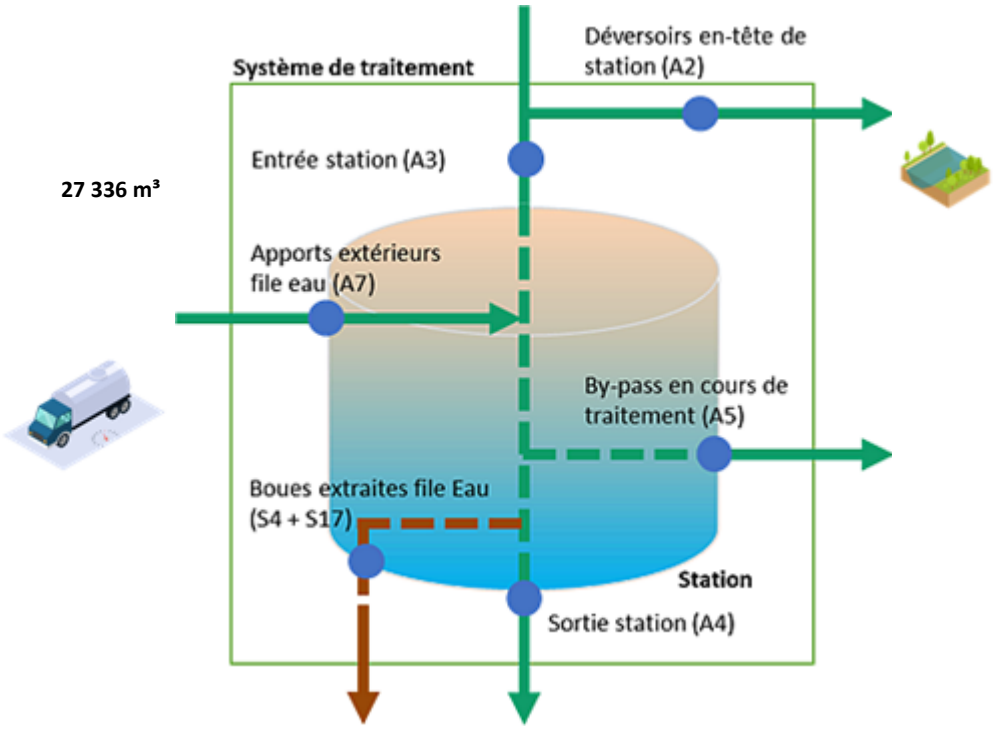

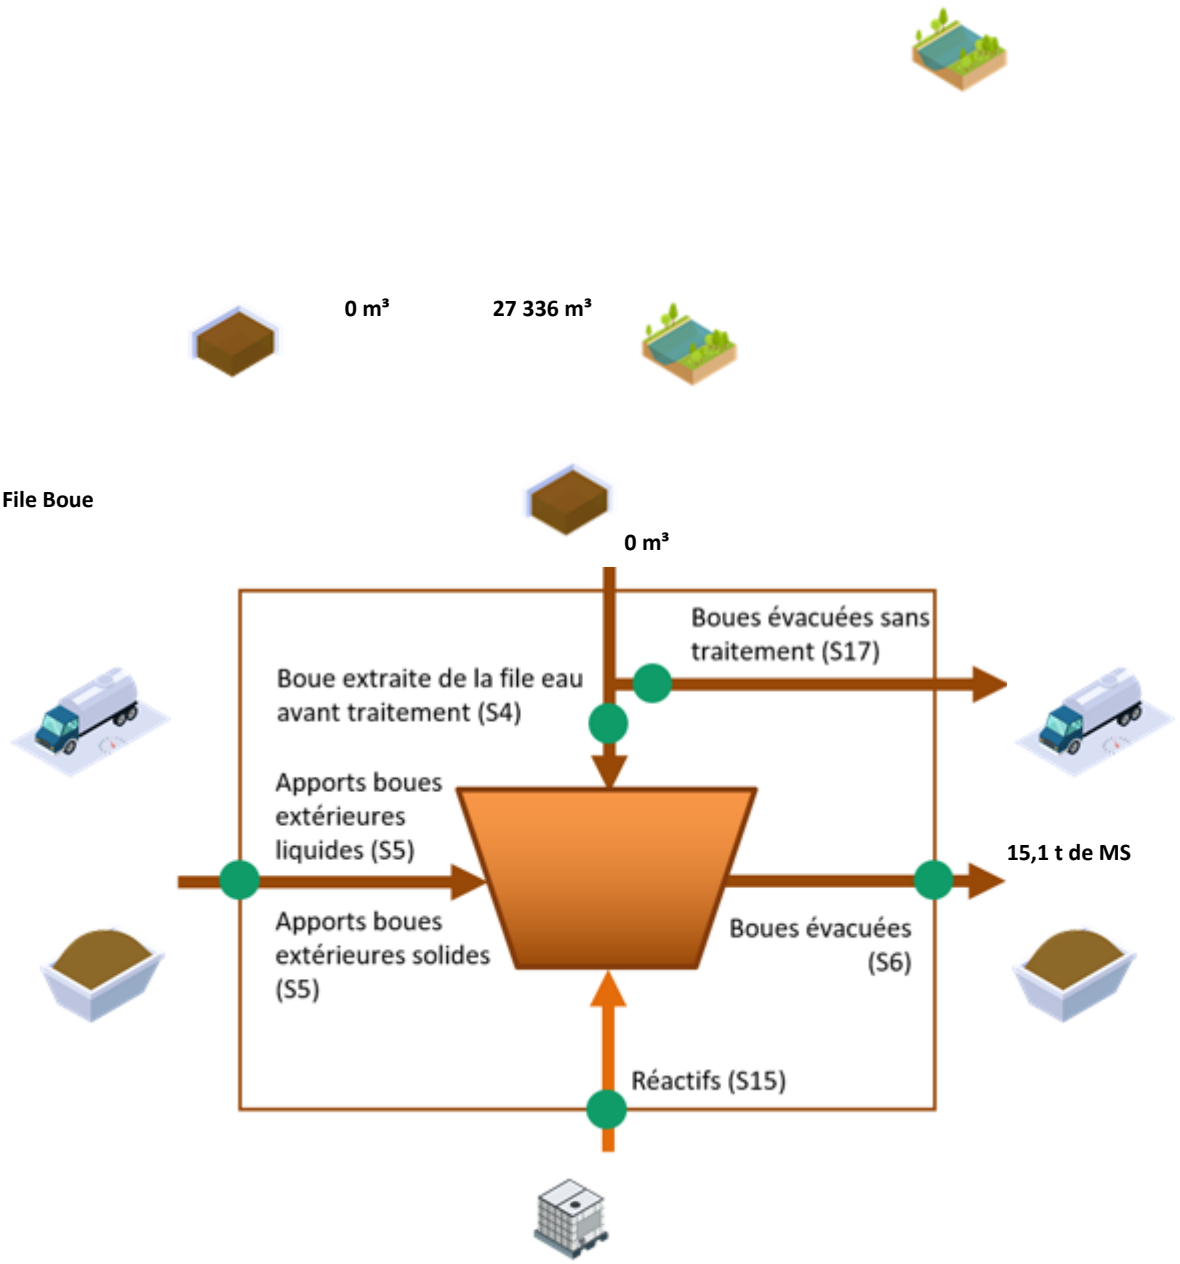
0 m³
27 336 m³
File Boue
0 m³
Boues évacuées sans traitement (S17)
Boue extraite de la file eau avant traitement (S4)
Apports boues extérieures liquides (S5)
15,1 t de MS
Apports boues extérieures solides (S5)
Boues évacuées (S6)
Réactifs (S15)


Fréquences d'analyses


Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre.


	2025
DCO	3
DBO5	3
MES	3
NTK	3
NGL	3
Ptot	3


Concentrations en sortie et rendements épuratoires


Les graphiques suivants présentent la qualité d'eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les rendements épuratoires obtenus :

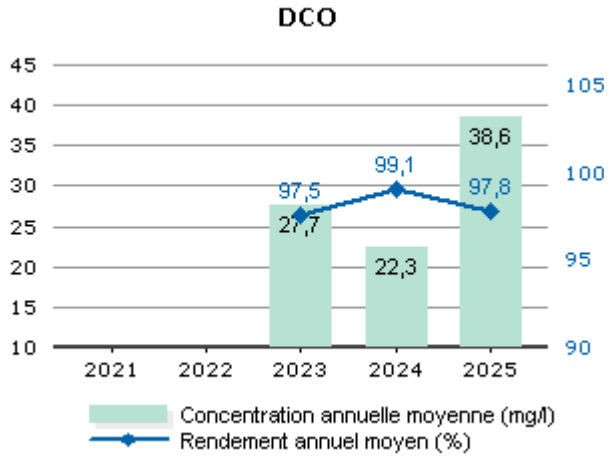

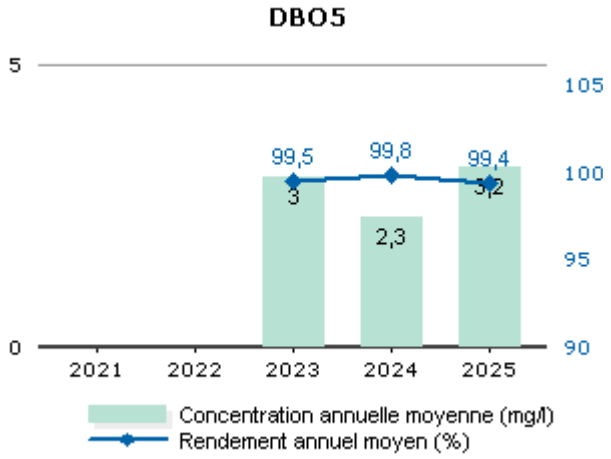

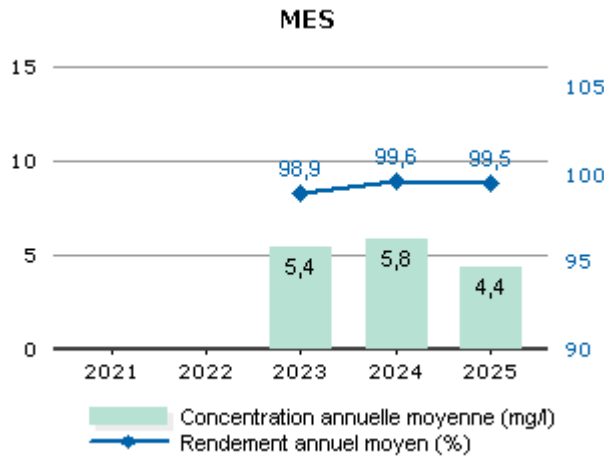

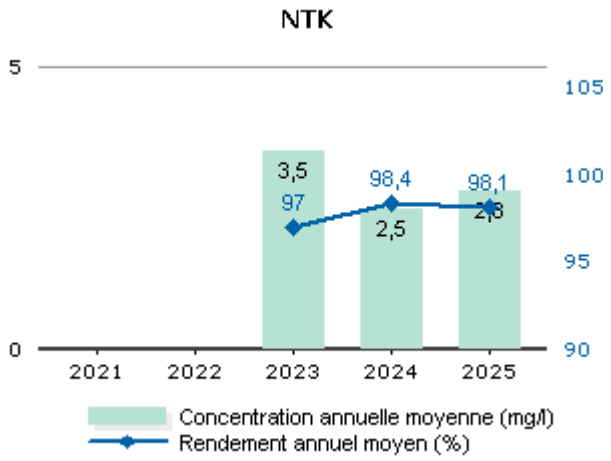

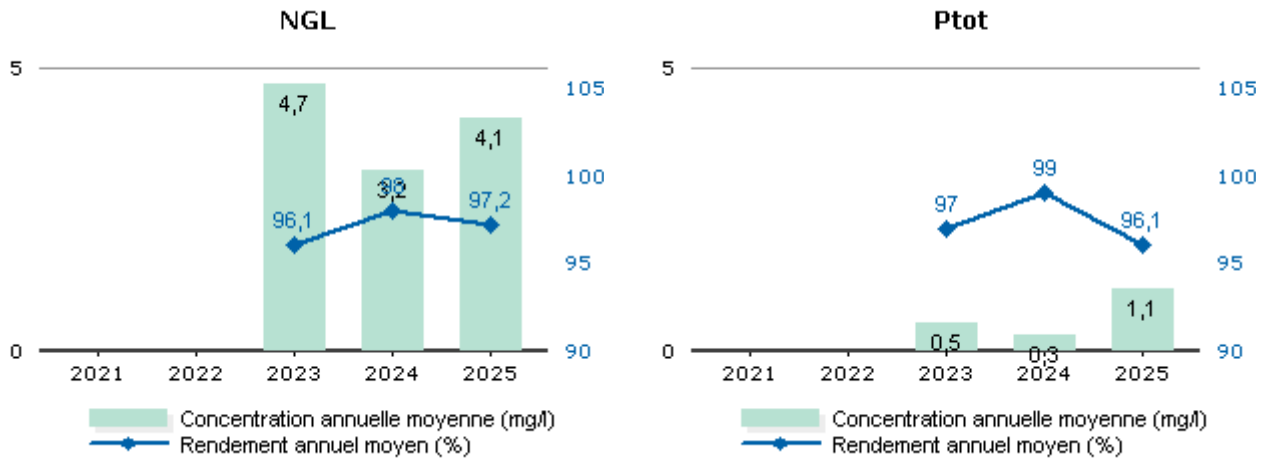

Les valeurs moyennes observées en sortie du système de traitement (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la prescription qui est à présent à calculer en considérant les débits à hauteur du débit de référence. L'évaluation du taux de respect fait l'objet de l'indicateur de conformité locale présenté dans la suite de la présente section.

Conformité de la performance

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations, …). La conformité locale est définie au regard des prescriptions de l'arrêté préfectoral.

	2021	2022	2023	2024	2025
Conformité à l'arrêté préfectoral			100,00	100,00	100,00

A partir de 2019, cette conformité est évaluée suivant les nouvelles règles de calcul que celles des outils du Ministère (prise en compte des débits à hauteur du débit de référence en entrée et sortie, prise en compte du débit entrant en station pour définir si la station est en ou hors condition normale de fonctionnement, prise en compte du débit de référence mentionné dans l'acte administratif (arrêté préfectoral local). Cette évaluation reste fournie à titre indicatif. Seule l'évaluation transmise par le Service de Police de l'Eau en mars a une valeur officielle.

Qualité du traitement des boues

Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration

Cet indicateur permet d'évaluer l'efficacité de dépollution des usines (extraction et concentration de la pollution de l'effluent traité). Il s'exprime en tonnage de matières sèches.

	2021	2022	2023	2024	2025
Boues évacuées (Tonnes de MS) (S6)				10,0	15,1

Boues évacuées par destination et proportion évacuée selon une filière conforme

Ce tableau présente la proportion de boues évacuées selon une filière conforme.

	2021	2022	2023	2024	2025
Taux de boues évacuées selon une filière conforme (%)				100,0	100,0

Destination des boues évacuées

Ce tableau présente le détail pour l'année des destinations des boues évacuées.

	Produit brut (t)	Siccité (%)	Matières sèches (t)	Destination conforme (%) *
Valorisation agricole	666	2,27	15,1	100,00
Total	**666**	**2,27**	**15,1**	**100,00**

* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches.

Sous-produits évacués par destination

Ce tableau présente les sous-produits générés et leur devenir.

	2021	2022	2023	2024	2025
Centre de stockage de déchets (t) Refus			2,5		
Total (t)			2,5		

STEP BEUTAL de la Guinguette

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le tableau qui suit. Il s'agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté préfectoral d'autorisation, ou à défaut manuel d'autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de conformité


	2025
Capacité nominale (kg/j)	2

Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*)


	DCO	DBO5	MES	NTK	NGL	NH4	Ptot
Concentration maximale à respecter (mg/L) (*)							
Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L)							
Charge maximale à respecter (kg/j)							
Rendement minimum moyen (%)							

* : En général, pour les paramètres NTK, NGL et Ptot, les conformités se jugent en moyennes annuelles, et pour les autres paramètres en moyennes journalières par bilan, cela sous réserve d'absence d'indications complémentaires d'arrêtés préfectoraux locaux.

File Eau

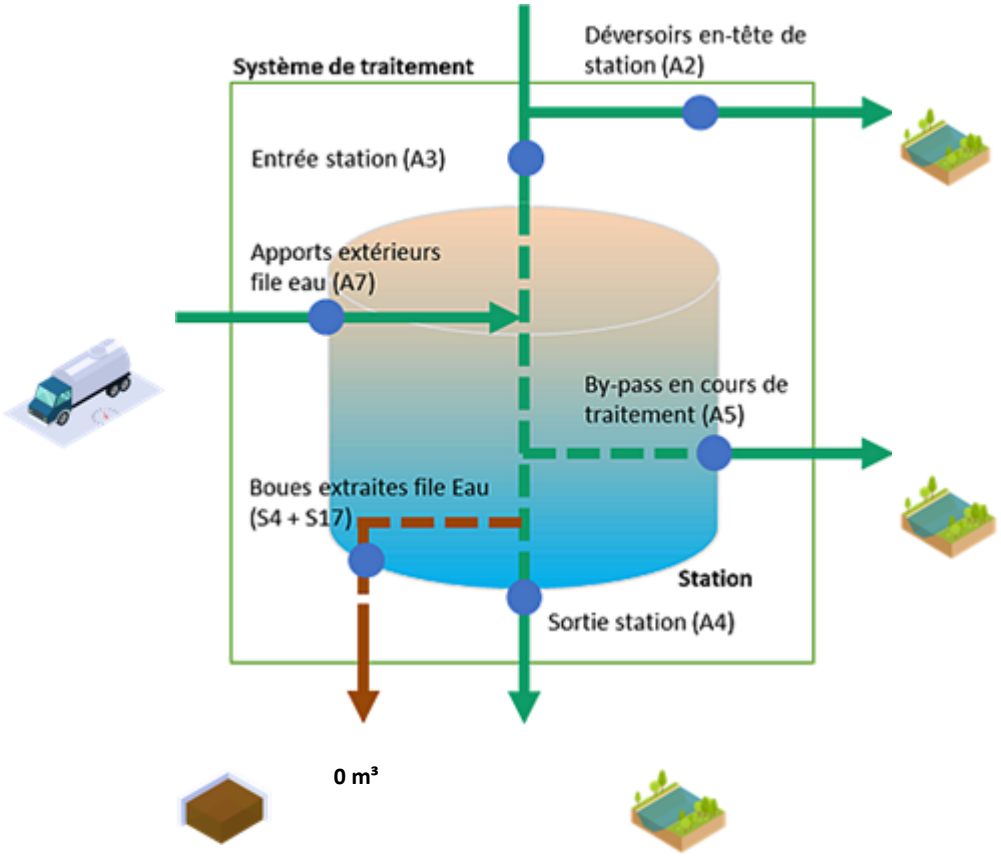

File Boue

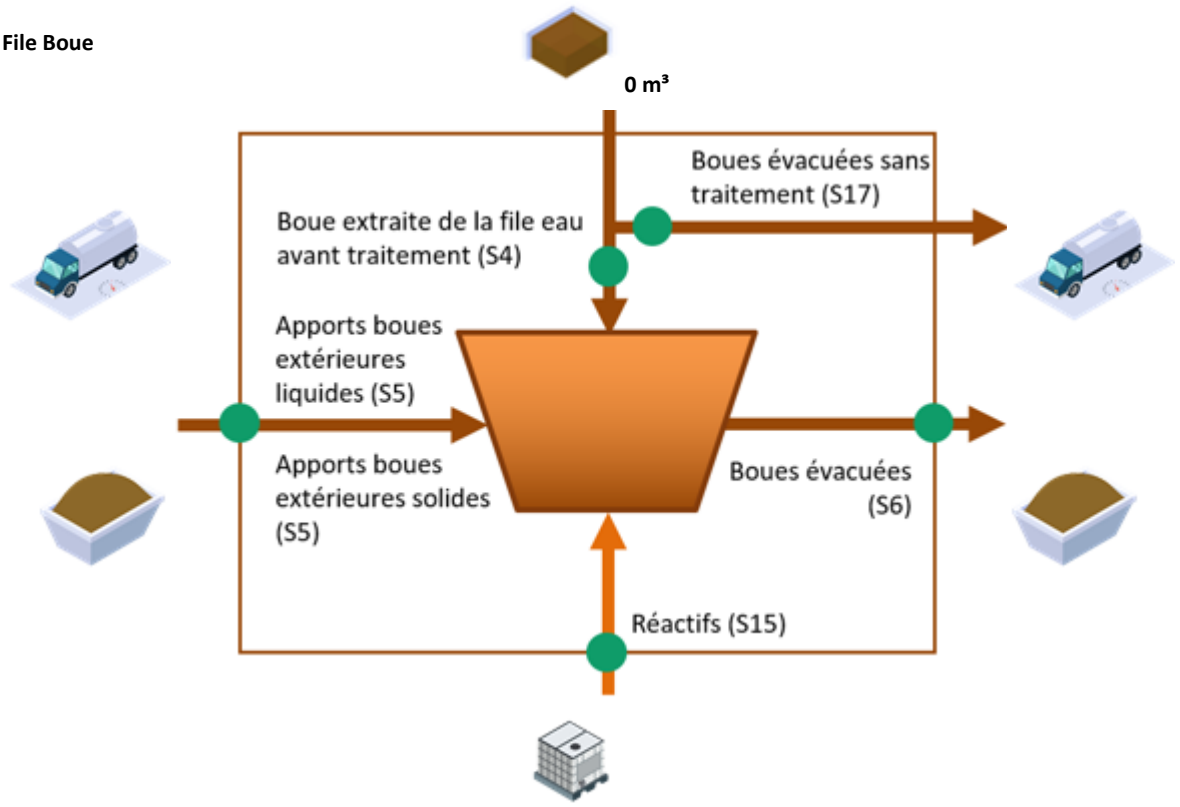

Concentrations en sortie et rendements épuratoires

Conformité de la performance

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations, …). La conformité locale est définie au regard des prescriptions de l'arrêté préfectoral.

A partir de 2019, cette conformité est évaluée suivant les nouvelles règles de calcul que celles des outils du Ministère (prise en compte des débits à hauteur du débit de référence en entrée et sortie, prise en compte du débit entrant en station pour définir si la station est en ou hors condition normale de fonctionnement, prise en compte du débit de référence mentionné dans l'acte administratif (arrêté préfectoral local). Cette évaluation reste fournie à titre indicatif. Seule l'évaluation transmise par le Service de Police de l'Eau en mars a une valeur officielle.

Qualité du traitement des boues

STEP BLAMONT

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le tableau qui suit. Il s'agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté préfectoral d'autorisation, ou à défaut manuel d'autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de conformité


	2025
Débit de référence (m3/j)	364
Capacité nominale (kg/j)	70


Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*)

	DCO	DBO5	MES	NTK	NGL	NH4	Ptot
Concentration maximale à respecter (mg/L) (*)							
moyenne journalière par bilan		35,00					
Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L)							
moyenne journalière par bilan		70,00					
Charge maximale à respecter (kg/j)							
Rendement minimum moyen (%)							
moyen journalier par bilan	60,00	60,00					

* : En général, pour les paramètres NTK, NGL et Ptot, les conformités se jugent en moyennes annuelles, et pour les autres paramètres en moyennes journalières par bilan, cela sous réserve d'absence d'indications complémentaires d'arrêtés préfectoraux locaux.

File Eau

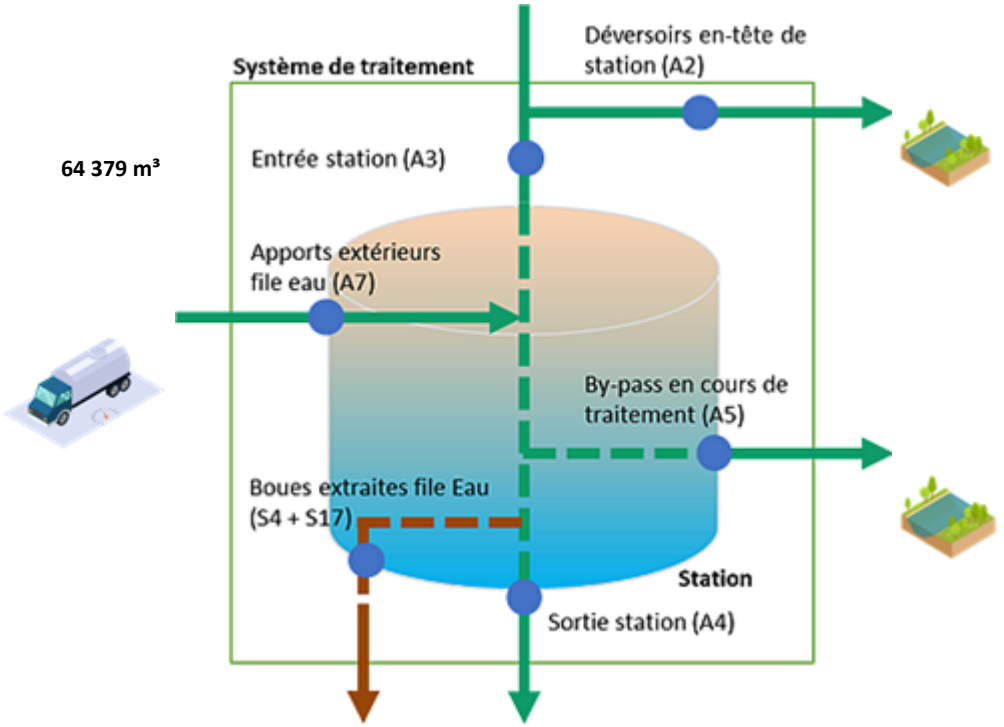

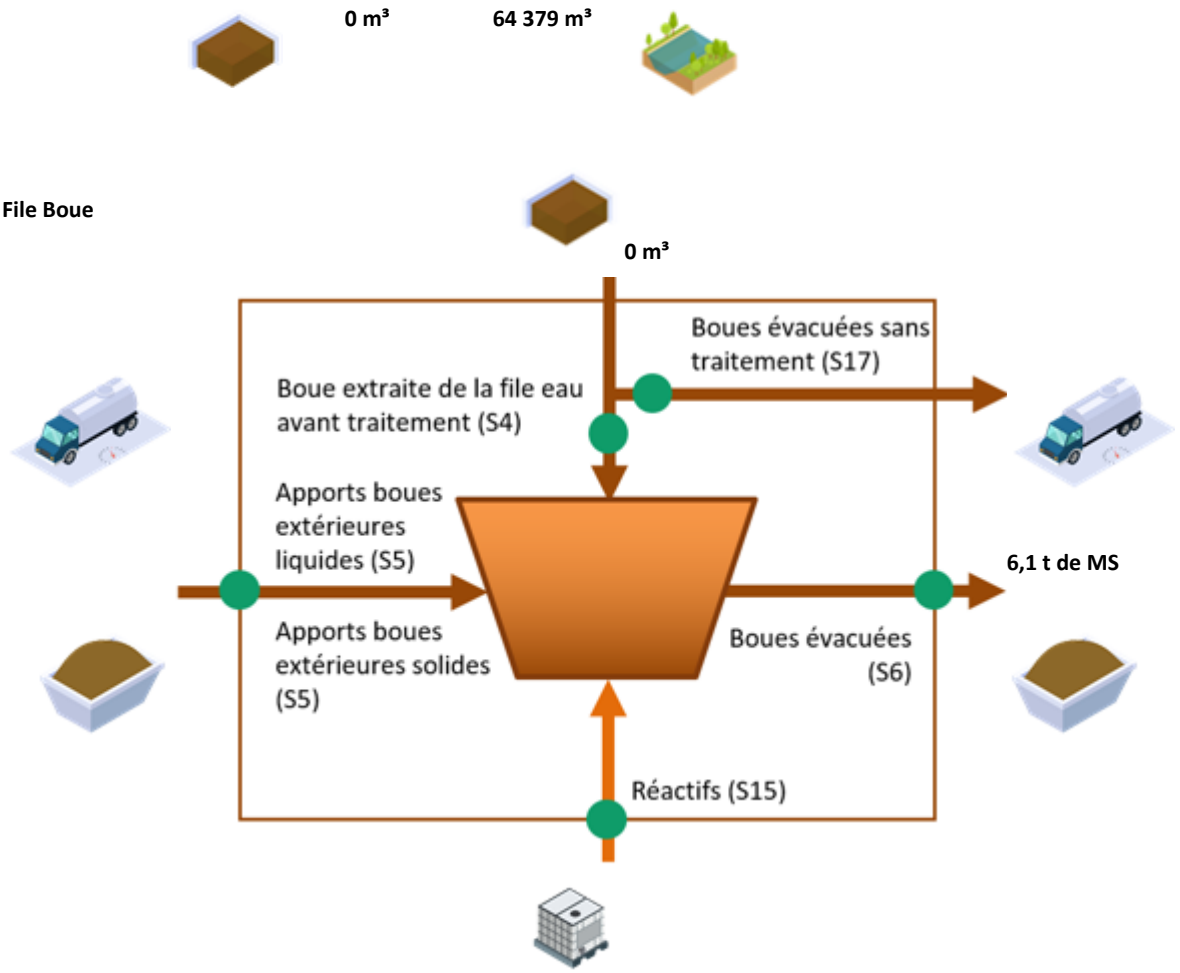
0 m³
64 379 m³
File Boue
0 m³
Boues évacuées sans traitement (S17)
Boue extraite de la file eau avant traitement (S4)
Apports boues extérieures liquides (S5)
6,1 t de MS
Apports boues extérieures solides (S5)
Boues évacuées (S6)
Réactifs (S15)


Fréquences d'analyses


Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre.


	2025
DCO	5
DBO5	5
MES	5
NTK	5
NGL	5
Ptot	5


Concentrations en sortie et rendements épuratoires


Les graphiques suivants présentent la qualité d'eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les rendements épuratoires obtenus :

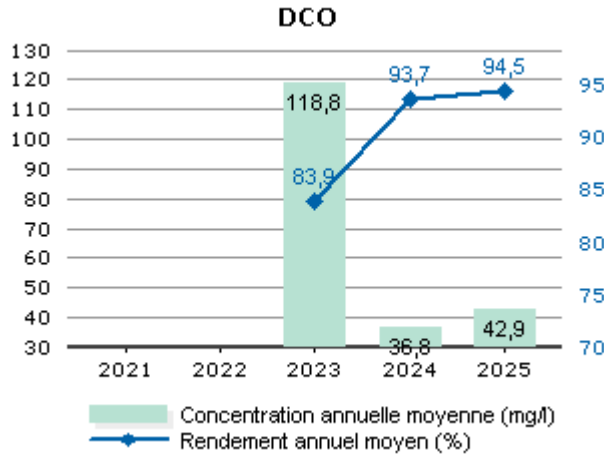

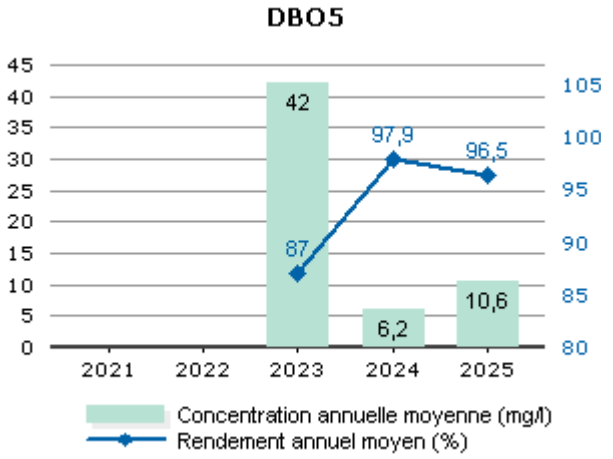

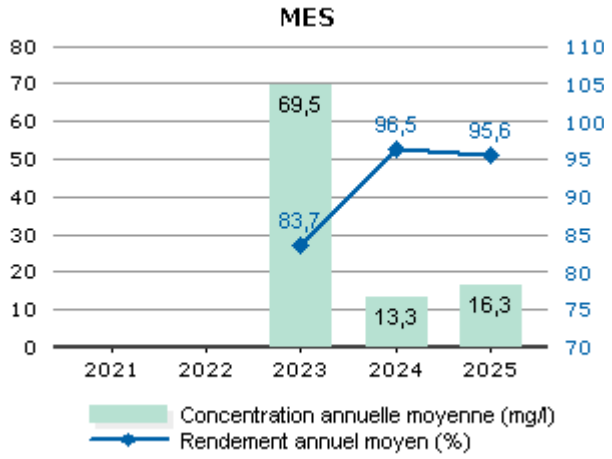

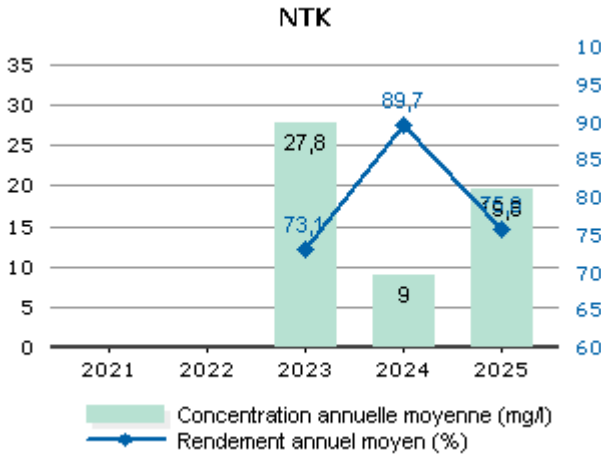

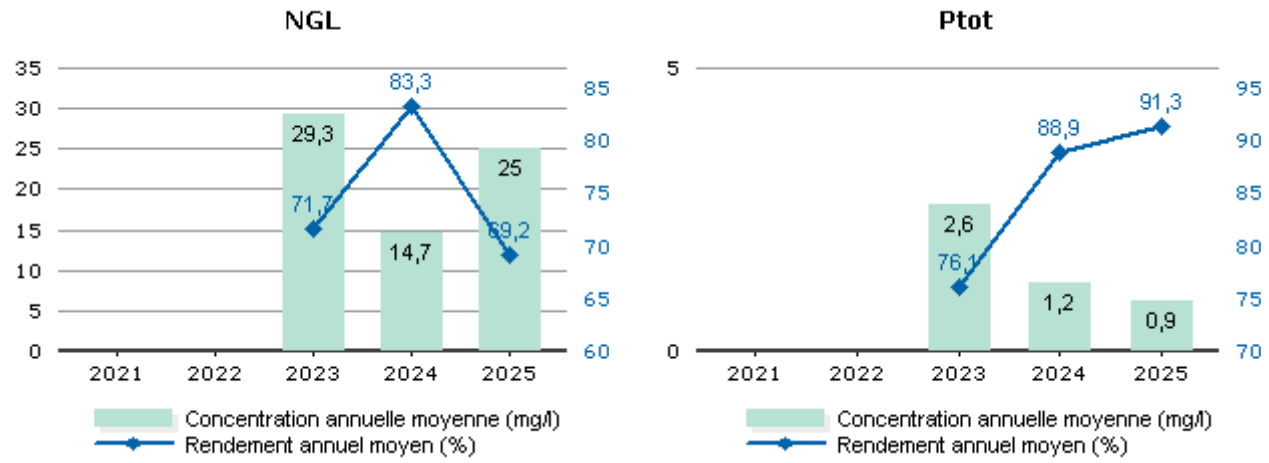

Les valeurs moyennes observées en sortie du système de traitement (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la prescription qui est à présent à calculer en considérant les débits à hauteur du débit de référence. L'évaluation du taux de respect fait l'objet de l'indicateur de conformité locale présenté dans la suite de la présente section.

Conformité de la performance

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations, …). La conformité locale est définie au regard des prescriptions de l'arrêté préfectoral.

	2021	2022	2023	2024	2025
Conformité à l'arrêté préfectoral			0,00	100,00	100,00

A partir de 2019, cette conformité est évaluée suivant les nouvelles règles de calcul que celles des outils du Ministère (prise en compte des débits à hauteur du débit de référence en entrée et sortie, prise en compte du débit entrant en station pour définir si la station est en ou hors condition normale de fonctionnement, prise en compte du débit de référence mentionné dans l'acte administratif (arrêté préfectoral local). Cette évaluation reste fournie à titre indicatif. Seule l'évaluation transmise par le Service de Police de l'Eau en mars a une valeur officielle.

Qualité du traitement des boues

Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration

Cet indicateur permet d'évaluer l'efficacité de dépollution des usines (extraction et concentration de la pollution de l'effluent traité). Il s'exprime en tonnage de matières sèches.

	2021	2022	2023	2024	2025
Boues évacuées (Tonnes de MS) (S6)			3,2	6,3	6,1

Boues évacuées par destination et proportion évacuée selon une filière conforme

Ce tableau présente la proportion de boues évacuées selon une filière conforme.

	2021	2022	2023	2024	2025
Taux de boues évacuées selon une filière conforme (%)			100,0	100,0	100,0

Destination des boues évacuées

Ce tableau présente le détail pour l'année des destinations des boues évacuées.

	Produit brut (t)	Siccité (%)	Matières sèches (t)	Destination conforme (%) *
Station d'épuration	429,4	1,42	6,1	100,00
Total	**429,4**	**1,42**	**6,1**	**100,00**

* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches.

Sous-produits évacués par destination

Ce tableau présente les sous-produits générés et leur devenir.

	2021	2022	2023	2024	2025
Centre de stockage de déchets (t) Refus			0,6		
Incinération (t) Refus				2,7	0,9
Total (t)			0,6	2,7	0,9

STEP COLOMBIER FONTAINE

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le tableau qui suit. Il s'agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté préfectoral d'autorisation, ou à défaut manuel d'autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de conformité


	2025
Débit de référence (m3/j)	1 724
Capacité nominale (kg/j)	240


Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*)

	DCO	DBO5	MES	NTK	NGL	NH4	Ptot
Concentration maximale à respecter (mg/L) (*)							
moyenne journalière par bilan	90,00	25,00	30,00	15,00			2,00
Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L)							
moyenne journalière par bilan	250,00	50,00	85,00				
Charge maximale à respecter (kg/j)							
Rendement minimum moyen (%)							
moyen journalier par bilan	80,00	80,00	90,00	70,00			80,00

* : En général, pour les paramètres NTK, NGL et Ptot, les conformités se jugent en moyennes annuelles, et pour les autres paramètres en moyennes journalières par bilan, cela sous réserve d'absence d'indications complémentaires d'arrêtés préfectoraux locaux.

File Eau

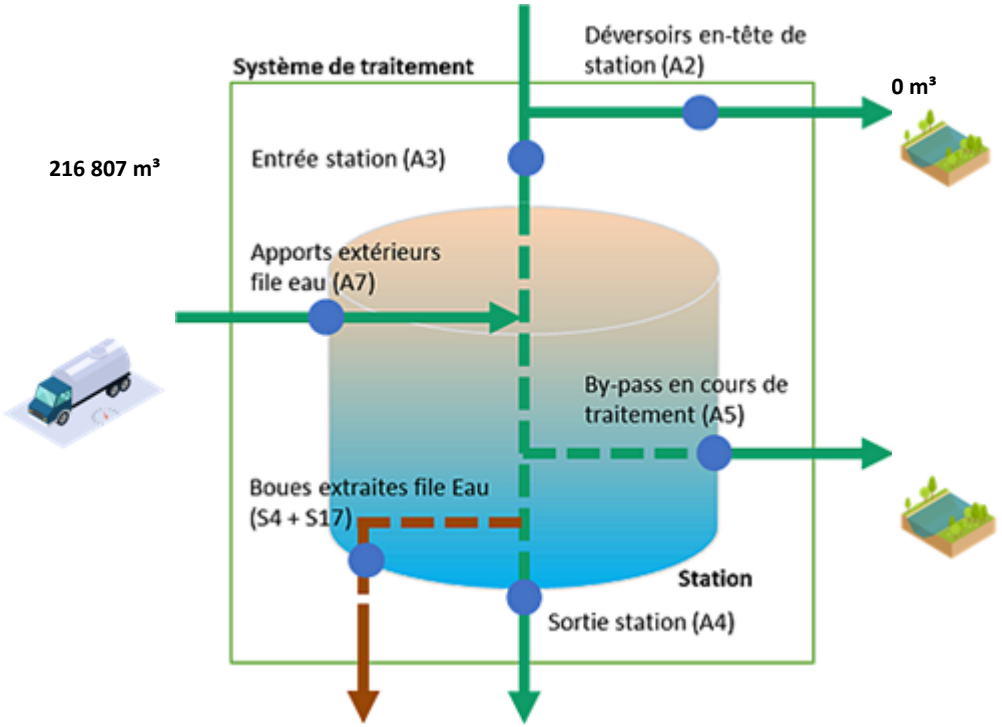

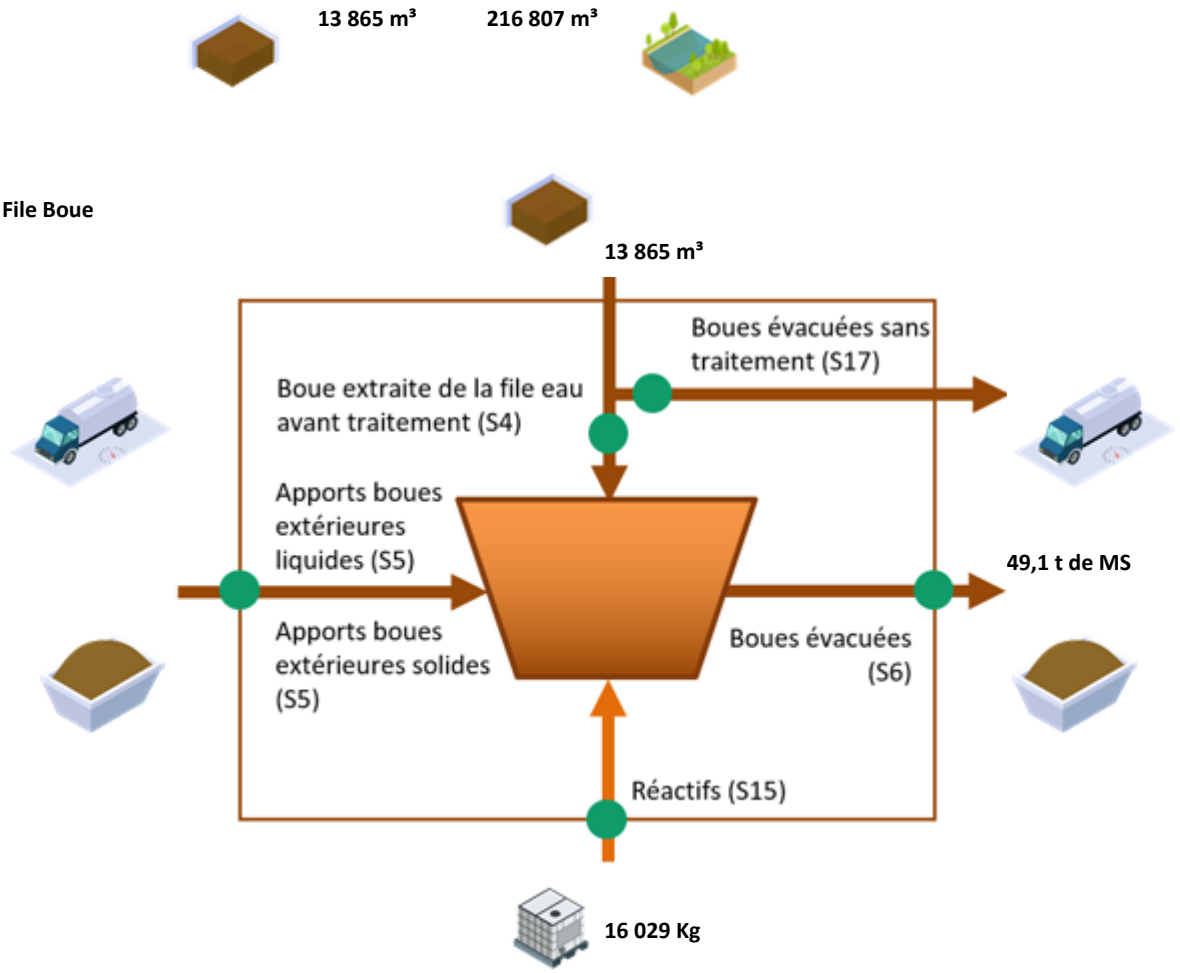
13 865 m³
216 807 m³
File Boue
13 865 m³
Boues évacuées sans traitement (S17)
Boue extraite de la file eau avant traitement (S4)
Apports boues extérieures liquides (S5)
49,1 t de MS
Apports boues extérieures solides (S5)
Boues évacuées (S6)
Réactifs (S15)
16 029 Kg


Fréquences d'analyses


Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre.


	2025
DCO	12
DBO5	12
MES	12
NTK	12
NGL	12
Ptot	12


Concentrations en sortie et rendements épuratoires

Les graphiques suivants présentent la qualité d'eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les rendements épuratoires obtenus :

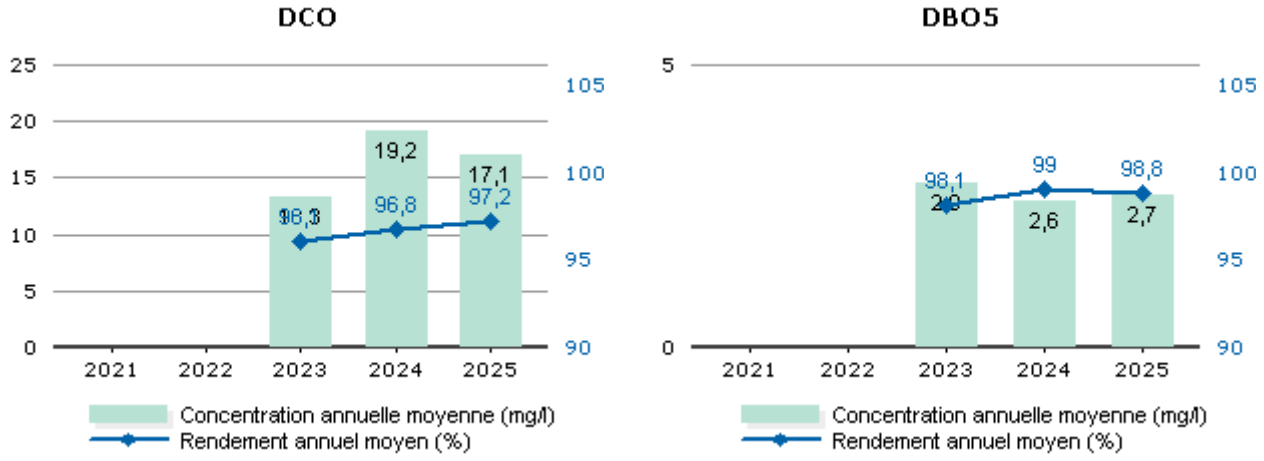

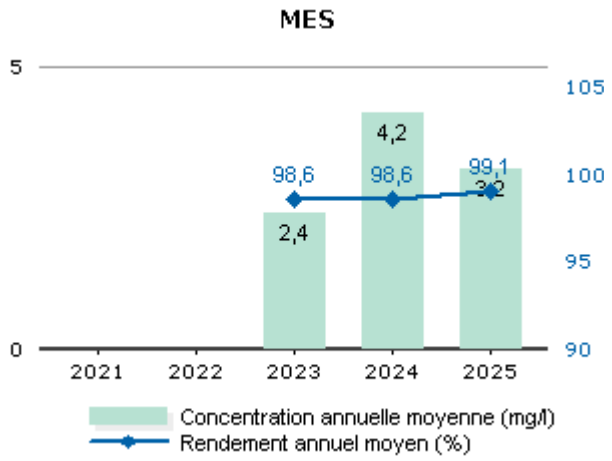

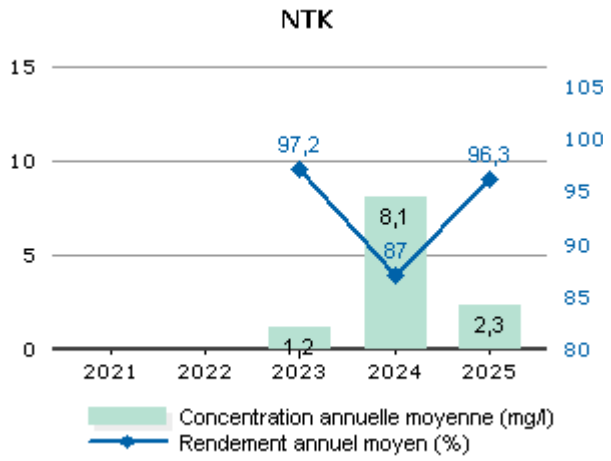

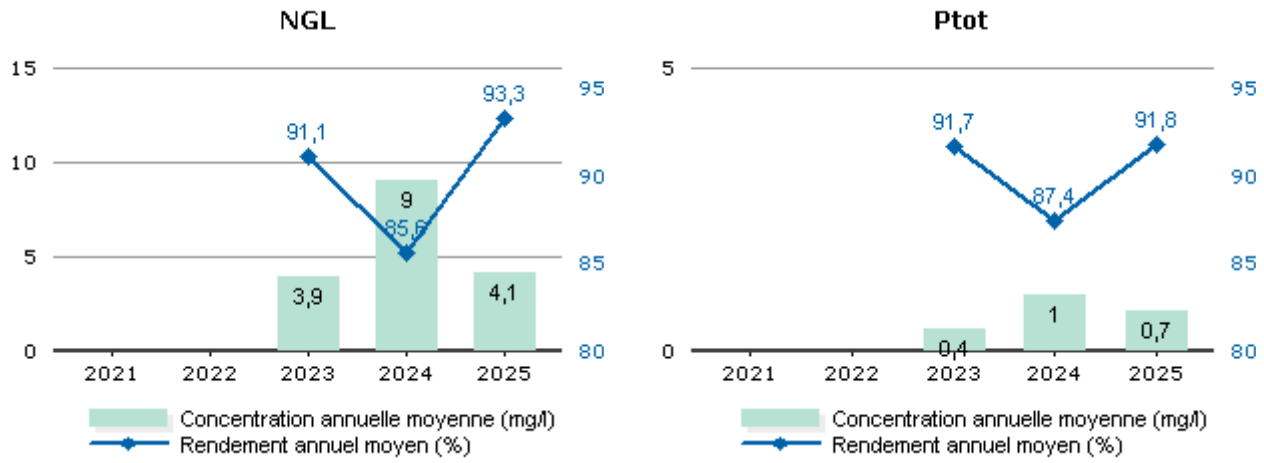

Les valeurs moyennes observées en sortie du système de traitement (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la prescription qui est à présent à calculer en considérant les débits à hauteur du débit de référence. L'évaluation du taux de respect fait l'objet de l'indicateur de conformité locale présenté dans la suite de la présente section.

Conformité de la performance

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations, …). La conformité locale est définie au regard des prescriptions de l'arrêté préfectoral.

	2021	2022	2023	2024	2025
Conformité à l'arrêté préfectoral			100,00	100,00	100,00

A partir de 2019, cette conformité est évaluée suivant les nouvelles règles de calcul que celles des outils du Ministère (prise en compte des débits à hauteur du débit de référence en entrée et sortie, prise en compte du débit entrant en station pour définir si la station est en ou hors condition normale de fonctionnement, prise en compte du débit de référence mentionné dans l'acte administratif (arrêté préfectoral local). Cette évaluation reste fournie à titre indicatif. Seule l'évaluation transmise par le Service de Police de l'Eau en mars a une valeur officielle.

Qualité du traitement des boues

Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration

Cet indicateur permet d'évaluer l'efficacité de dépollution des usines (extraction et concentration de la pollution de l'effluent traité). Il s'exprime en tonnage de matières sèches.

	2021	2022	2023	2024	2025
Boues évacuées (Tonnes de MS) (S6)			40,7	40,9	49,1

Boues évacuées par destination et proportion évacuée selon une filière conforme

Ce tableau présente la proportion de boues évacuées selon une filière conforme.

	2021	2022	2023	2024	2025
Taux de boues évacuées selon une filière conforme (%)			100,0	100,0	100,0

Destination des boues évacuées

Ce tableau présente le détail pour l'année des destinations des boues évacuées.

	Produit brut (t)	Siccité (%)	Matières sèches (t)	Destination conforme (%) *
Valorisation agricole	215	22,84	49,1	100,00
Total	**215**	**22,84**	**49,1**	**100,00**

* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches.

Sous-produits évacués par destination

Ce tableau présente les sous-produits générés et leur devenir.

	2021	2022	2023	2024	2025
Centre de stockage de déchets (t) Refus			15,5		
Incinération (t) Refus			15,5	30,3	23,6
Total (t)			31,0	30,3	23,6

STEP DAMBELIN

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le tableau qui suit. Il s'agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté préfectoral d'autorisation, ou à défaut manuel d'autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de conformité


	2025
Débit de référence (m3/j)	494
Capacité nominale (kg/j)	71


Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*)

	DCO	DBO5	MES	NTK	NGL	NH4	Ptot
Concentration maximale à respecter (mg/L) (*)							
moyenne journalière par bilan		35,00					
Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L)							
moyenne journalière par bilan		70,00					
Charge maximale à respecter (kg/j)							
Rendement minimum moyen (%)							
moyen journalier par bilan	60,00	60,00					

* : En général, pour les paramètres NTK, NGL et Ptot, les conformités se jugent en moyennes annuelles, et pour les autres paramètres en moyennes journalières par bilan, cela sous réserve d'absence d'indications complémentaires d'arrêtés préfectoraux locaux.

File Eau

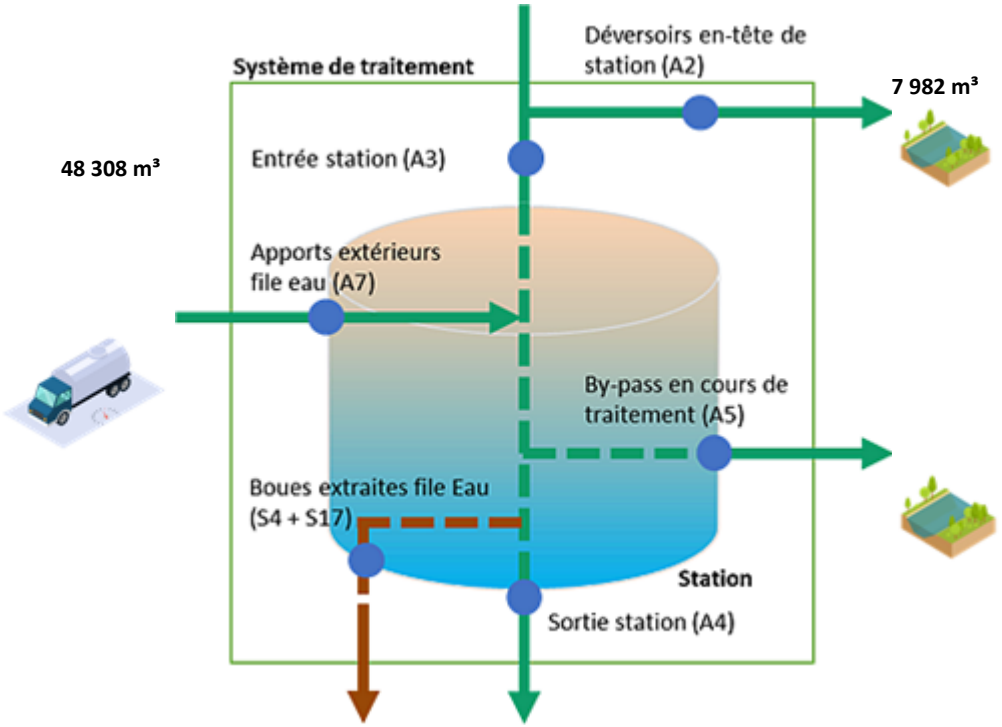

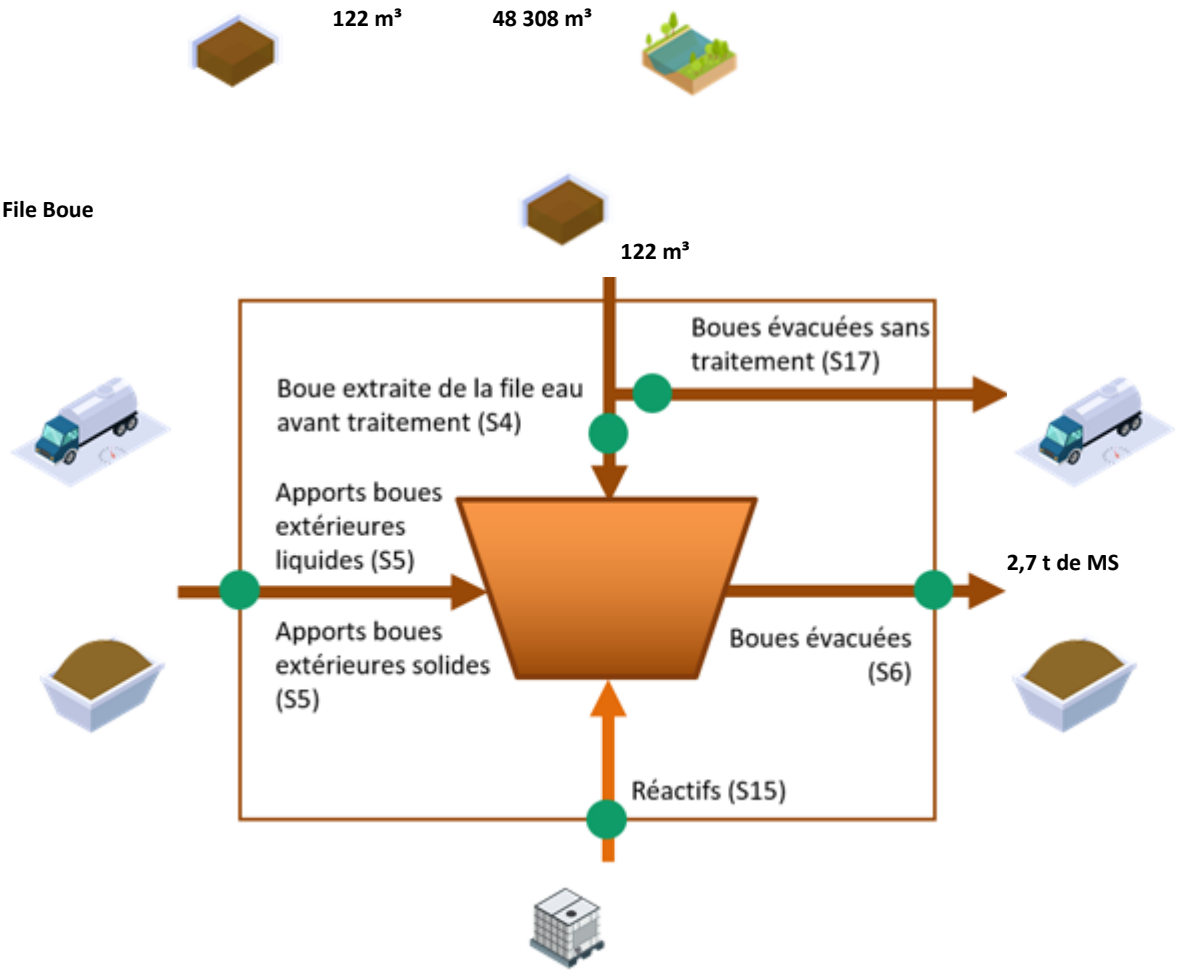
122 m³
48 308 m³
File Boue
122 m³
Boues évacuées sans traitement (S17)
Boue extraite de la file eau avant traitement (S4)
Apports boues extérieures liquides (S5)
2,7 t de MS
Apports boues extérieures solides (S5)
Boues évacuées (S6)
Réactifs (S15)


Fréquences d'analyses


Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre.


	2025
DCO	6
DBO5	6
MES	6
NTK	6
NGL	6
Ptot	6


Concentrations en sortie et rendements épuratoires


Les graphiques suivants présentent la qualité d'eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les rendements épuratoires obtenus :

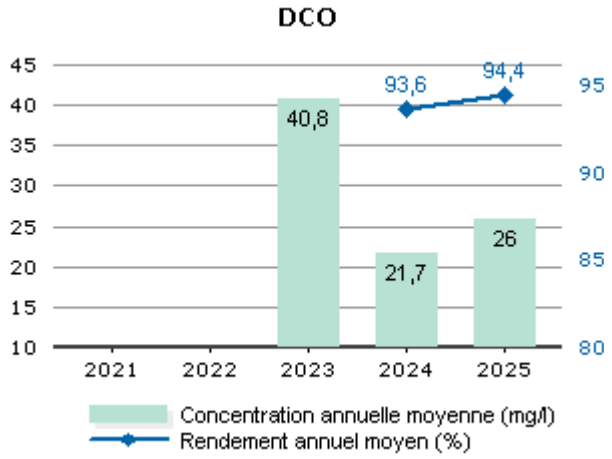

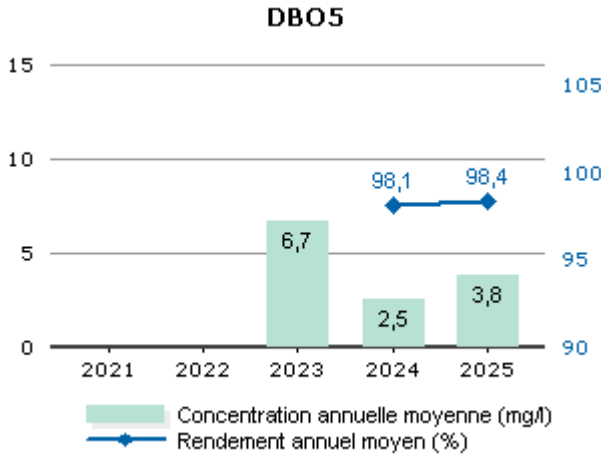

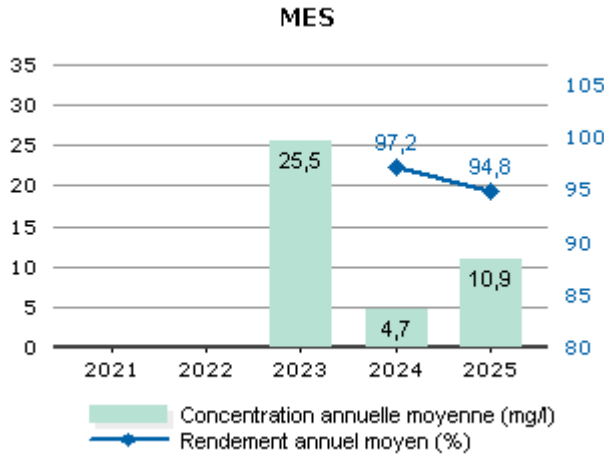

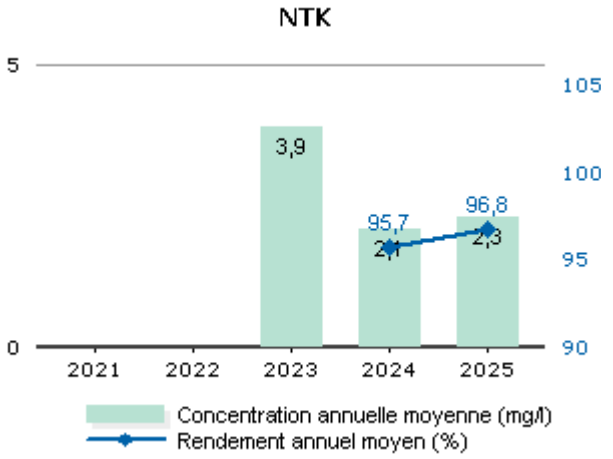

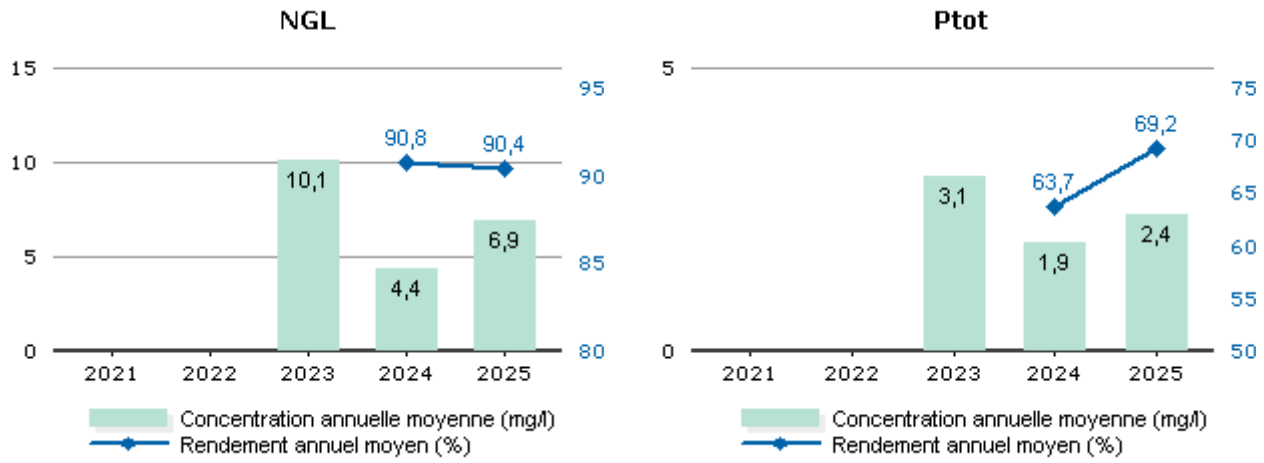

Les valeurs moyennes observées en sortie du système de traitement (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la prescription qui est à présent à calculer en considérant les débits à hauteur du débit de référence. L'évaluation du taux de respect fait l'objet de l'indicateur de conformité locale présenté dans la suite de la présente section.

Conformité de la performance

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations, …). La conformité locale est définie au regard des prescriptions de l'arrêté préfectoral.

	2021	2022	2023	2024	2025
Conformité à l'arrêté préfectoral			100,00	100,00	100,00

A partir de 2019, cette conformité est évaluée suivant les nouvelles règles de calcul que celles des outils du Ministère (prise en compte des débits à hauteur du débit de référence en entrée et sortie, prise en compte du débit entrant en station pour définir si la station est en ou hors condition normale de fonctionnement, prise en compte du débit de référence mentionné dans l'acte administratif (arrêté préfectoral local). Cette évaluation reste fournie à titre indicatif. Seule l'évaluation transmise par le Service de Police de l'Eau en mars a une valeur officielle.

Qualité du traitement des boues

Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration

Cet indicateur permet d'évaluer l'efficacité de dépollution des usines (extraction et concentration de la pollution de l'effluent traité). Il s'exprime en tonnage de matières sèches.

	2021	2022	2023	2024	2025
Boues évacuées (Tonnes de MS) (S6)				3,1	2,7

Boues évacuées par destination et proportion évacuée selon une filière conforme

Ce tableau présente la proportion de boues évacuées selon une filière conforme.

	2021	2022	2023	2024	2025
Taux de boues évacuées selon une filière conforme (%)				100,0	100,0

Destination des boues évacuées

Ce tableau présente le détail pour l'année des destinations des boues évacuées.

	Produit brut (t)	Siccité (%)	Matières sèches (t)	Destination conforme (%) *
Station d'épuration	122,2	2,21	2,7	100,00
Total	**122,2**	**2,21**	**2,7**	**100,00**

* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches.

Sous-produits évacués par destination

Ce tableau présente les sous-produits générés et leur devenir.

	2021	2022	2023	2024	2025
Centre de stockage de déchets (t) Refus			0,1		
Incinération (t) Refus				0,5	0,8
Total (t)			0,1	0,5	0,8

STEP DUNG

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le tableau qui suit. Il s'agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté préfectoral d'autorisation, ou à défaut manuel d'autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de conformité


	2025
Débit de référence (m3/j)	2 232
Capacité nominale (kg/j)	142


Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*)

	DCO	DBO5	MES	NTK	NGL	NH4	Ptot
Concentration maximale à respecter (mg/L) (*)							
moyenne journalière par bilan	125,00	25,00	35,00				
Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L)							
moyenne journalière par bilan	250,00	50,00	85,00				
Charge maximale à respecter (kg/j)							
Rendement minimum moyen (%)							
moyen journalier par bilan	75,00	70,00	90,00				

* : En général, pour les paramètres NTK, NGL et Ptot, les conformités se jugent en moyennes annuelles, et pour les autres paramètres en moyennes journalières par bilan, cela sous réserve d'absence d'indications complémentaires d'arrêtés préfectoraux locaux.

File Eau

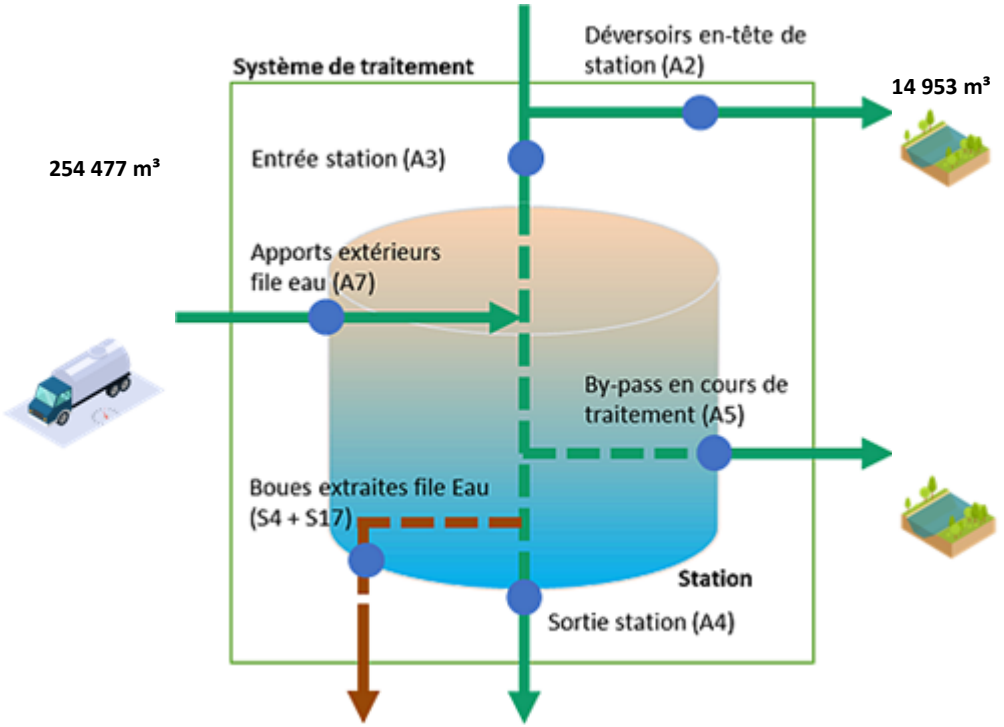

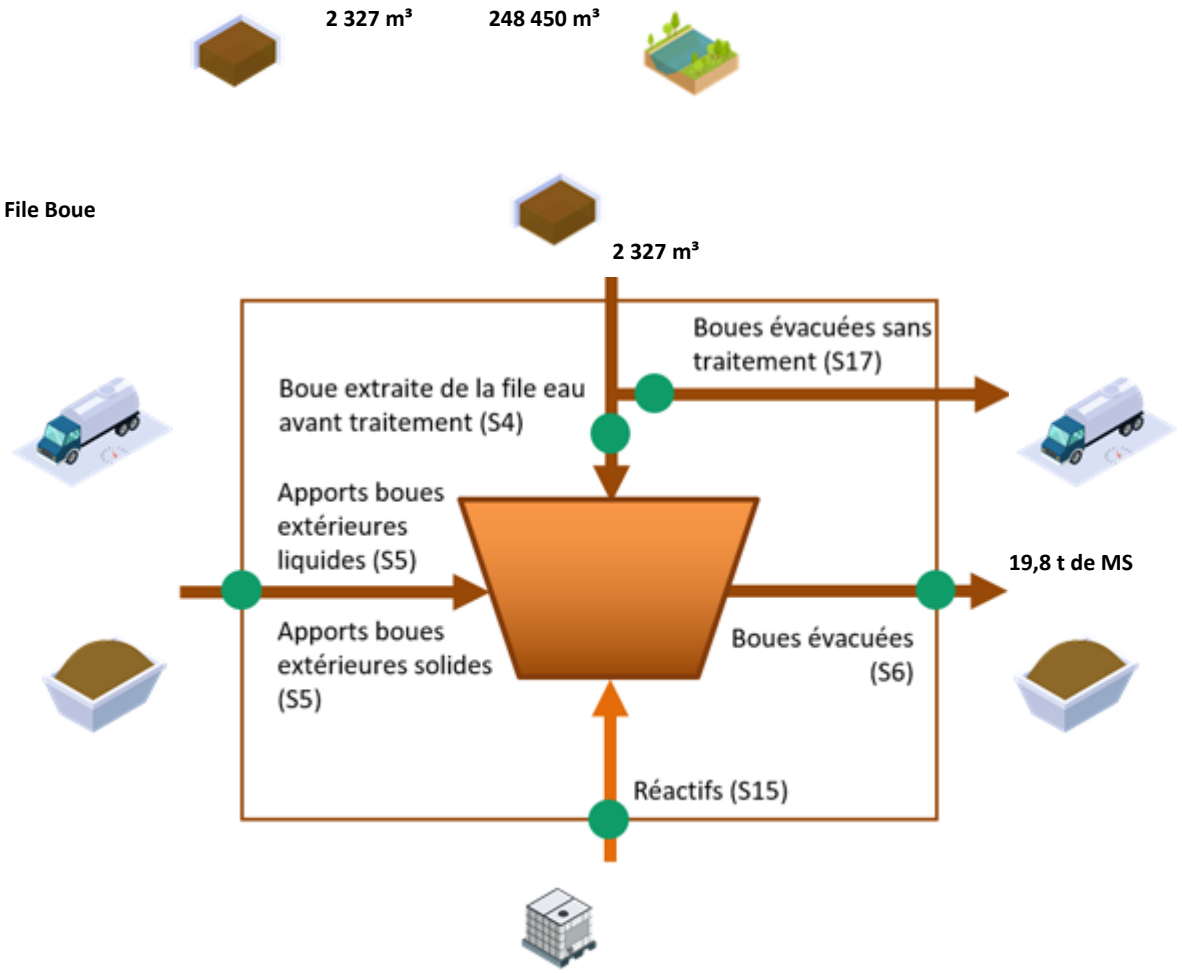
2 327 m³
248 450 m³
File Boue
2 327 m³
Boues évacuées sans traitement (S17)
Boue extraite de la file eau avant traitement (S4)
Apports boues extérieures liquides (S5)
19,8 t de MS
Apports boues extérieures solides (S5)
Boues évacuées (S6)
Réactifs (S15)


Fréquences d'analyses


Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre.


	2025
DCO	12
DBO5	12
MES	12
NTK	12
NGL	12
Ptot	12


Concentrations en sortie et rendements épuratoires


Les graphiques suivants présentent la qualité d'eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les rendements épuratoires obtenus :

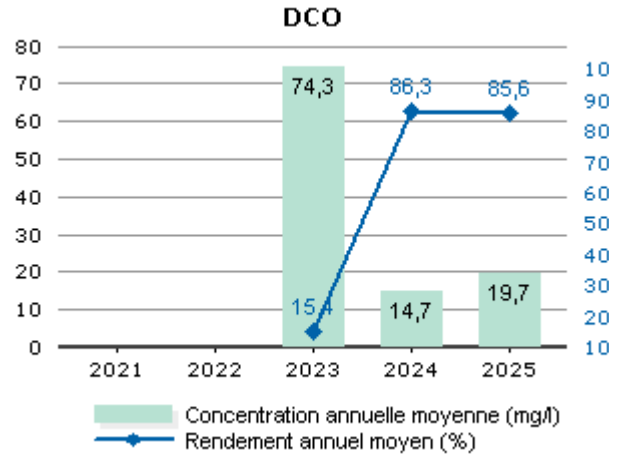


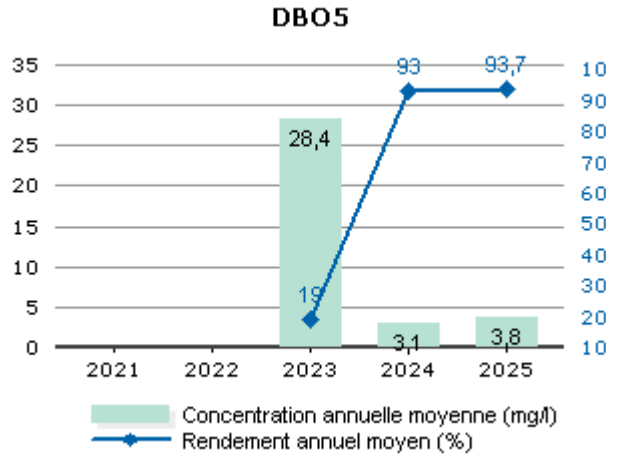

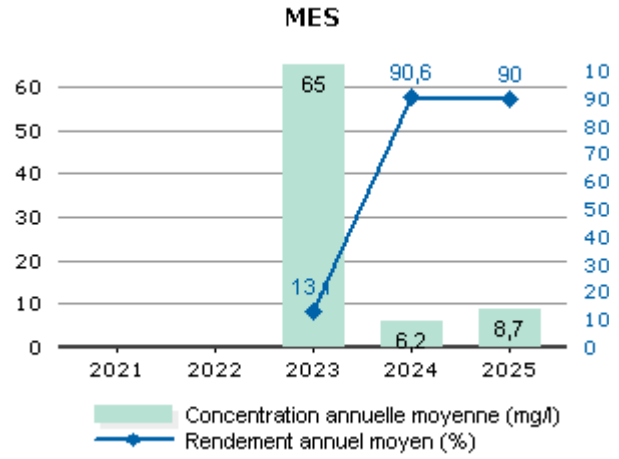

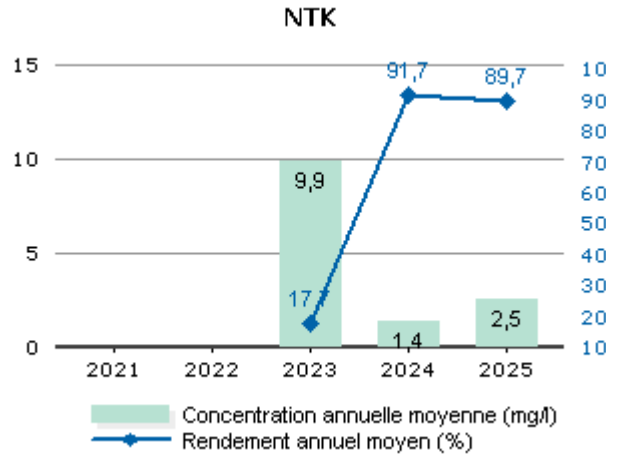

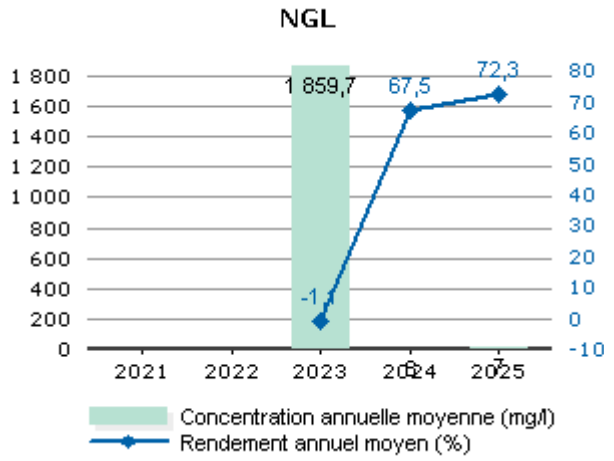

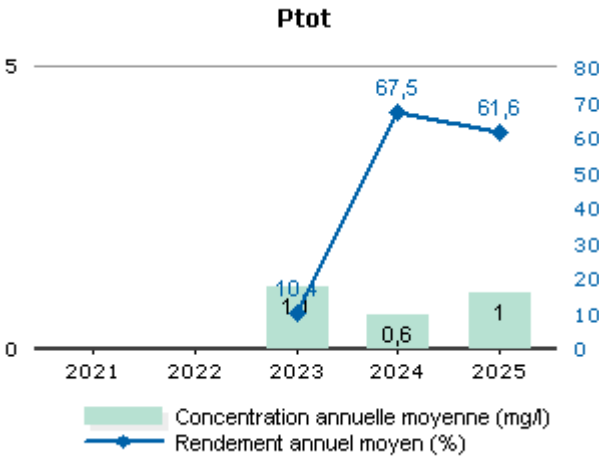

Les valeurs moyennes observées en sortie du système de traitement (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la prescription qui est à présent à calculer en considérant les débits à hauteur du débit de référence. L'évaluation du taux de respect fait l'objet de l'indicateur de conformité locale présenté dans la suite de la présente section.

Conformité de la performance

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations, …). La conformité locale est définie au regard des prescriptions de l'arrêté préfectoral.

	2021	2022	2023	2024	2025
Conformité à l'arrêté préfectoral			100,00	100,00	100,00

A partir de 2019, cette conformité est évaluée suivant les nouvelles règles de calcul que celles des outils du Ministère (prise en compte des débits à hauteur du débit de référence en entrée et sortie, prise en compte du débit entrant en station pour définir si la station est en ou hors condition normale de fonctionnement, prise en compte du débit de référence mentionné dans l'acte administratif (arrêté préfectoral local). Cette évaluation reste fournie à titre indicatif. Seule l'évaluation transmise par le Service de Police de l'Eau en mars a une valeur officielle.

Qualité du traitement des boues

Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration

Cet indicateur permet d'évaluer l'efficacité de dépollution des usines (extraction et concentration de la pollution de l'effluent traité). Il s'exprime en tonnage de matières sèches.

	2021	2022	2023	2024	2025
Boues évacuées (Tonnes de MS) (S6)			9,0	18,4	19,8

Boues évacuées par destination et proportion évacuée selon une filière conforme

Ce tableau présente la proportion de boues évacuées selon une filière conforme.

	2021	2022	2023	2024	2025
Taux de boues évacuées selon une filière conforme (%)			100,0	100,0	100,0

Destination des boues évacuées

Ce tableau présente le détail pour l'année des destinations des boues évacuées.

	Produit brut (t)	Siccité (%)	Matières sèches (t)	Destination conforme (%) *
Station d'épuration	710,3	2,79	19,8	100,00
Total	**710,3**	**2,79**	**19,8**	**100,00**

* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches.

Sous-produits évacués par destination

Ce tableau présente les sous-produits générés et leur devenir.

	2021	2022	2023	2024	2025
Centre de stockage de déchets (t) Refus			0,6		
Total (t)			0,6		
Autre STEP (t) Sables			1,0	1,0	
Total (t)			1,0	1,0	

STEP ECHENANS

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le tableau qui suit. Il s'agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté préfectoral d'autorisation, ou à défaut manuel d'autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de conformité


	2025
Débit de référence (m3/j)	4 790
Capacité nominale (kg/j)	132


Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*)

	DCO	DBO5	MES	NTK	NGL	NH4	Ptot
Concentration maximale à respecter (mg/L) (*)							
moyenne journalière par bilan	125,00	25,00	35,00	10,00	15,00		2,00
Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L)							
moyenne journalière par bilan	250,00	50,00	85,00				
Charge maximale à respecter (kg/j)							
Rendement minimum moyen (%)							
moyen journalier par bilan	83,00	93,00	92,00	88,00	88,00		88,00

* : En général, pour les paramètres NTK, NGL et Ptot, les conformités se jugent en moyennes annuelles, et pour les autres paramètres en moyennes journalières par bilan, cela sous réserve d'absence d'indications complémentaires d'arrêtés préfectoraux locaux.

File Eau

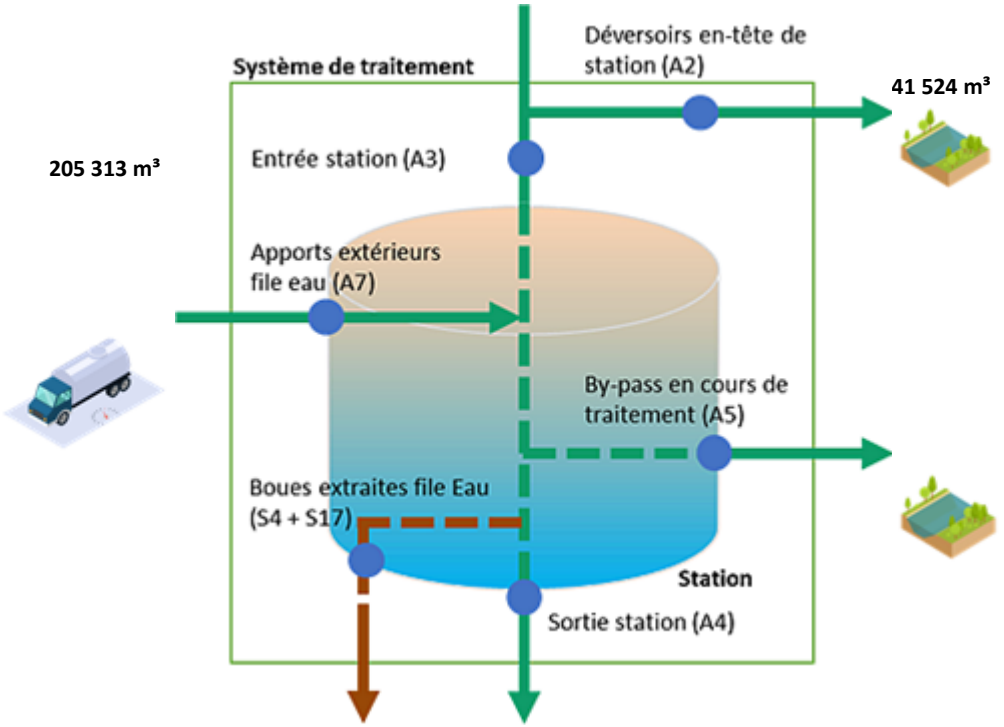

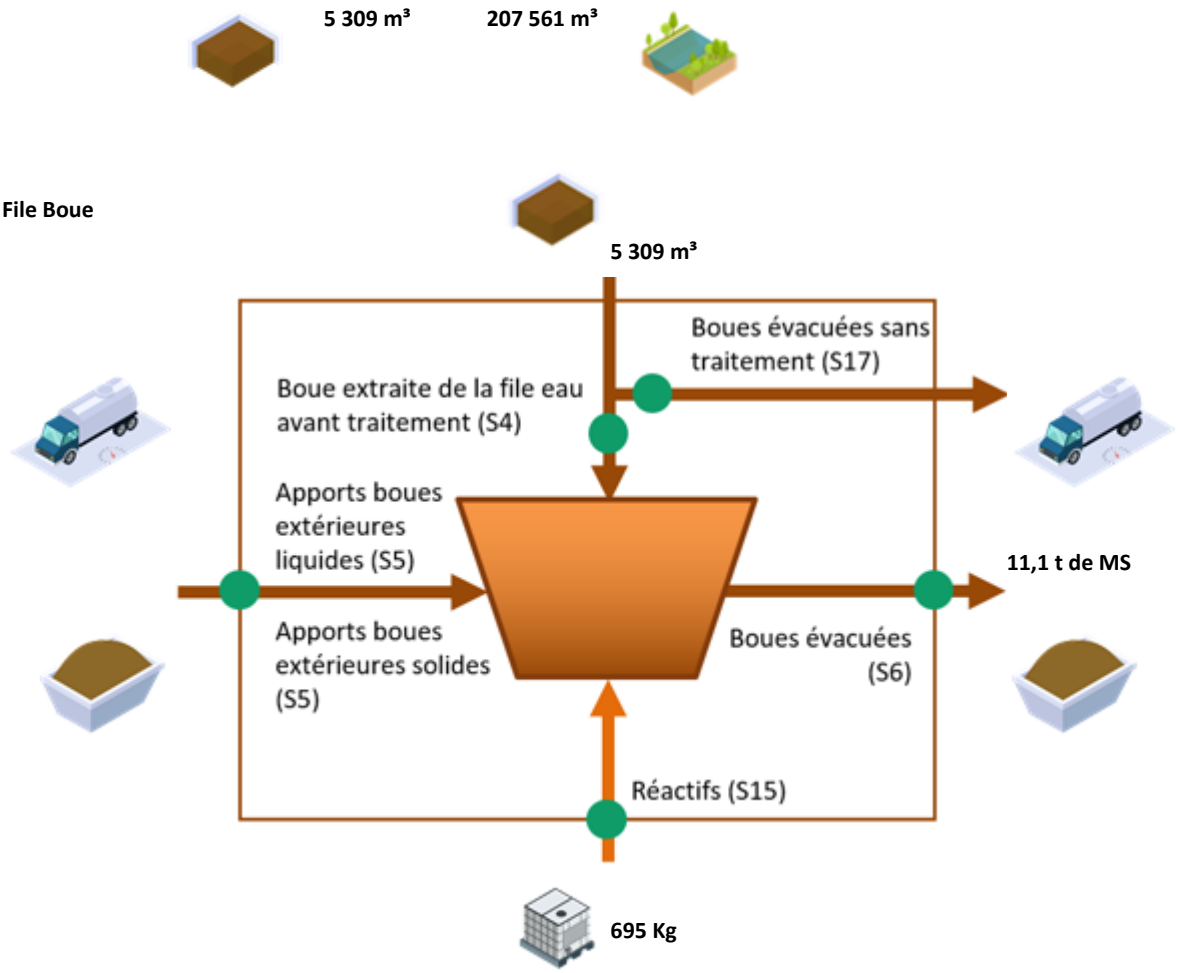
5 309 m³
207 561 m³
File Boue
5 309 m³
Boues évacuées sans traitement (S17)
Boue extraite de la file eau avant traitement (S4)
Apports boues extérieures liquides (S5)
11,1 t de MS
Apports boues extérieures solides (S5)
Boues évacuées (S6)
Réactifs (S15)
695 Kg


Fréquences d'analyses


Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre.


	2025
DCO	12
DBO5	12
MES	12
NTK	12
NGL	12
Ptot	12


Concentrations en sortie et rendements épuratoires


Les graphiques suivants présentent la qualité d'eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les rendements épuratoires obtenus :

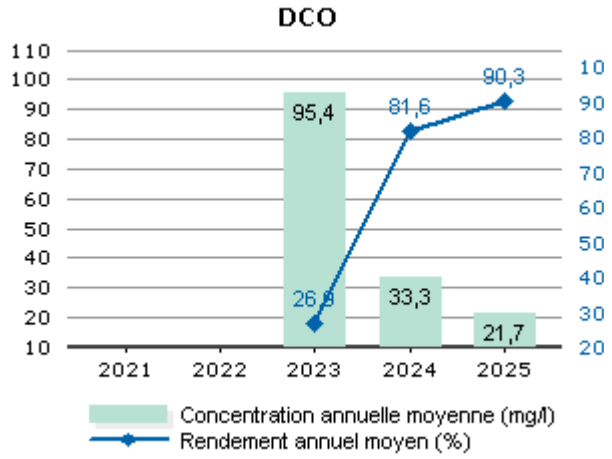

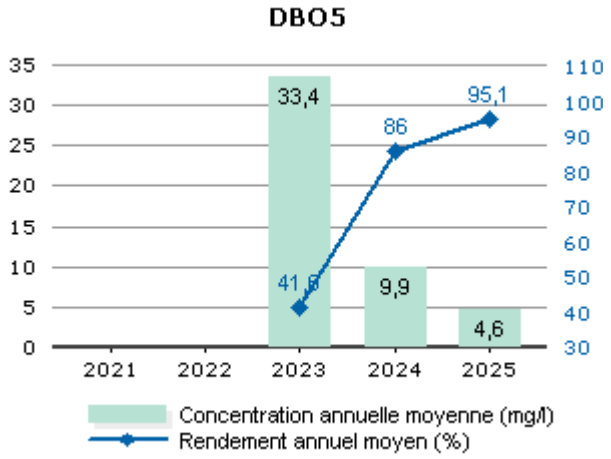

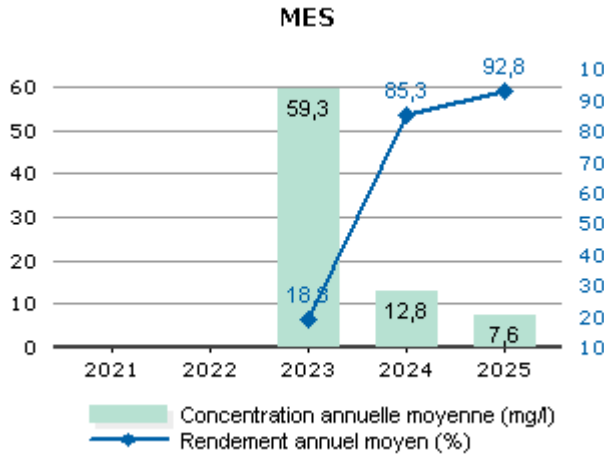

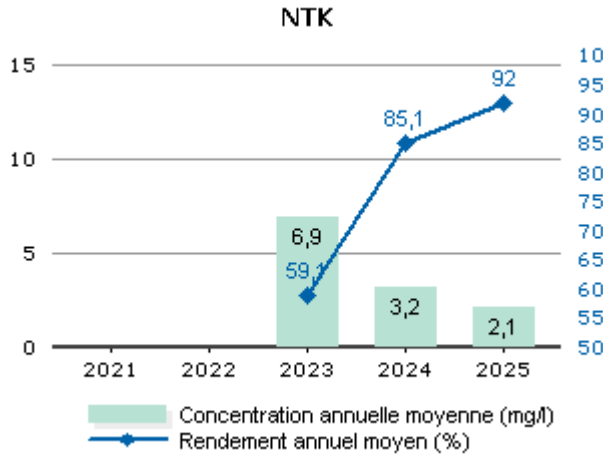

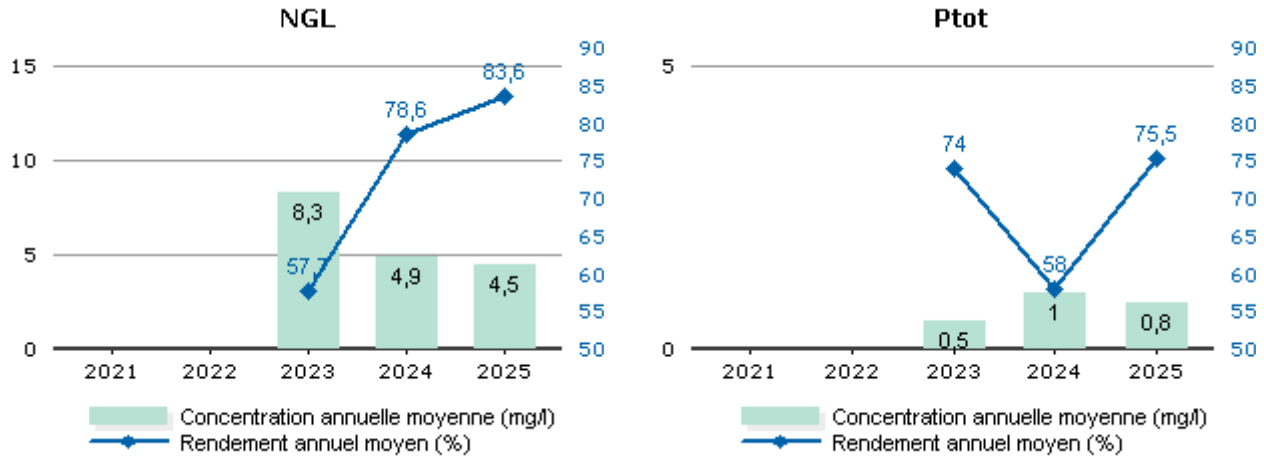

Les valeurs moyennes observées en sortie du système de traitement (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la prescription qui est à présent à calculer en considérant les débits à hauteur du débit de référence. L'évaluation du taux de respect fait l'objet de l'indicateur de conformité locale présenté dans la suite de la présente section.

Conformité de la performance

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations, …). La conformité locale est définie au regard des prescriptions de l'arrêté préfectoral.

	2021	2022	2023	2024	2025
Conformité à l'arrêté préfectoral			100,00	100,00	100,00

A partir de 2019, cette conformité est évaluée suivant les nouvelles règles de calcul que celles des outils du Ministère (prise en compte des débits à hauteur du débit de référence en entrée et sortie, prise en compte du débit entrant en station pour définir si la station est en ou hors condition normale de fonctionnement, prise en compte du débit de référence mentionné dans l'acte administratif (arrêté préfectoral local). Cette évaluation reste fournie à titre indicatif. Seule l'évaluation transmise par le Service de Police de l'Eau en mars a une valeur officielle.

Qualité du traitement des boues

Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration

Cet indicateur permet d'évaluer l'efficacité de dépollution des usines (extraction et concentration de la pollution de l'effluent traité). Il s'exprime en tonnage de matières sèches.

	2021	2022	2023	2024	2025
Boues évacuées (Tonnes de MS) (S6)			7,3	12,8	11,1

Boues évacuées par destination et proportion évacuée selon une filière conforme

Ce tableau présente la proportion de boues évacuées selon une filière conforme.

	2021	2022	2023	2024	2025
Taux de boues évacuées selon une filière conforme (%)			100,0	100,0	100,0

Destination des boues évacuées

Ce tableau présente le détail pour l'année des destinations des boues évacuées.

	Produit brut (t)	Siccité (%)	Matières sèches (t)	Destination conforme (%) *
Station d'épuration	418	2,66	11,1	100,00
Total	**418**	**2,66**	**11,1**	**100,00**

* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches.

Sous-produits évacués par destination

Ce tableau présente les sous-produits générés et leur devenir.

	2021	2022	2023	2024	2025
Autre STEP (m^3) Graisses			3,0		
Total (m^3)			3,0		

STEP ECOT

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le tableau qui suit. Il s'agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté préfectoral d'autorisation, ou à défaut manuel d'autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de conformité


	2025
Débit de référence (m3/j)	99
Capacité nominale (kg/j)	20


Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*)

	DCO	DBO5	MES	NTK	NGL	NH4	Ptot
Concentration maximale à respecter (mg/L) (*)							
moyenne journalière par bilan		35,00					
Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L)							
moyenne journalière par bilan		70,00					
Charge maximale à respecter (kg/j)							
Rendement minimum moyen (%)							
moyen journalier par bilan	60,00	60,00					

* : En général, pour les paramètres NTK, NGL et Ptot, les conformités se jugent en moyennes annuelles, et pour les autres paramètres en moyennes journalières par bilan, cela sous réserve d'absence d'indications complémentaires d'arrêtés préfectoraux locaux.

File Eau

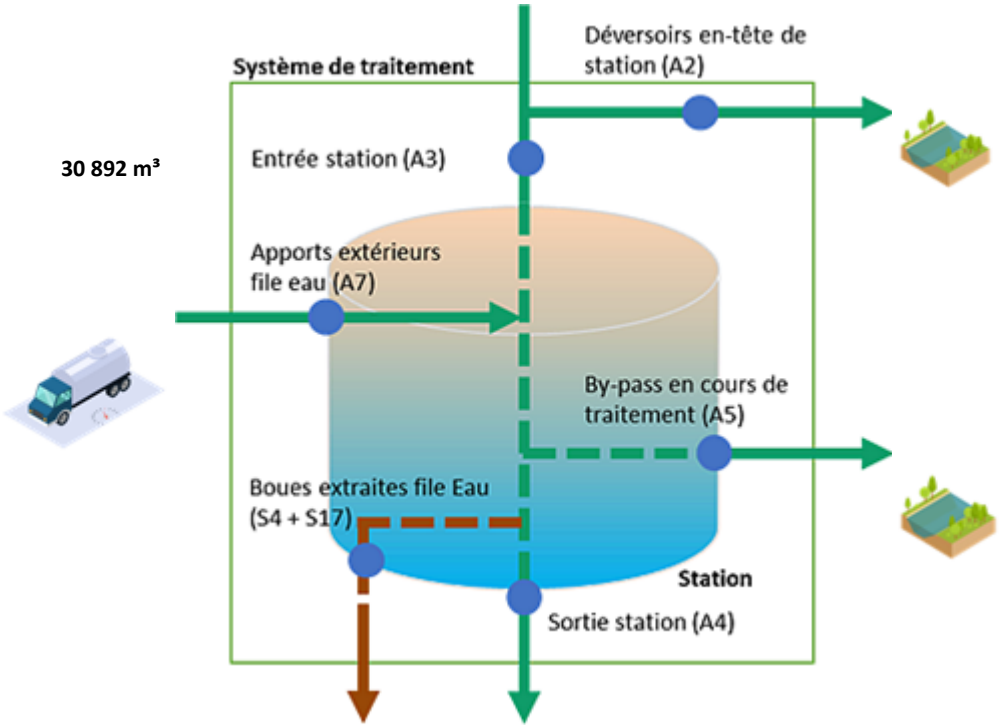

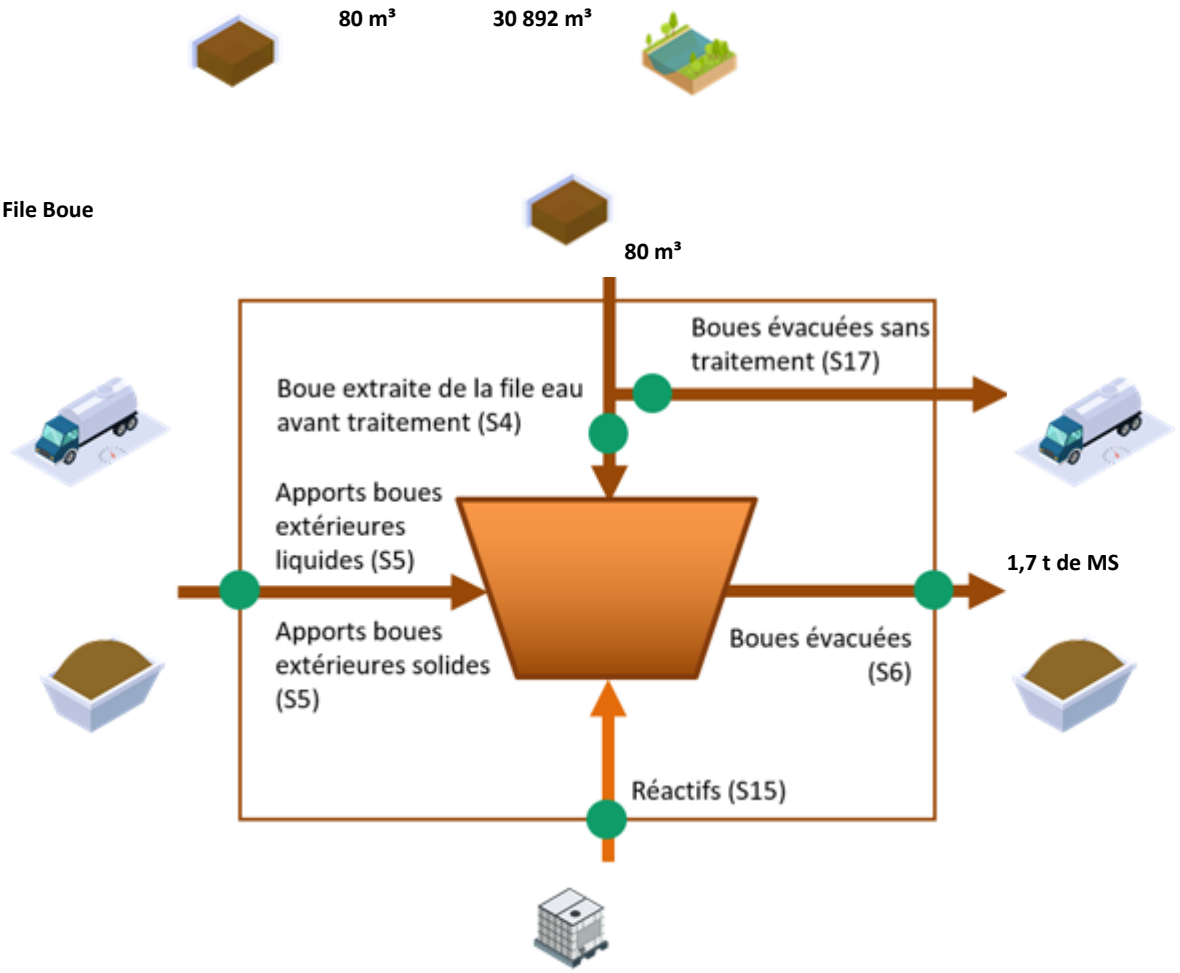
80 m³
30 892 m³
File Boue
80 m³
Boues évacuées sans traitement (S17)
Boue extraite de la file eau avant traitement (S4)
Apports boues extérieures liquides (S5)
1,7 t de MS
Apports boues extérieures solides (S5)
Boues évacuées (S6)
Réactifs (S15)


Fréquences d'analyses


Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre.


	2025
DCO	4
DBO5	4
MES	4
NTK	4
NGL	4
Ptot	4


Concentrations en sortie et rendements épuratoires


Les graphiques suivants présentent la qualité d'eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les rendements épuratoires obtenus :

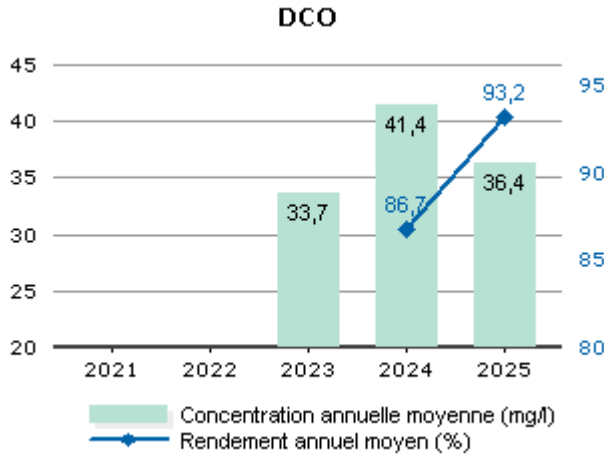

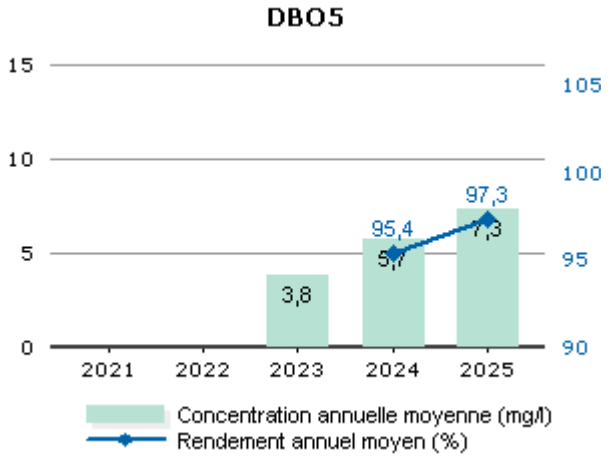

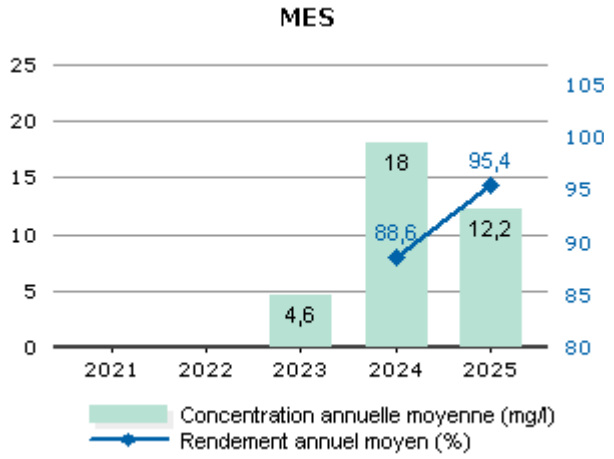

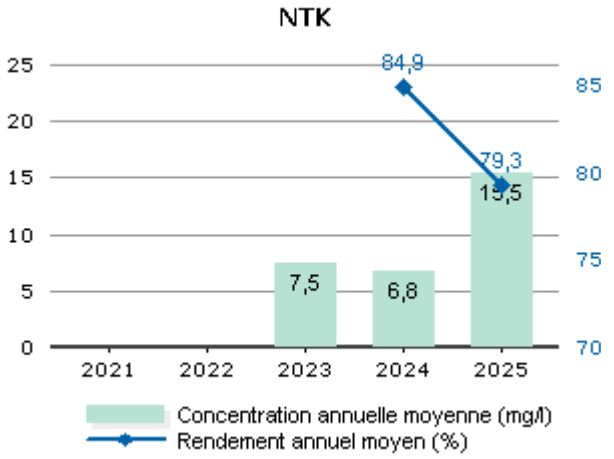

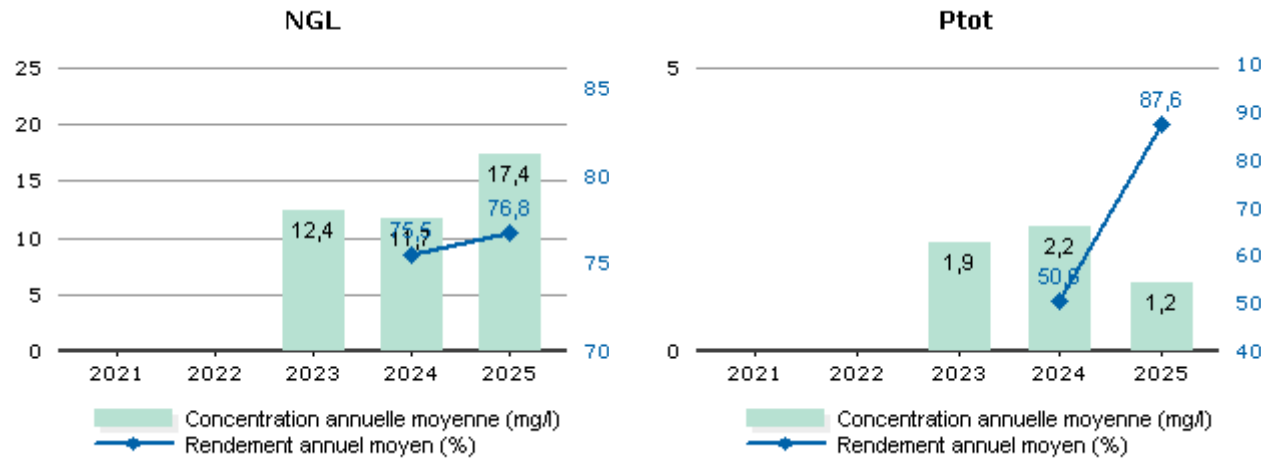

Les valeurs moyennes observées en sortie du système de traitement (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la prescription qui est à présent à calculer en considérant les débits à hauteur du débit de référence. L'évaluation du taux de respect fait l'objet de l'indicateur de conformité locale présenté dans la suite de la présente section.

Conformité de la performance

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations, …). La conformité locale est définie au regard des prescriptions de l'arrêté préfectoral.

	2021	2022	2023	2024	2025
Conformité à l'arrêté préfectoral			100,00	100,00	100,00

A partir de 2019, cette conformité est évaluée suivant les nouvelles règles de calcul que celles des outils du Ministère (prise en compte des débits à hauteur du débit de référence en entrée et sortie, prise en compte du débit entrant en station pour définir si la station est en ou hors condition normale de fonctionnement, prise en compte du débit de référence mentionné dans l'acte administratif (arrêté préfectoral local). Cette évaluation reste fournie à titre indicatif. Seule l'évaluation transmise par le Service de Police de l'Eau en mars a une valeur officielle.

Qualité du traitement des boues

Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration

Cet indicateur permet d'évaluer l'efficacité de dépollution des usines (extraction et concentration de la pollution de l'effluent traité). Il s'exprime en tonnage de matières sèches.

	2021	2022	2023	2024	2025
Boues évacuées (Tonnes de MS) (S6)			4,6	0,3	1,7

Boues évacuées par destination et proportion évacuée selon une filière conforme

Ce tableau présente la proportion de boues évacuées selon une filière conforme.

	2021	2022	2023	2024	2025
Taux de boues évacuées selon une filière conforme (%)			100,0	100,0	100,0

Destination des boues évacuées

Ce tableau présente le détail pour l'année des destinations des boues évacuées.

	Produit brut (t)	Siccité (%)	Matières sèches (t)	Destination conforme (%) *
Station d'épuration	80,3	2,12	1,7	100,00
Total	**80,3**	**2,12**	**1,7**	**100,00**

* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches.

Sous-produits évacués par destination

Ce tableau présente les sous-produits générés et leur devenir.

	2021	2022	2023	2024	2025
Centre de stockage de déchets (t) Refus			0,5		
Incinération (t) Refus				1,4	0,8
Total (t)			0,5	1,4	0,8

STEP FEULE Roselière

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le tableau qui suit. Il s'agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté préfectoral d'autorisation, ou à défaut manuel d'autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de conformité


	2025
Débit de référence (m3/j)	38
Capacité nominale (kg/j)	15


Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*)

	DCO	DBO5	MES	NTK	NGL	NH4	Ptot
Concentration maximale à respecter (mg/L) (*)							
moyenne journalière par bilan	200,00	35,00	50,00				
Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L)							
moyenne journalière par bilan	400,00	70,00	85,00				
Charge maximale à respecter (kg/j)							
Rendement minimum moyen (%)							
moyen journalier par bilan	70,00	80,00	80,00	60,00			20,00


* : En général, pour les paramètres NTK, NGL et Ptot, les conformités se jugent en moyennes annuelles, et pour les autres paramètres en moyennes journalières par bilan, cela sous réserve d'absence d'indications complémentaires d'arrêtés préfectoraux locaux.

File Eau

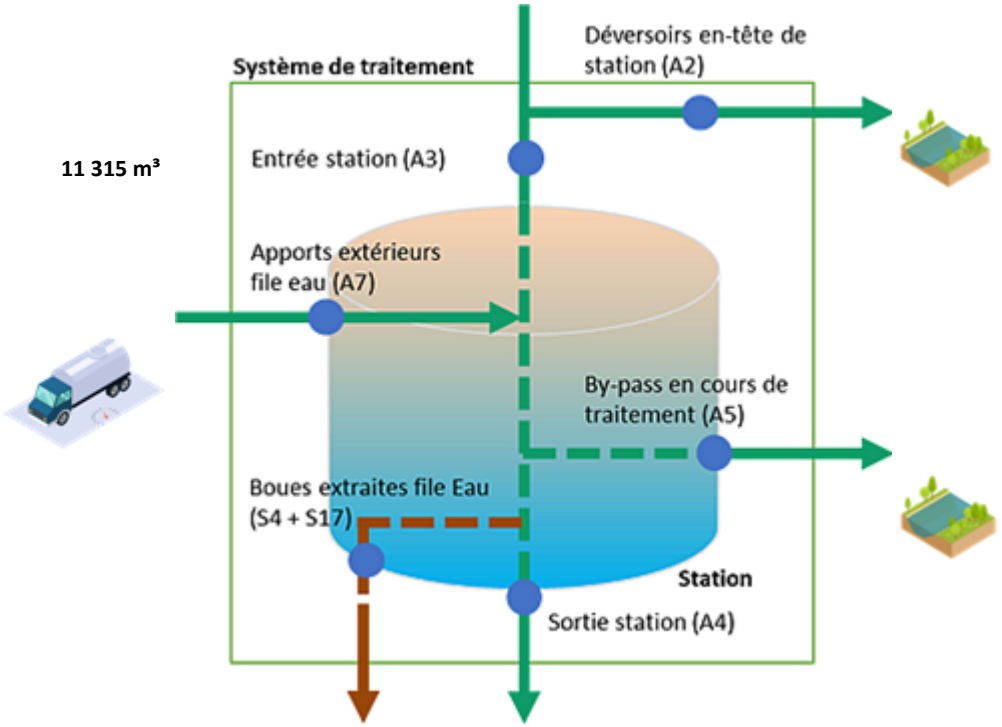


0 m³
11 315 m³

File Boue

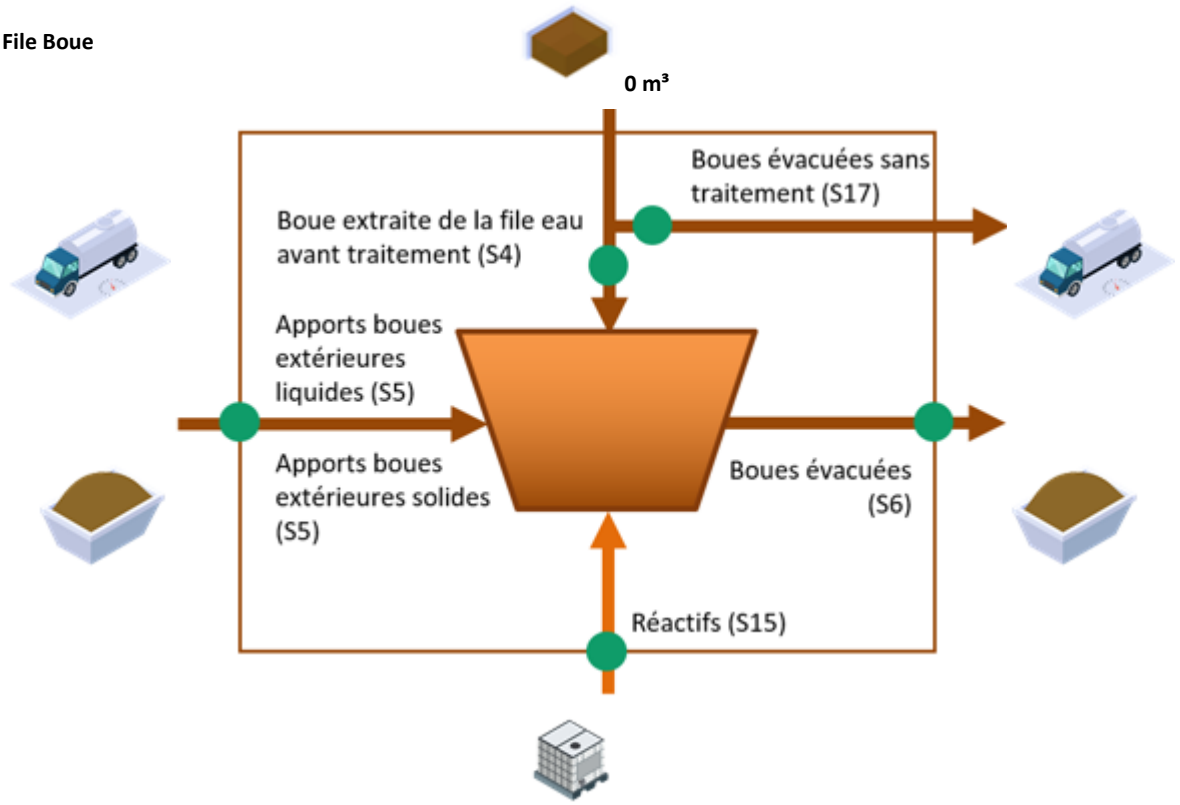
0 m³
Boues évacuées sans traitement (S17)
Boue extraite de la file eau avant traitement (S4)
Apports boues extérieures liquides (S5)
Apports boues extérieures solides (S5)
Boues évacuées (S6)
Réactifs (S15)


Fréquences d'analyses


Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre.


	2025
DCO	1
DBO5	1
MES	1
NTK	1
NGL	1
Ptot	1


Concentrations en sortie et rendements épuratoires


Les graphiques suivants présentent la qualité d'eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les rendements épuratoires obtenus :

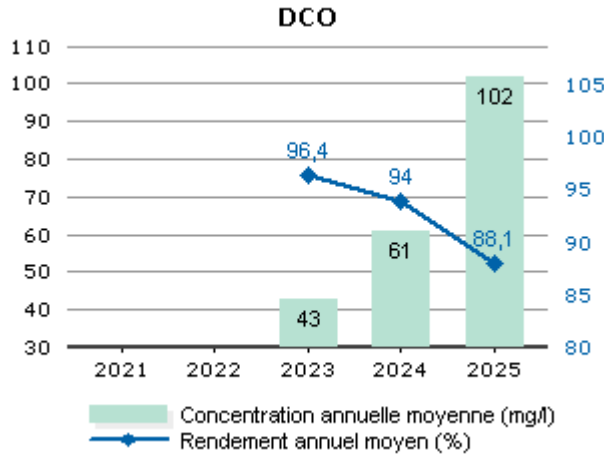


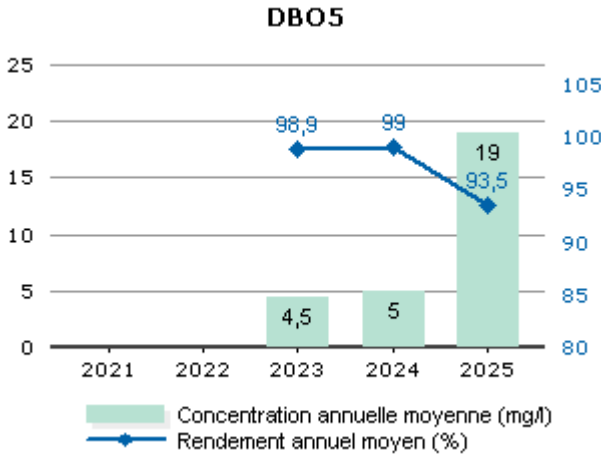

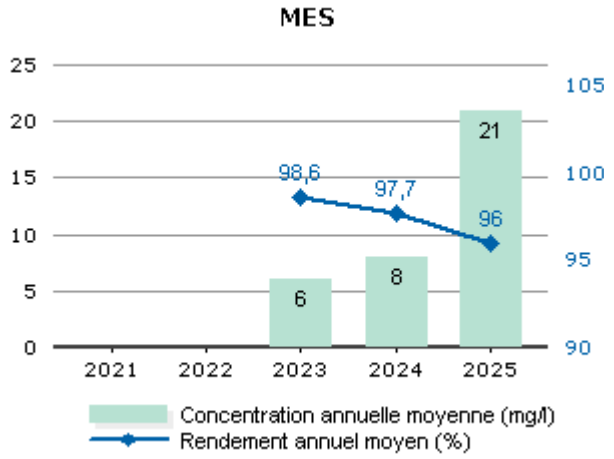

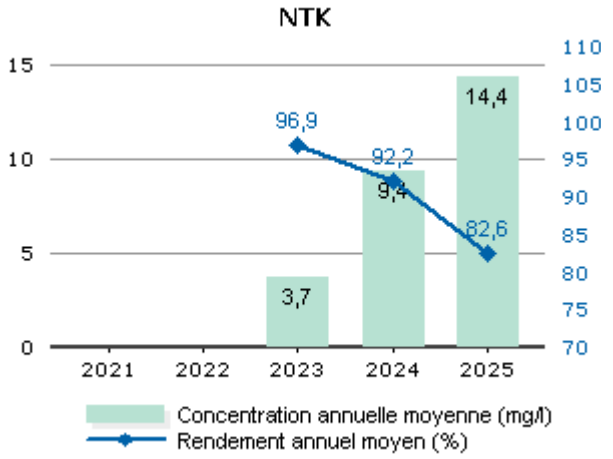

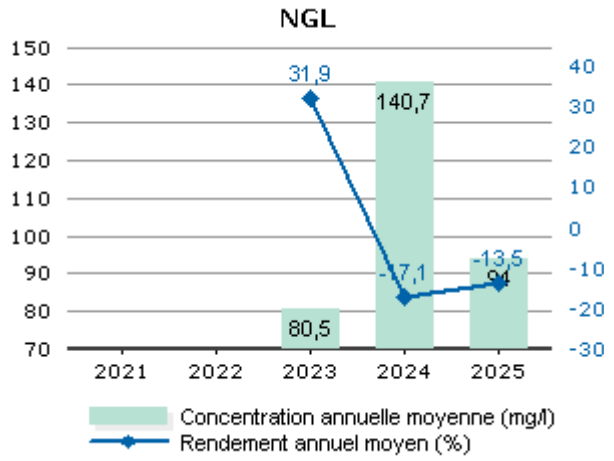

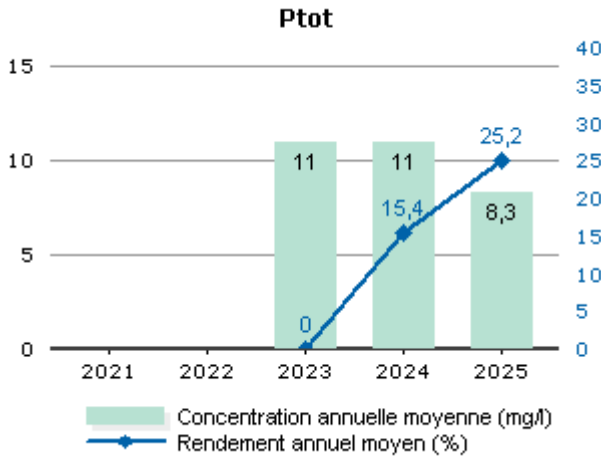

Les valeurs moyennes observées en sortie du système de traitement (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la prescription qui est à présent à calculer en considérant les débits à hauteur du débit de référence. L'évaluation du taux de respect fait l'objet de l'indicateur de conformité locale présenté dans la suite de la présente section.

Conformité de la performance

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations, …). La conformité locale est définie au regard des prescriptions de l'arrêté préfectoral.

	2021	2022	2023	2024	2025
Conformité à l'arrêté préfectoral			100,00	0,00	100,00

A partir de 2019, cette conformité est évaluée suivant les nouvelles règles de calcul que celles des outils du Ministère (prise en compte des débits à hauteur du débit de référence en entrée et sortie, prise en compte du débit entrant en station pour définir si la station est en ou hors condition normale de fonctionnement, prise en compte du débit de référence mentionné dans l'acte administratif (arrêté préfectoral local). Cette évaluation reste fournie à titre indicatif. Seule l'évaluation transmise par le Service de Police de l'Eau en mars a une valeur officielle.

Qualité du traitement des boues

STEP MONTENOIS

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le tableau qui suit. Il s'agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté préfectoral d'autorisation, ou à défaut manuel d'autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de conformité


	2025
Débit de référence (m3/j)	353
Capacité nominale (kg/j)	115


Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*)

	DCO	DBO5	MES	NTK	NGL	NH4	Ptot
Concentration maximale à respecter (mg/L) (*)							
moyenne journalière par bilan	105,00	25,00	35,00				
moyenne annuelle				8,00	15,00		2,00
Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L)							
moyenne journalière par bilan	400,00	70,00	85,00				
Charge maximale à respecter (kg/j)							
Rendement minimum moyen (%)							
moyen journalier par bilan	90,00	95,00	90,00				
moyen annuel				90,00			90,00

* : En général, pour les paramètres NTK, NGL et Ptot, les conformités se jugent en moyennes annuelles, et pour les autres paramètres en moyennes journalières par bilan, cela sous réserve d'absence d'indications complémentaires d'arrêtés préfectoraux locaux.

File Eau

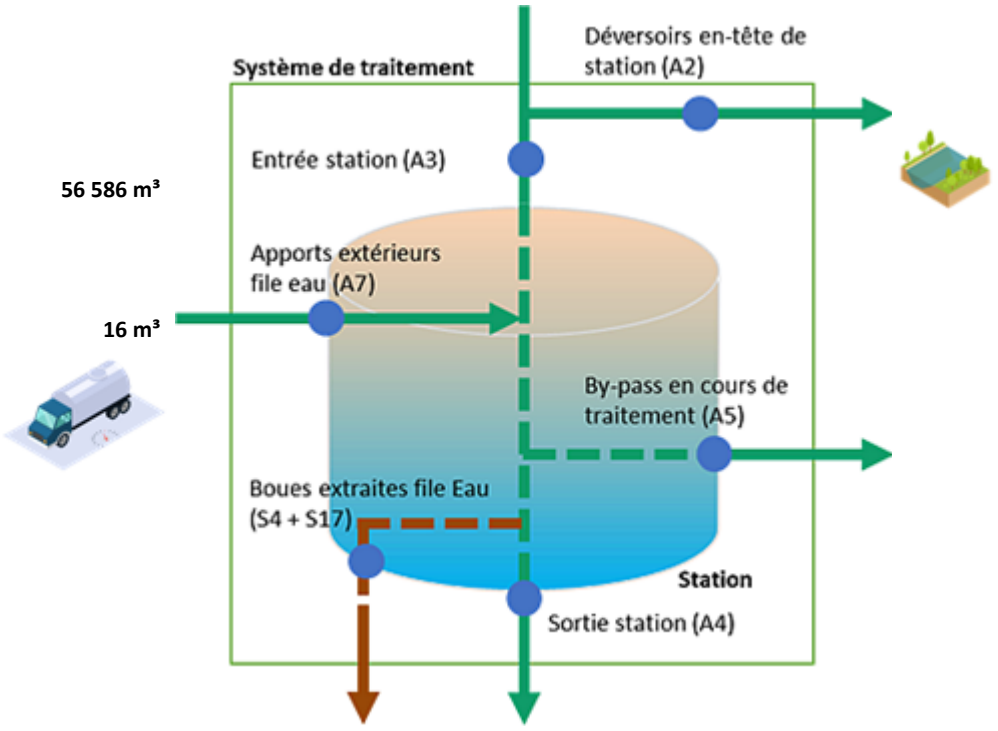

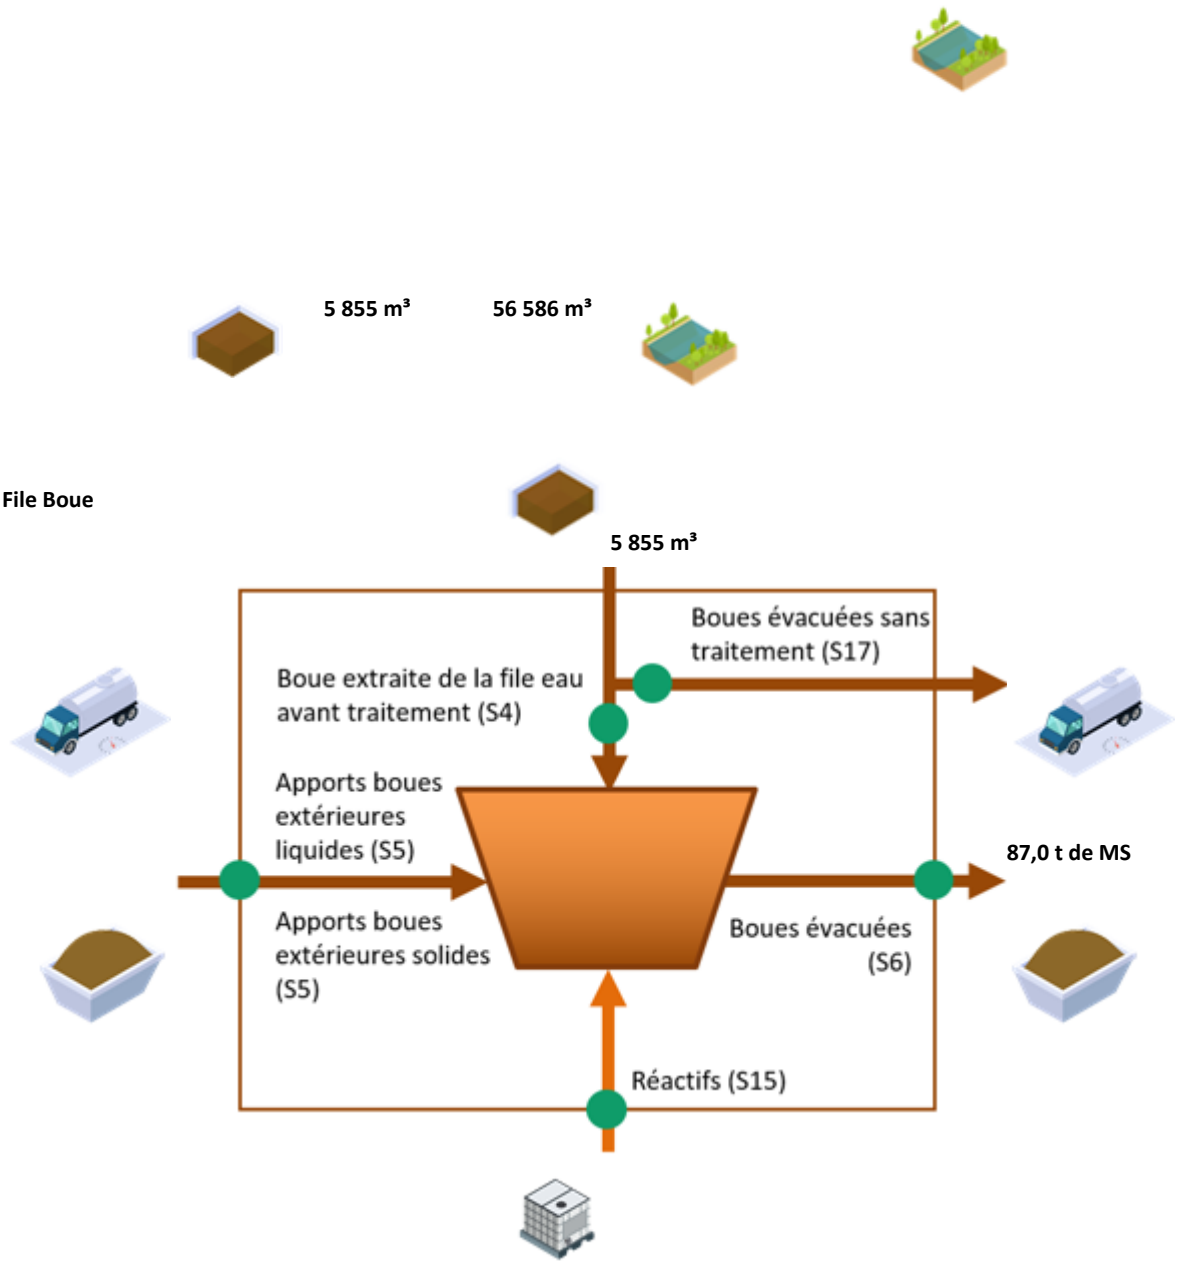
5 855 m³
56 586 m³
File Boue
5 855 m³
Boues évacuées sans traitement (S17)
Boue extraite de la file eau avant traitement (S4)
Apports boues extérieures liquides (S5)
87,0 t de MS
Apports boues extérieures solides (S5)
Boues évacuées (S6)
Réactifs (S15)


Fréquences d'analyses


Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre.


	2025
DCO	3
DBO5	3
MES	3
NTK	3
NGL	3
Ptot	3


Concentrations en sortie et rendements épuratoires


Les graphiques suivants présentent la qualité d'eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les rendements épuratoires obtenus :

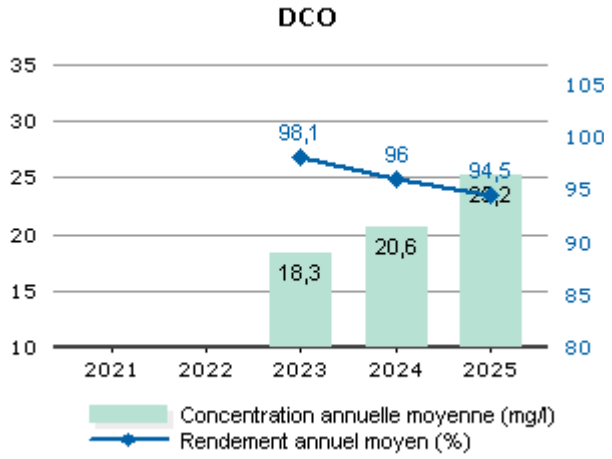


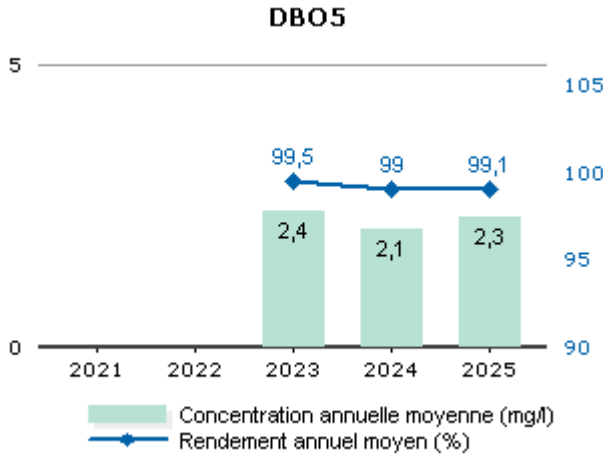

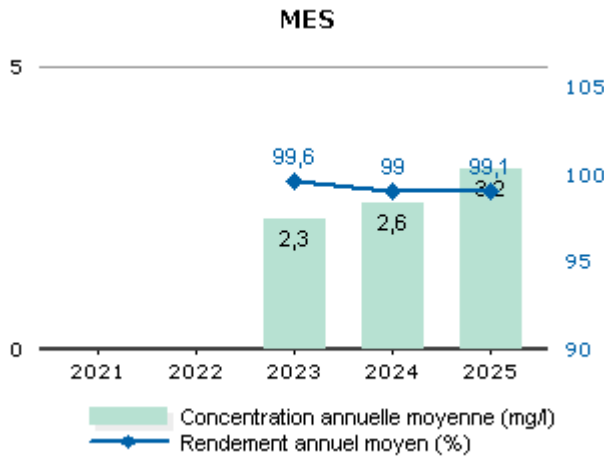

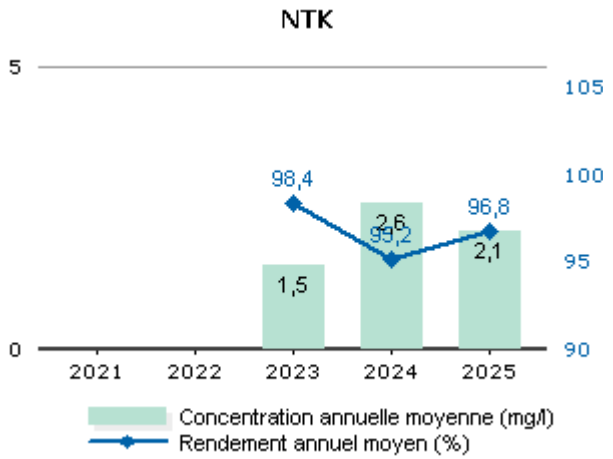

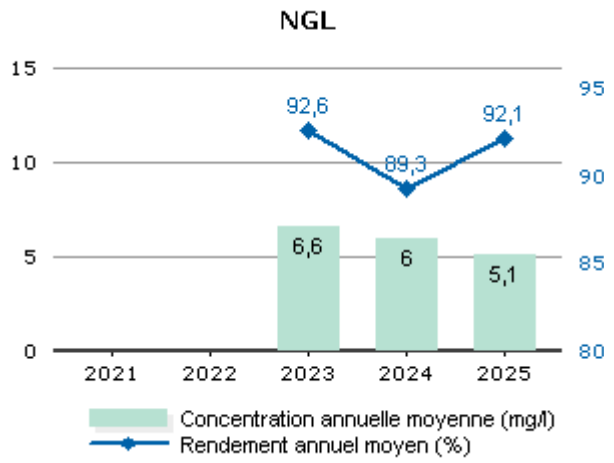

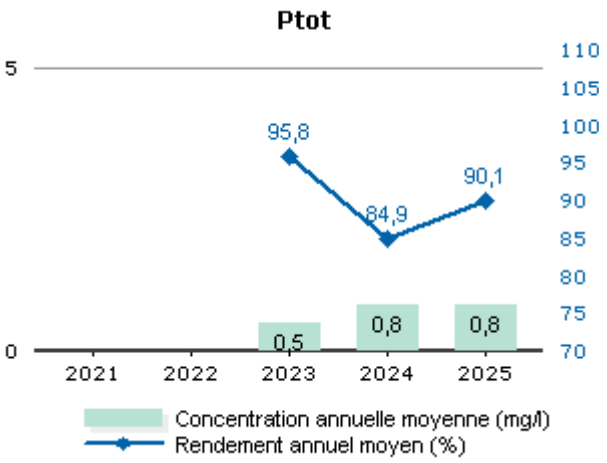

Les valeurs moyennes observées en sortie du système de traitement (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la prescription qui est à présent à calculer en considérant les débits à hauteur du débit de référence. L'évaluation du taux de respect fait l'objet de l'indicateur de conformité locale présenté dans la suite de la présente section.

Conformité de la performance

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations, …). La conformité locale est définie au regard des prescriptions de l'arrêté préfectoral.

	2021	2022	2023	2024	2025
Conformité à l'arrêté préfectoral			100,00	100,00	100,00

A partir de 2019, cette conformité est évaluée suivant les nouvelles règles de calcul que celles des outils du Ministère (prise en compte des débits à hauteur du débit de référence en entrée et sortie, prise en compte du débit entrant en station pour définir si la station est en ou hors condition normale de fonctionnement, prise en compte du débit de référence mentionné dans l'acte administratif (arrêté préfectoral local). Cette évaluation reste fournie à titre indicatif. Seule l'évaluation transmise par le Service de Police de l'Eau en mars a une valeur officielle.

Qualité du traitement des boues

Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration

Cet indicateur permet d'évaluer l'efficacité de dépollution des usines (extraction et concentration de la pollution de l'effluent traité). Il s'exprime en tonnage de matières sèches.

	2021	2022	2023	2024	2025
Boues évacuées (Tonnes de MS) (S6)			20,1		87,0

Boues évacuées par destination et proportion évacuée selon une filière conforme

Ce tableau présente la proportion de boues évacuées selon une filière conforme.

	2021	2022	2023	2024	2025
Taux de boues évacuées selon une filière conforme (%)			100,0		100,0

Destination des boues évacuées

Ce tableau présente le détail pour l'année des destinations des boues évacuées.

	Produit brut (t)	Siccité (%)	Matières sèches (t)	Destination conforme (%) *
Valorisation agricole	497	17,51	87	100,00
Total	**497**	**17,51**	**87**	**100,00**

* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches.

Sous-produits évacués par destination

Ce tableau présente les sous-produits générés et leur devenir.

	2021	2022	2023	2024	2025
Centre de stockage de déchets (t) Refus			2,3		
Incinération (t) Refus				3,2	10,9
Total (t)			2,3	3,2	10,9

STEP PONT DE ROIDE VERMONDANS

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le tableau qui suit. Il s'agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté préfectoral d'autorisation, ou à défaut manuel d'autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de conformité (**)

	2025
Débit de référence (m3/j)	1 900
Capacité nominale (kg/j)	570


Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*) (**)


	DCO	DBO5	MES	NTK	NGL	NH4	Ptot
Concentration maximale à respecter (mg/L) (*)							
moyenne journalière par bilan	90,00	25,00	30,00				
moyenne annuelle					15,00		2,00
Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L)							
moyenne journalière par bilan	250,00	50,00	85,00				
Charge maximale à respecter (kg/j)							
journalière par bilan	122,00	34,00	41,00				
moyenne annuelle					20,00		2,70
Rendement minimum moyen (%)							

* : En général, pour les paramètres NTK, NGL et Ptot, les conformités se jugent en moyennes annuelles, et pour les autres paramètres en moyennes journalières par bilan, cela sous réserve d'absence d'indications complémentaires d'arrêtés préfectoraux locaux.

** : Pour cette installation, présence de sous-périodes multiples, la valeur la plus restrictive des différentes sous-périodes a été retenue dans cette synthèse.

File Eau

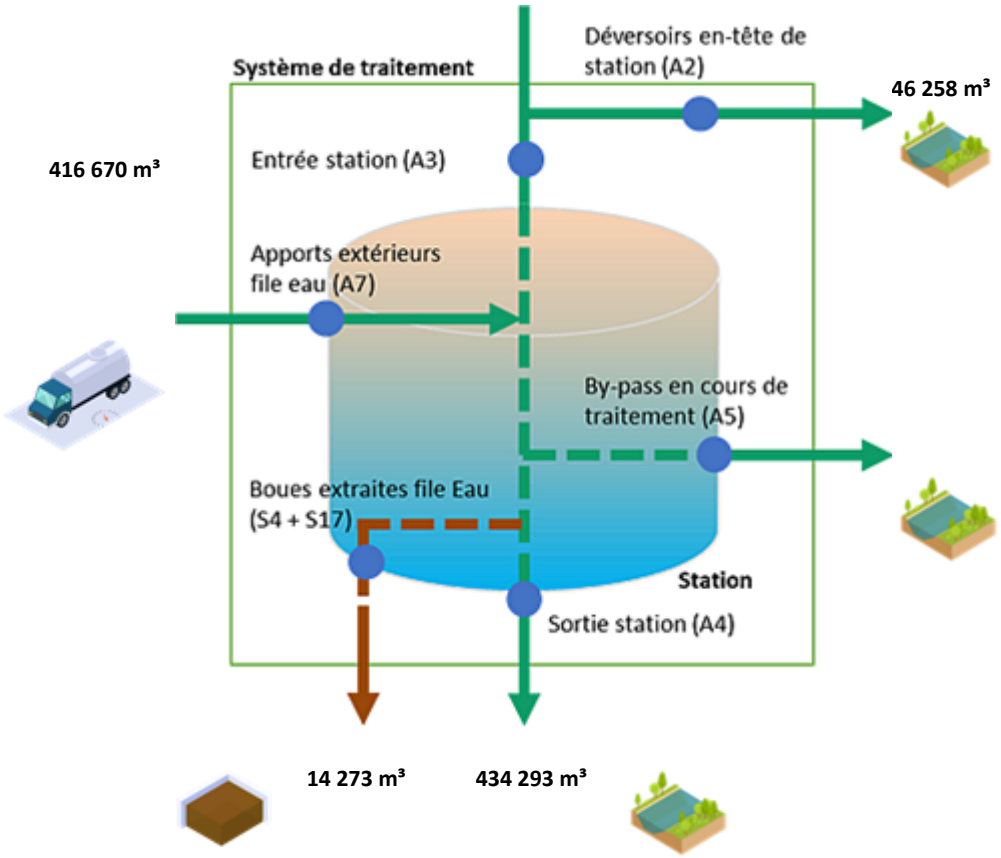
Système de traitement
Déversoirs en-tête de station (A2)
46 258 m³
416 670 m³
Entrée station (A3)
Apports extérieurs file eau (A7)
By-pass en cours de traitement (A5)
Boues extraites file Eau (S4 + S17)
Station
Sortie station (A4)
14 273 m³
434 293 m³

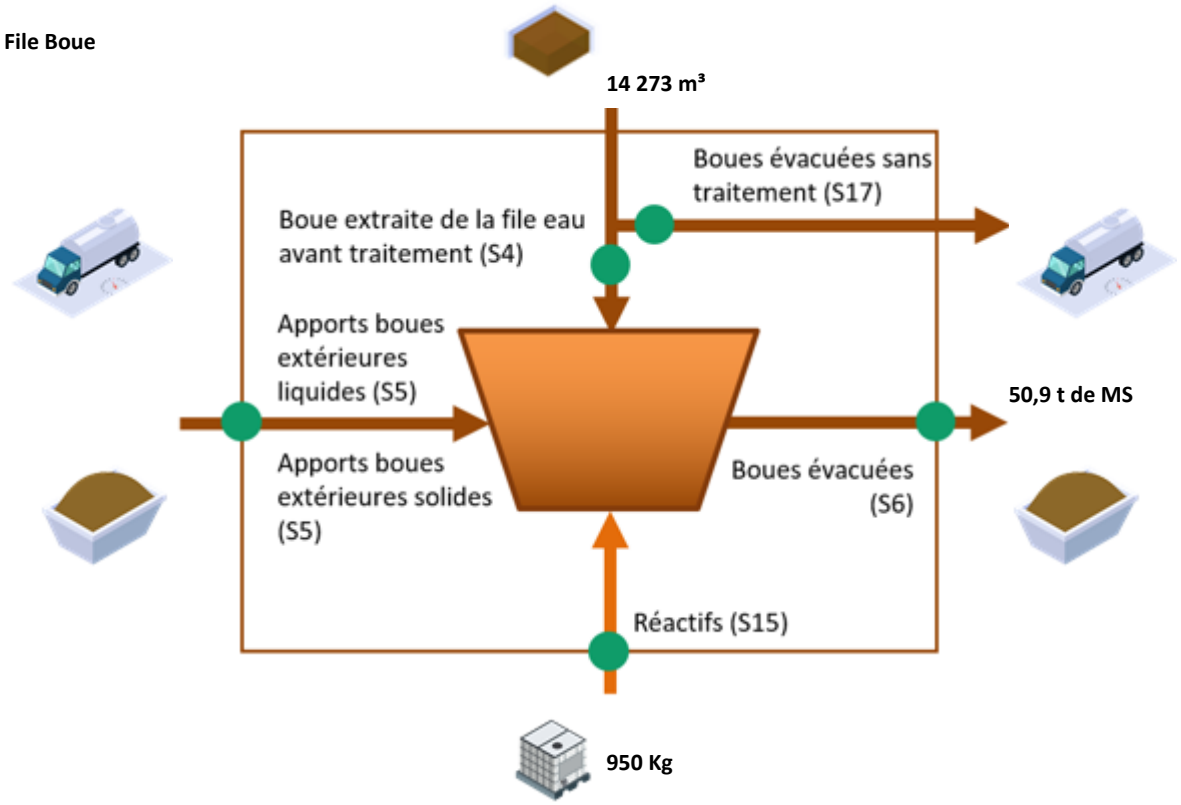
File Boue
14 273 m³
Boues évacuées sans traitement (S17)
Boue extraite de la file eau avant traitement (S4)
Apports boues extérieures liquides (S5)
50,9 t de MS
Apports boues extérieures solides (S5)
Boues évacuées (S6)
Réactifs (S15)
950 Kg


Fréquences d'analyses


Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre.


	2025
DCO	12
DBO5	12
MES	12
NTK	12
NGL	12
Ptot	12


Concentrations en sortie et rendements épuratoires


Les graphiques suivants présentent la qualité d'eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les rendements épuratoires obtenus :

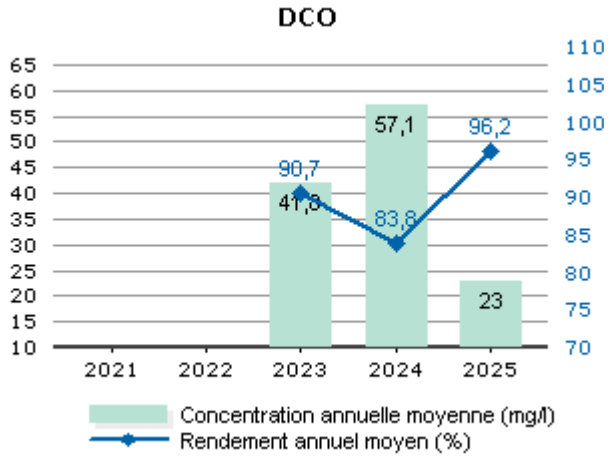

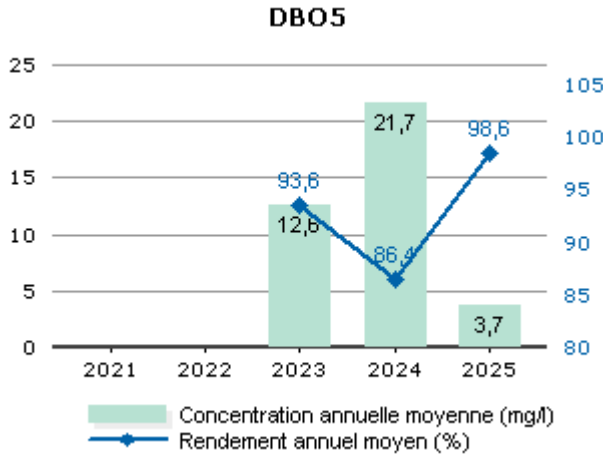

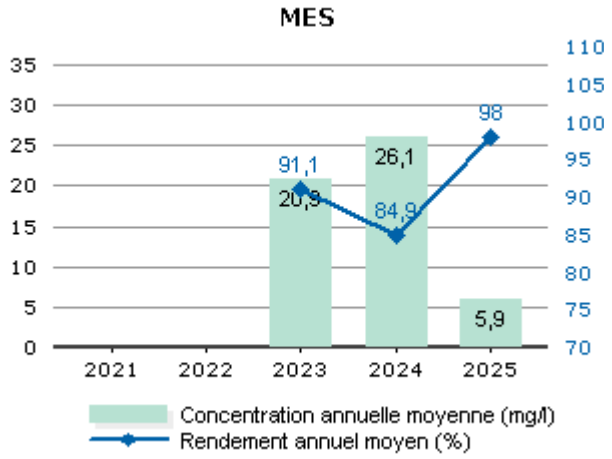

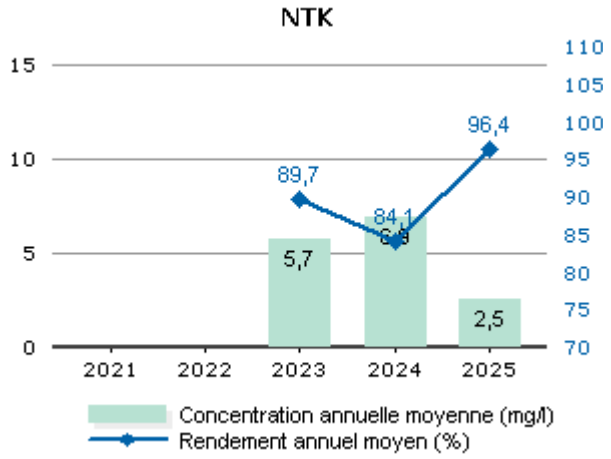

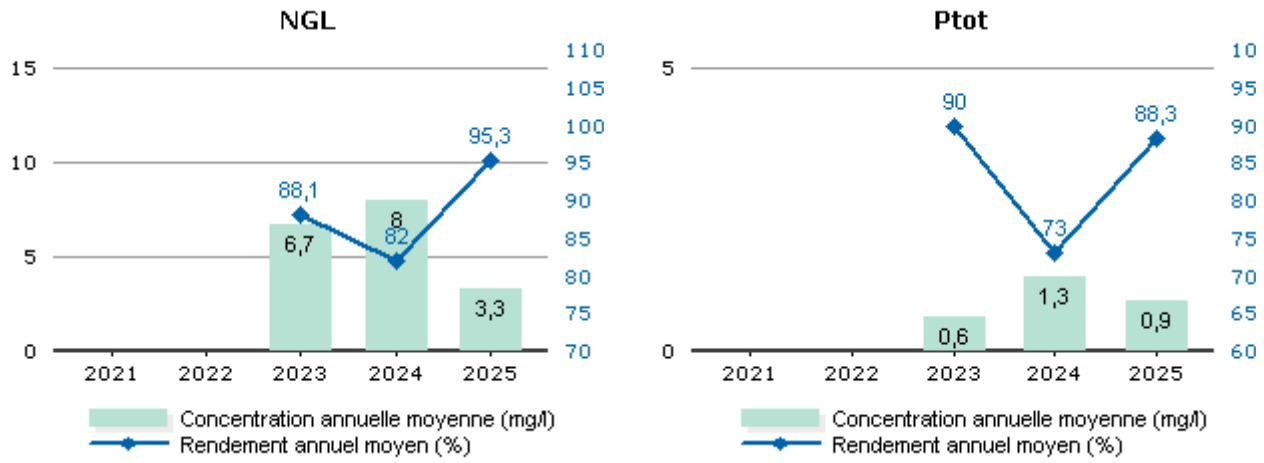

Les valeurs moyennes observées en sortie du système de traitement (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la prescription qui est à présent à calculer en considérant les débits à hauteur du débit de référence. L'évaluation du taux de respect fait l'objet de l'indicateur de conformité locale présenté dans la suite de la présente section.

Conformité de la performance

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations, …). La conformité locale est définie au regard des prescriptions de l'arrêté préfectoral.

	2021	2022	2023	2024	2025
Conformité à l'arrêté préfectoral			100,00	0,00	100,00

A partir de 2019, cette conformité est évaluée suivant les nouvelles règles de calcul que celles des outils du Ministère (prise en compte des débits à hauteur du débit de référence en entrée et sortie, prise en compte du débit entrant en station pour définir si la station est en ou hors condition normale de fonctionnement, prise en compte du débit de référence mentionné dans l'acte administratif (arrêté préfectoral local). Cette évaluation reste fournie à titre indicatif. Seule l'évaluation transmise par le Service de Police de l'Eau en mars a une valeur officielle.

Qualité du traitement des boues

Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration

Cet indicateur permet d'évaluer l'efficacité de dépollution des usines (extraction et concentration de la pollution de l'effluent traité). Il s'exprime en tonnage de matières sèches.

	2021	2022	2023	2024	2025
Boues évacuées (Tonnes de MS) (S6)			162,3	69,3	50,9

Boues évacuées par destination et proportion évacuée selon une filière conforme

Ce tableau présente la proportion de boues évacuées selon une filière conforme.

	2021	2022	2023	2024	2025
Taux de boues évacuées selon une filière conforme (%)			100,0	100,0	100,0

Destination des boues évacuées

Ce tableau présente le détail pour l'année des destinations des boues évacuées.

	Produit brut (t)	Siccité (%)	Matières sèches (t)	Destination conforme (%) *
Valorisation agricole	2106	1,83	38,5	100,00
Station d'épuration	582,2	2,11	12,3	100,00
Total	**2688,2**	**1,89**	**50,8**	**100,00**

* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches.

Sous-produits évacués par destination

Ce tableau présente les sous-produits générés et leur devenir.

	2021	2022	2023	2024	2025
Centre de stockage de déchets (t) Refus			62,8		
Incinération (t) Refus			62,8	42,3	23,4
Total (t)			125,6	42,3	23,4

STEP ROCHES BLAMONT RIZOSPHÈRE

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le tableau qui suit. Il s'agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté préfectoral d'autorisation, ou à défaut manuel d'autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de conformité

	2025
Débit de référence (m3/j)	239
Capacité nominale (kg/j)	45

Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*)

	DCO	DBO5	MES	NTK	NGL	NH4	Ptot
Concentration maximale à respecter (mg/L) (*)							
moyenne journalière par bilan		35,00					
Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L)							
moyenne journalière par bilan		70,00					
Charge maximale à respecter (kg/j)							
Rendement minimum moyen (%)							
moyen journalier par bilan	60,00	60,00					

* : En général, pour les paramètres NTK, NGL et Ptot, les conformités se jugent en moyennes annuelles, et pour les autres paramètres en moyennes journalières par bilan, cela sous réserve d'absence d'indications complémentaires d'arrêtés préfectoraux locaux.

La nouvelle station d'épuration (STEP) Roches lès Blamont Rhizosphère a été mise en service le 17 septembre 2025, en remplacement de l'ancienne STEP Roches les Blamont. Pour des raisons de commodité, les données couvrant l'intégralité de l'année 2025 sont consolidées dans le paragraphe suivant, sous la dénomination « STEP Roches les Blamont (ancienne STEP) ».

STEP ROCHES LES BLAMONT (ancienne STEP)

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le tableau qui suit. Il s'agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté préfectoral d'autorisation, ou à défaut manuel d'autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de conformité


	2025
Débit de référence (m3/j)	239
Capacité nominale (kg/j)	32


Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*)

	DCO	DBO5	MES	NTK	NGL	NH4	Ptot
Concentration maximale à respecter (mg/L) (*)							
moyenne journalière par bilan		35,00					
Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L)							
moyenne journalière par bilan		70,00					
Charge maximale à respecter (kg/j)							
Rendement minimum moyen (%)							
moyen journalier par bilan	60,00	60,00					

* : En général, pour les paramètres NTK, NGL et Ptot, les conformités se jugent en moyennes annuelles, et pour les autres paramètres en moyennes journalières par bilan, cela sous réserve d'absence d'indications complémentaires d'arrêtés préfectoraux locaux.

File Eau

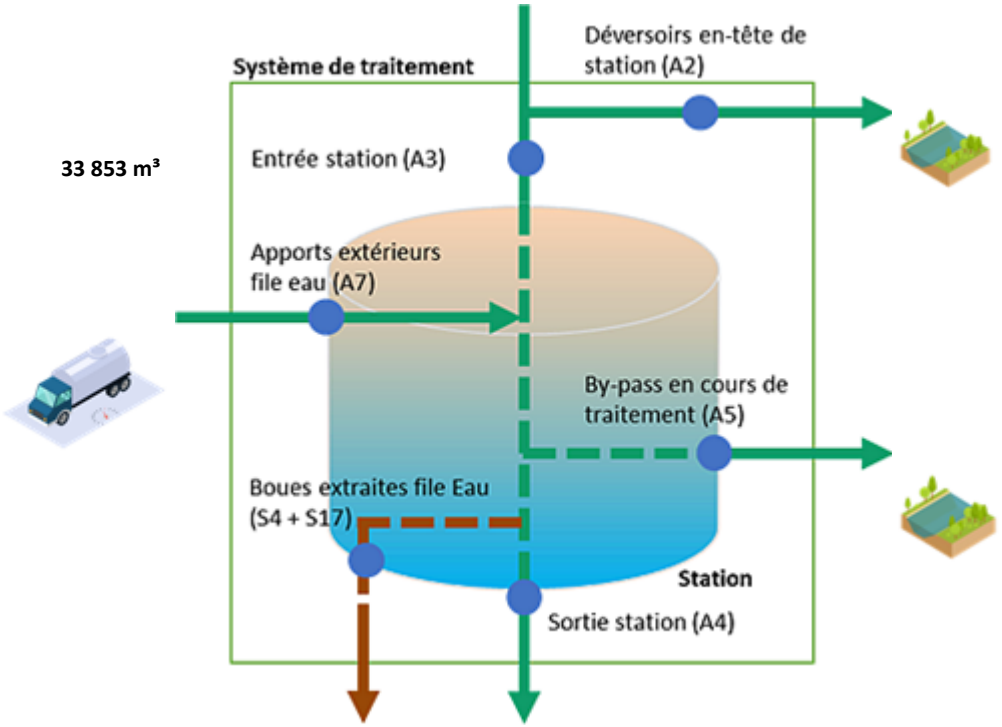

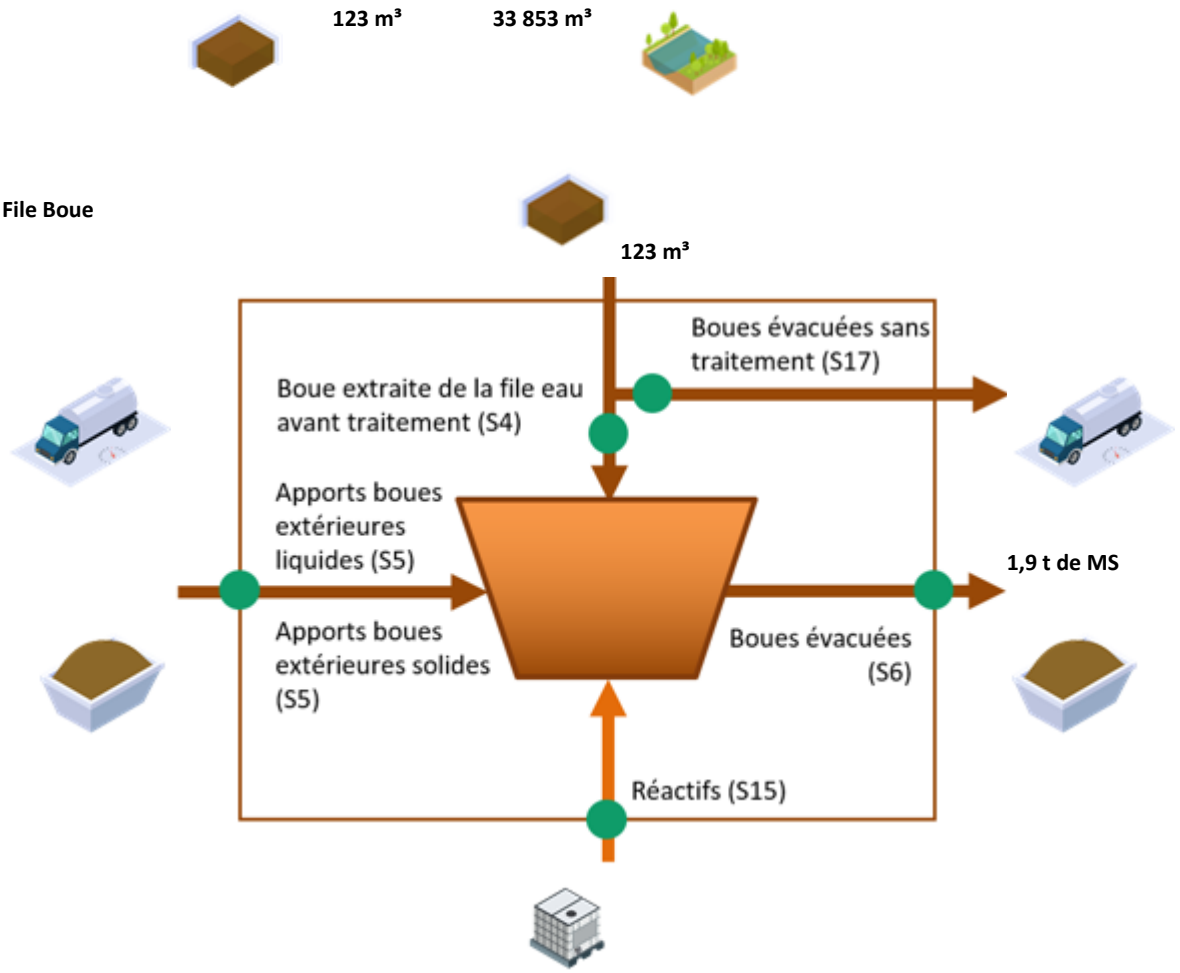
123 m³
33 853 m³
File Boue
123 m³
Boues évacuées sans traitement (S17)
Boue extraite de la file eau avant traitement (S4)
Apports boues extérieures liquides (S5)
1,9 t de MS
Apports boues extérieures solides (S5)
Boues évacuées (S6)
Réactifs (S15)


Fréquences d'analyses


Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre.


	2025
DCO	3
DBO5	3
MES	3
NTK	3
NGL	3
Ptot	3


Concentrations en sortie et rendements épuratoires


Les graphiques suivants présentent la qualité d'eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les rendements épuratoires obtenus :

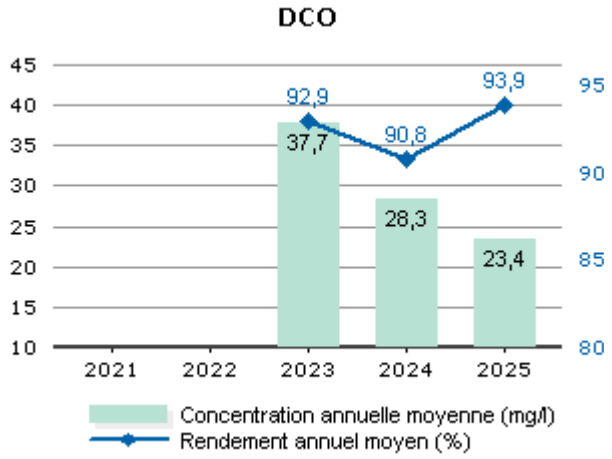

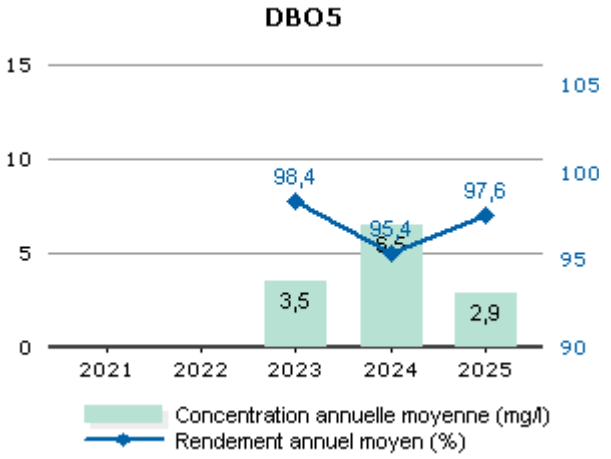

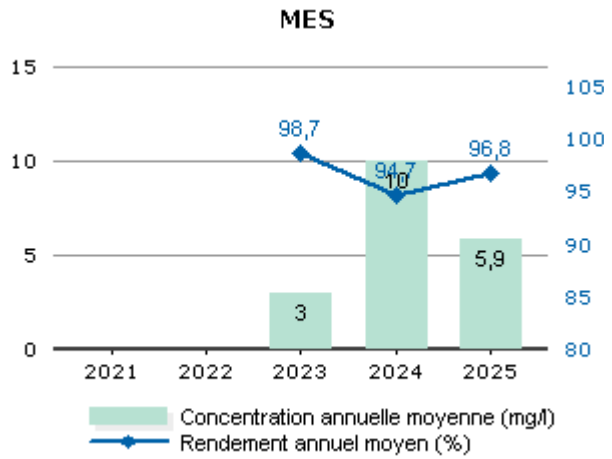

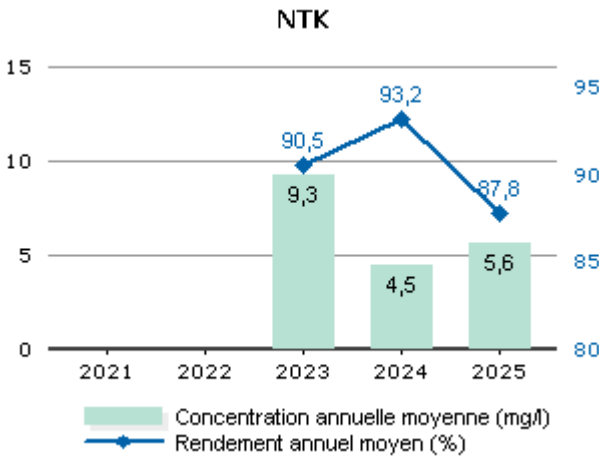

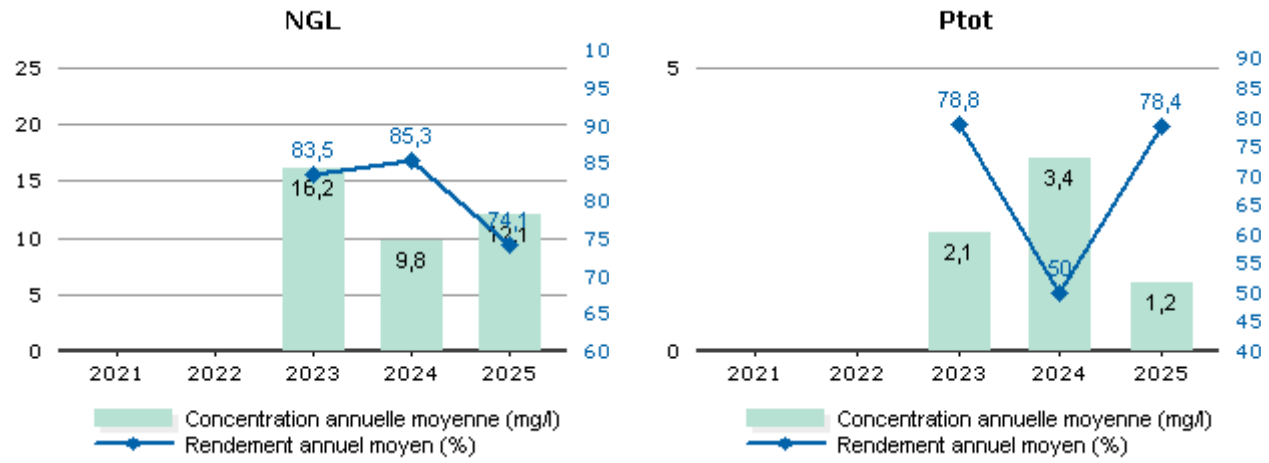

Les valeurs moyennes observées en sortie du système de traitement (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la prescription qui est à présent à calculer en considérant les débits à hauteur du débit de référence. L'évaluation du taux de respect fait l'objet de l'indicateur de conformité locale présenté dans la suite de la présente section.

Conformité de la performance

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations, …). La conformité locale est définie au regard des prescriptions de l'arrêté préfectoral.

	2021	2022	2023	2024	2025
Conformité à l'arrêté préfectoral			100,00	100,00	100,00

A partir de 2019, cette conformité est évaluée suivant les nouvelles règles de calcul que celles des outils du Ministère (prise en compte des débits à hauteur du débit de référence en entrée et sortie, prise en compte du débit entrant en station pour définir si la station est en ou hors condition normale de fonctionnement, prise en compte du débit de référence mentionné dans l'acte administratif (arrêté préfectoral local). Cette évaluation reste fournie à titre indicatif. Seule l'évaluation transmise par le Service de Police de l'Eau en mars a une valeur officielle.

Qualité du traitement des boues

Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration

Cet indicateur permet d'évaluer l'efficacité de dépollution des usines (extraction et concentration de la pollution de l'effluent traité). Il s'exprime en tonnage de matières sèches.

	2021	2022	2023	2024	2025
Boues évacuées (Tonnes de MS) (S6)				1,2	1,9

Boues évacuées par destination et proportion évacuée selon une filière conforme

Ce tableau présente la proportion de boues évacuées selon une filière conforme.

	2021	2022	2023	2024	2025
Taux de boues évacuées selon une filière conforme (%)				100,0	100,0

Destination des boues évacuées

Ce tableau présente le détail pour l'année des destinations des boues évacuées.

	Produit brut (t)	Siccité (%)	Matières sèches (t)	Destination conforme (%) *
Station d'épuration	122,6	1,55	1,9	100,00
Total	**122,6**	**1,55**	**1,9**	**100,00**

* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches.

Sous-produits évacués par destination

Ce tableau présente les sous-produits générés et leur devenir.

	2021	2022	2023	2024	2025
Centre de stockage de déchets (t) Refus			0,2		
Incinération (t) Refus				0,1	0,3
Total (t)			0,2	0,1	0,3

STEP SAINT MAURICE COLOMBIER

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le tableau qui suit. Il s'agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté préfectoral d'autorisation, ou à défaut manuel d'autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de conformité


	2025
Débit de référence (m3/j)	210
Capacité nominale (kg/j)	86


Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*)

	DCO	DBO5	MES	NTK	NGL	NH4	Ptot
Concentration maximale à respecter (mg/L) (*)							
moyenne journalière par bilan	90,00	30,00	20,00				
moyenne annuelle				40,00			
Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L)							
moyenne journalière par bilan	200,00	35,00	85,00				
Charge maximale à respecter (kg/j)							
Rendement minimum moyen (%)							
moyen journalier par bilan			90,00				

* : En général, pour les paramètres NTK, NGL et Ptot, les conformités se jugent en moyennes annuelles, et pour les autres paramètres en moyennes journalières par bilan, cela sous réserve d'absence d'indications complémentaires d'arrêtés préfectoraux locaux.

File Eau

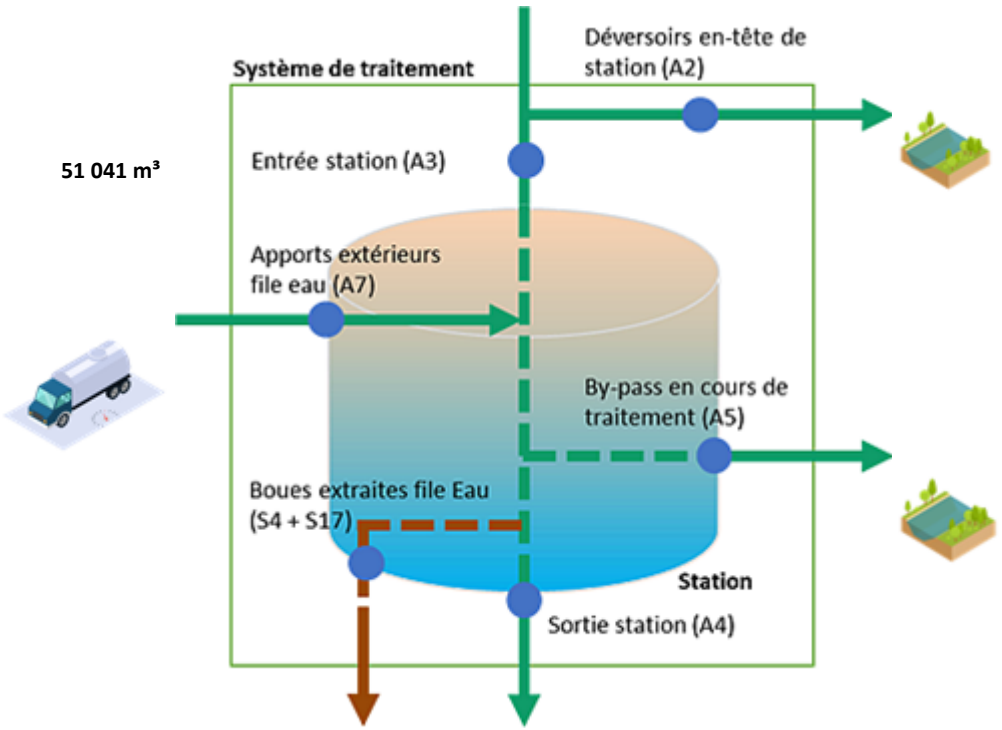

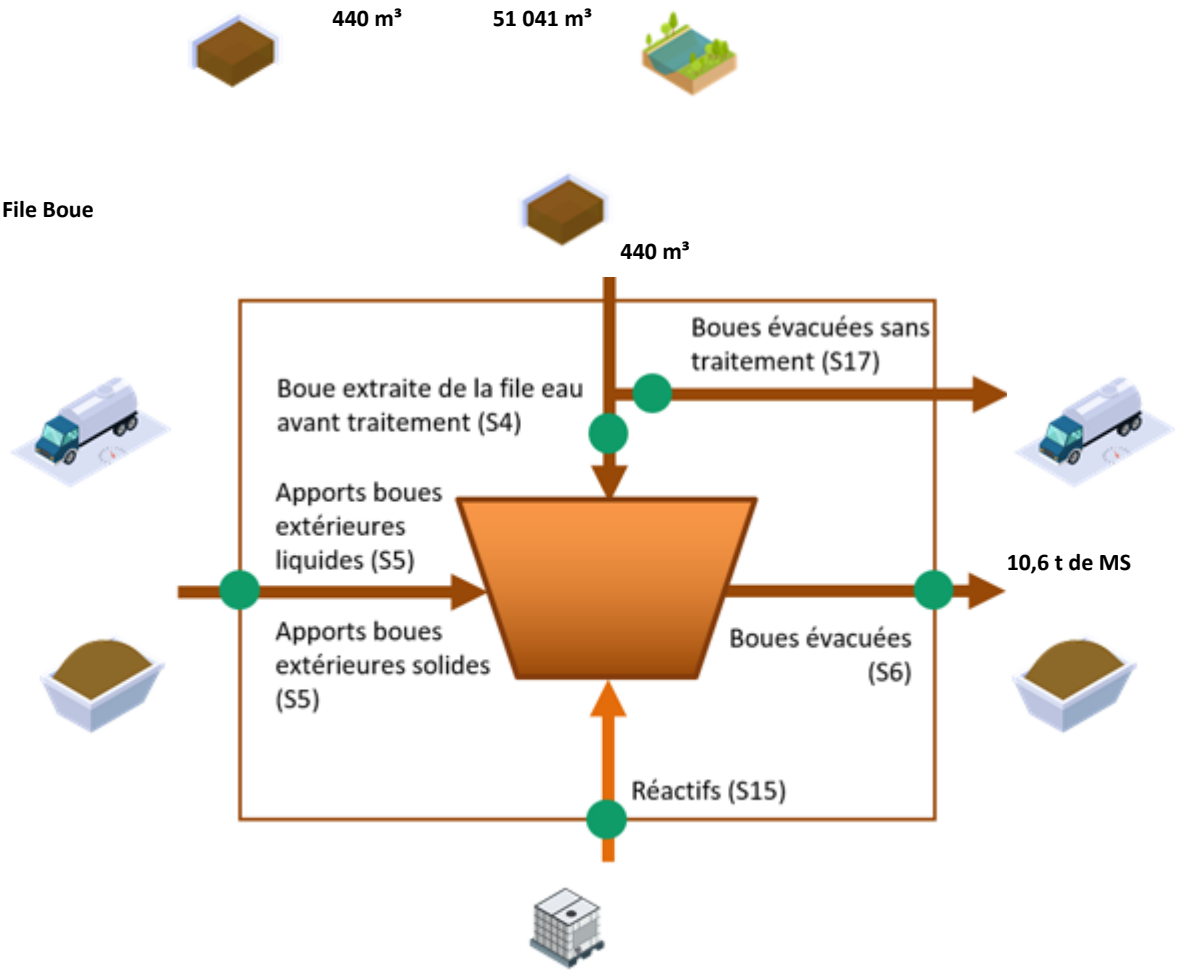
440 m³
51 041 m³
File Boue
440 m³
Boues évacuées sans traitement (S17)
Boue extraite de la file eau avant traitement (S4)
Apports boues extérieures liquides (S5)
10,6 t de MS
Apports boues extérieures solides (S5)
Boues évacuées (S6)
Réactifs (S15)


Fréquences d'analyses


Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre.


	2025
DCO	2
DBO5	2
MES	2
NTK	2
NGL	2
Ptot	2


Concentrations en sortie et rendements épuratoires


Les graphiques suivants présentent la qualité d'eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les rendements épuratoires obtenus :

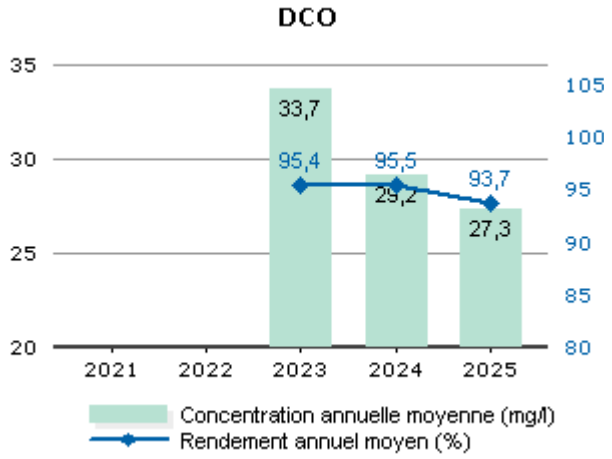

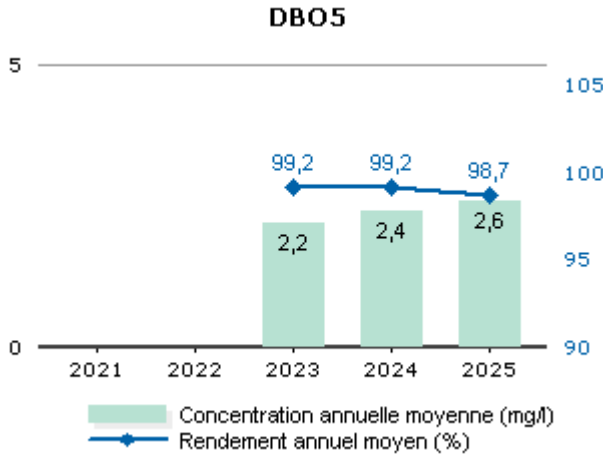

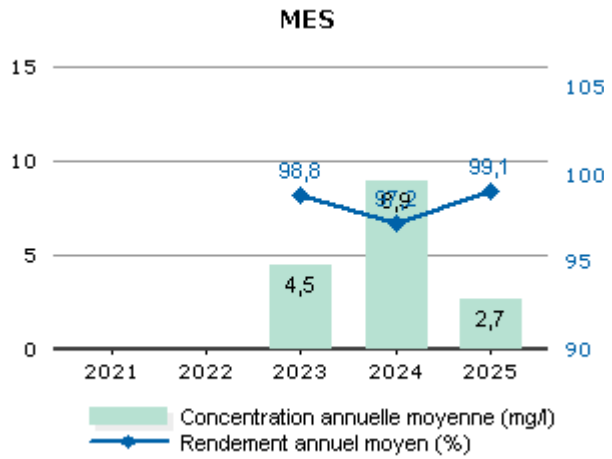

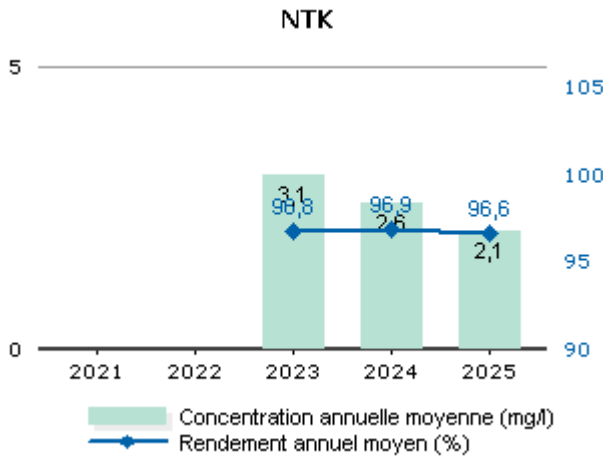

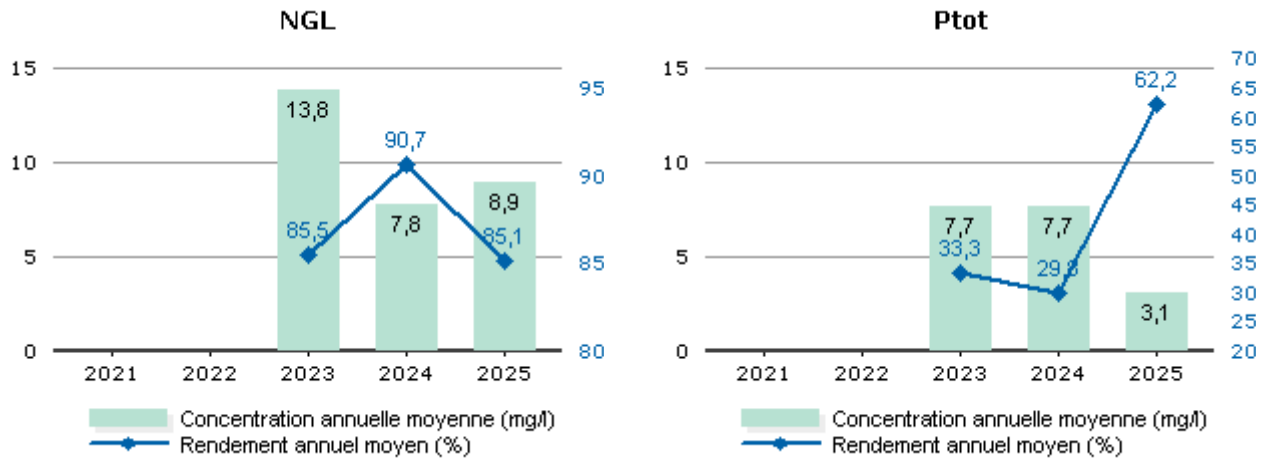

Les valeurs moyennes observées en sortie du système de traitement (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la prescription qui est à présent à calculer en considérant les débits à hauteur du débit de référence. L'évaluation du taux de respect fait l'objet de l'indicateur de conformité locale présenté dans la suite de la présente section.

Conformité de la performance

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations, …). La conformité locale est définie au regard des prescriptions de l'arrêté préfectoral.

	2021	2022	2023	2024	2025
Conformité à l'arrêté préfectoral			100,00	100,00	100,00

A partir de 2019, cette conformité est évaluée suivant les nouvelles règles de calcul que celles des outils du Ministère (prise en compte des débits à hauteur du débit de référence en entrée et sortie, prise en compte du débit entrant en station pour définir si la station est en ou hors condition normale de fonctionnement, prise en compte du débit de référence mentionné dans l'acte administratif (arrêté préfectoral local). Cette évaluation reste fournie à titre indicatif. Seule l'évaluation transmise par le Service de Police de l'Eau en mars a une valeur officielle.

Qualité du traitement des boues

Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration

Cet indicateur permet d'évaluer l'efficacité de dépollution des usines (extraction et concentration de la pollution de l'effluent traité). Il s'exprime en tonnage de matières sèches.

	2021	2022	2023	2024	2025
Boues évacuées (Tonnes de MS) (S6)			11,6	9,5	10,6

Boues évacuées par destination et proportion évacuée selon une filière conforme

Ce tableau présente la proportion de boues évacuées selon une filière conforme.

	2021	2022	2023	2024	2025
Taux de boues évacuées selon une filière conforme (%)			100,0	100,0	100,0

Destination des boues évacuées

Ce tableau présente le détail pour l'année des destinations des boues évacuées.

	Produit brut (t)	Siccité (%)	Matières sèches (t)	Destination conforme (%) *
Valorisation agricole	360	2,19	7,9	100,00
Station d'épuration	80,4	3,23	2,6	100,00
Total	**440,4**	**2,38**	**10,5**	**100,00**

* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches.

Sous-produits évacués par destination

Ce tableau présente les sous-produits générés et leur devenir.

	2021	2022	2023	2024	2025
Centre de stockage de déchets (t) Refus			0,6		
Incinération (t) Refus				1,7	1,0
Total (t)			0,6	1,7	1,0

STEP SAINT MAURICE ECHELOTTE

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le tableau qui suit. Il s'agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté préfectoral d'autorisation, ou à défaut manuel d'autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de conformité


	2025
Débit de référence (m3/j)	8
Capacité nominale (kg/j)	3


Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*)

	DCO	DBO5	MES	NTK	NGL	NH4	Ptot
Concentration maximale à respecter (mg/L) (*)							
moyenne journalière par bilan	200,00	35,00					
Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L)							
moyenne journalière par bilan	400,00	70,00	85,00				
Charge maximale à respecter (kg/j)							
Rendement minimum moyen (%)							
moyen journalier par bilan	60,00	60,00	50,00				

* : En général, pour les paramètres NTK, NGL et Ptot, les conformités se jugent en moyennes annuelles, et pour les autres paramètres en moyennes journalières par bilan, cela sous réserve d'absence d'indications complémentaires d'arrêtés préfectoraux locaux.

File Eau

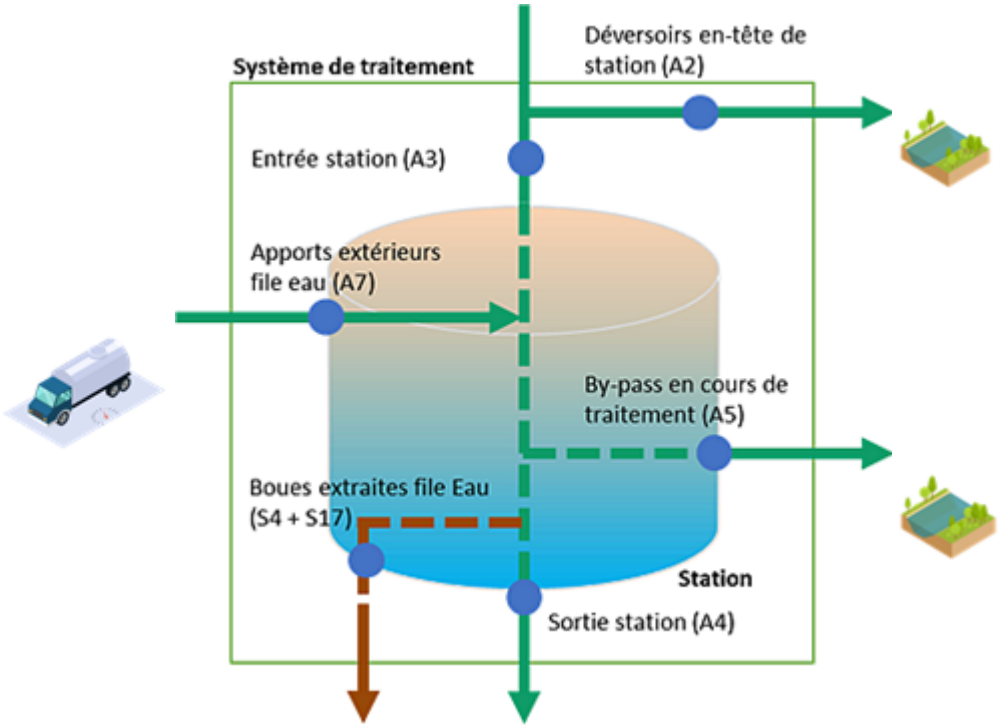

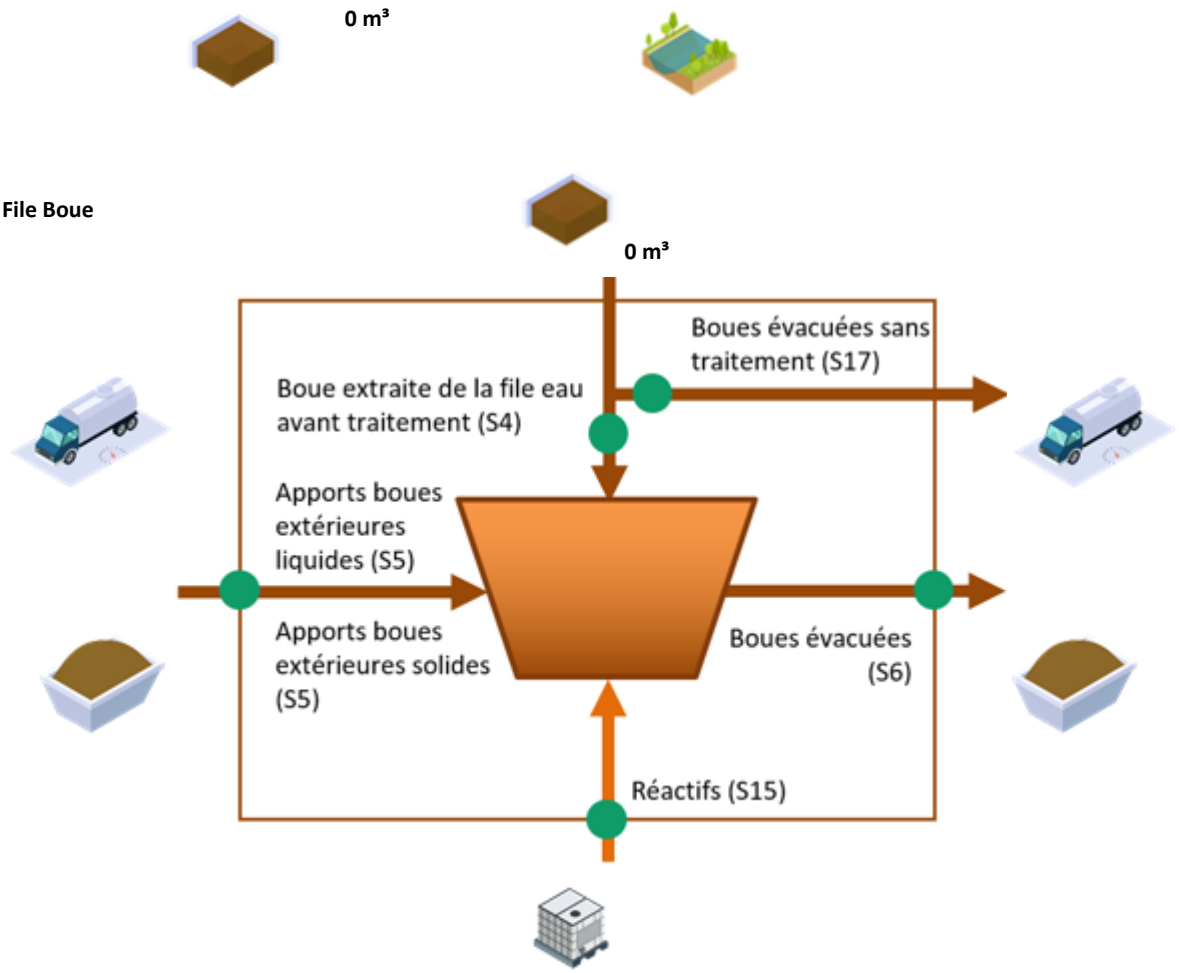

Concentrations en sortie et rendements épuratoires
Conformité de la performance

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations, …). La conformité locale est définie au regard des prescriptions de l'arrêté préfectoral.

A partir de 2019, cette conformité est évaluée suivant les nouvelles règles de calcul que celles des outils du Ministère (prise en compte des débits à hauteur du débit de référence en entrée et sortie, prise en compte du débit entrant en station pour définir si la station est en ou hors condition normale de fonctionnement, prise en compte du débit de référence mentionné dans l'acte administratif (arrêté préfectoral local). Cette évaluation reste fournie à titre indicatif. Seule l'évaluation transmise par le Service de Police de l'Eau en mars a une valeur officielle.

STEP SAINTE MARIE

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le tableau qui suit. Il s'agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté préfectoral d'autorisation, ou à défaut manuel d'autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de conformité


	2025
Débit de référence (m3/j)	234
Capacité nominale (kg/j)	78


Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*)

	DCO	DBO5	MES	NTK	NGL	NH4	Ptot
Concentration maximale à respecter (mg/L) (*)							
moyenne journalière par bilan		35,00					
Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L)							
moyenne journalière par bilan		70,00					
Charge maximale à respecter (kg/j)							
Rendement minimum moyen (%)							
moyen journalier par bilan	60,00	60,00					

* : En général, pour les paramètres NTK, NGL et Ptot, les conformités se jugent en moyennes annuelles, et pour les autres paramètres en moyennes journalières par bilan, cela sous réserve d'absence d'indications complémentaires d'arrêtés préfectoraux locaux.

File Eau

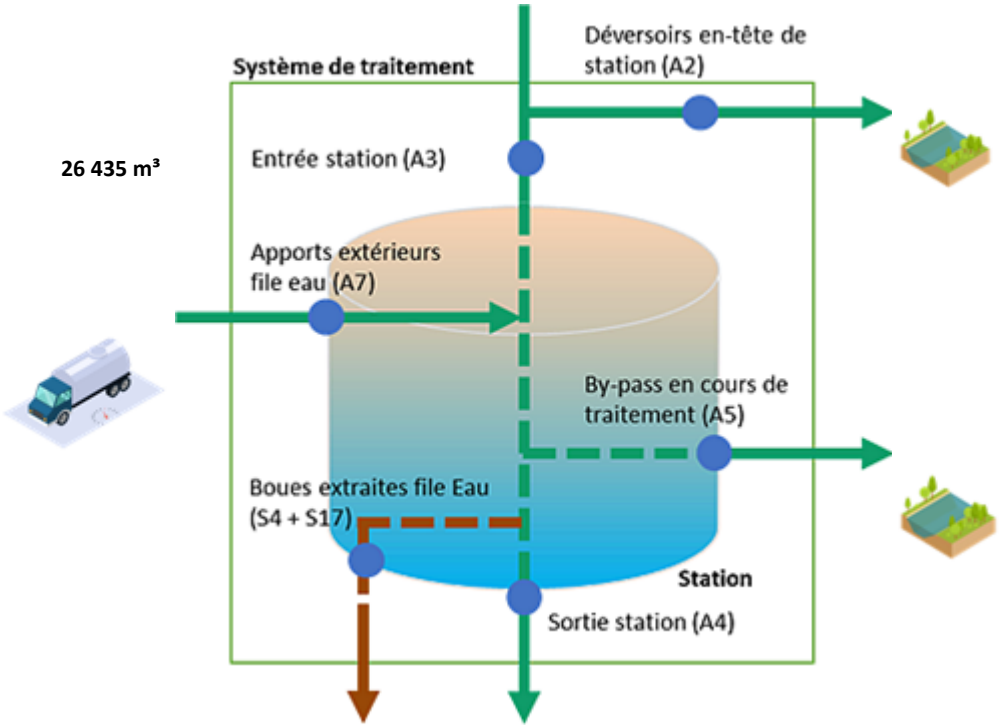

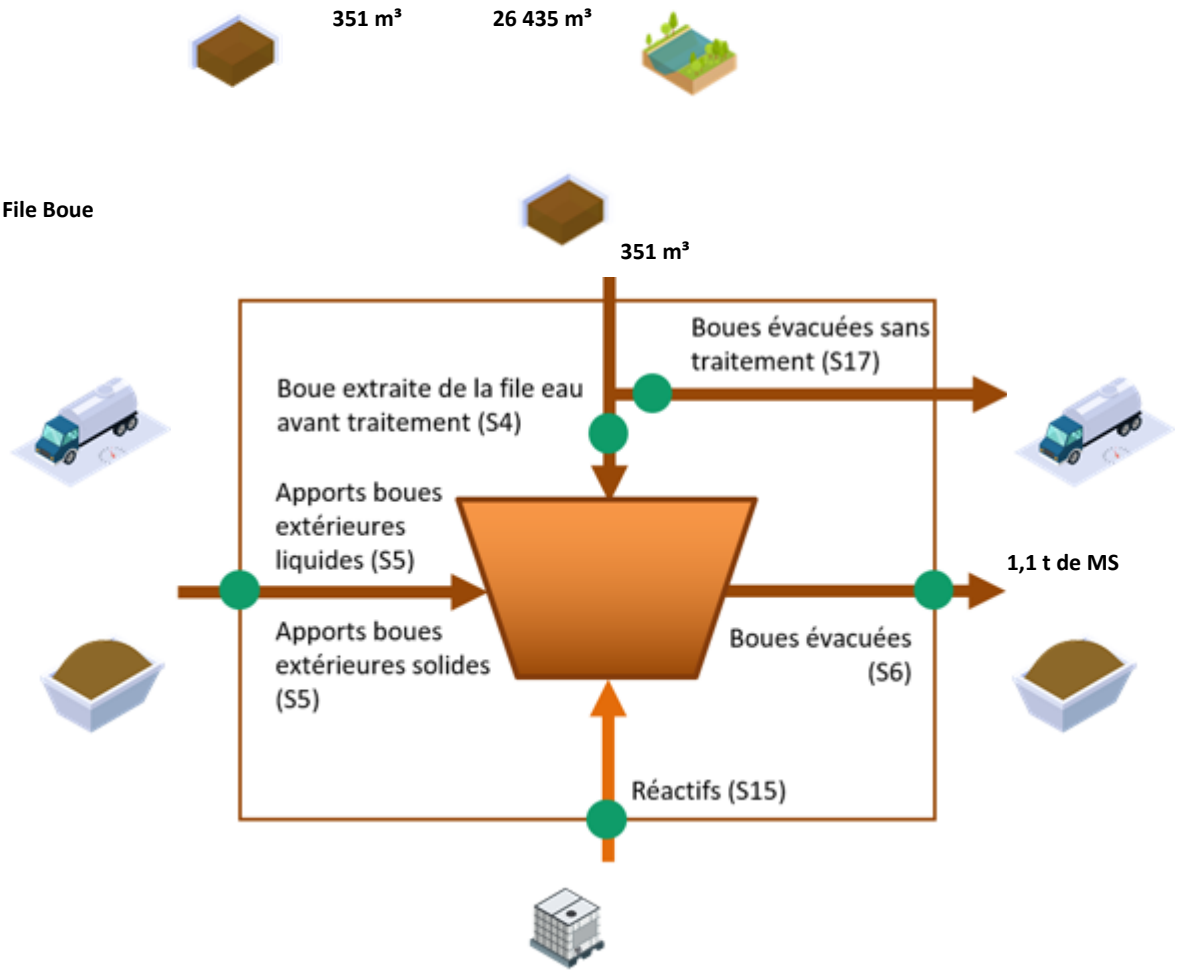

La production de boues reste faible. La station recoit les effluents en gravitaire et est sujette aux départs de boues lors de pluies importantes.


Fréquences d'analyses


Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre.


	2025
DCO	2
DBO5	2
MES	2
NTK	2
NGL	2
Ptot	2


Concentrations en sortie et rendements épuratoires


Les graphiques suivants présentent la qualité d'eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les rendements épuratoires obtenus :

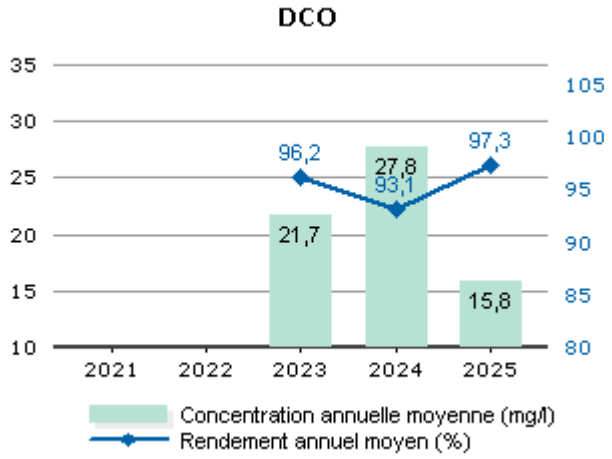


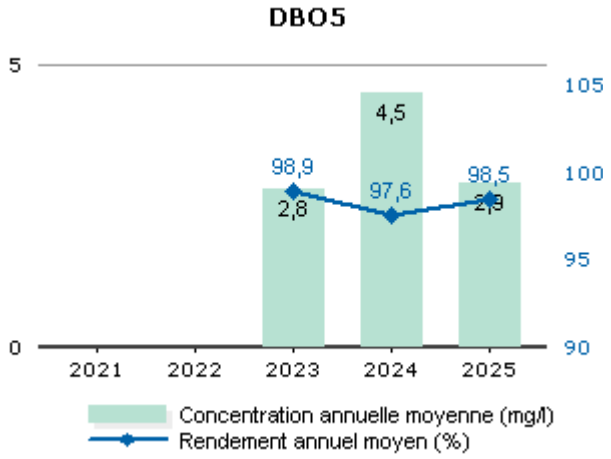

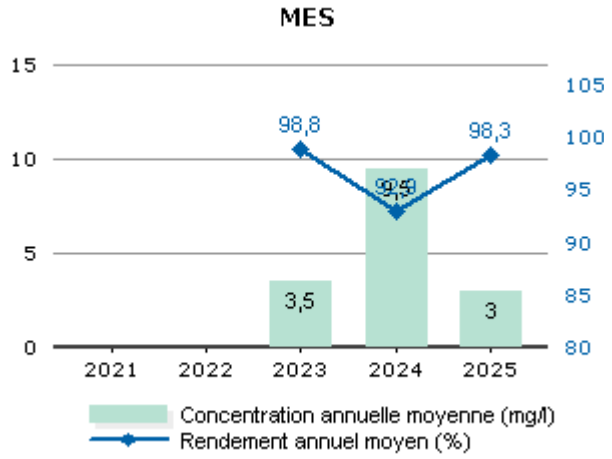

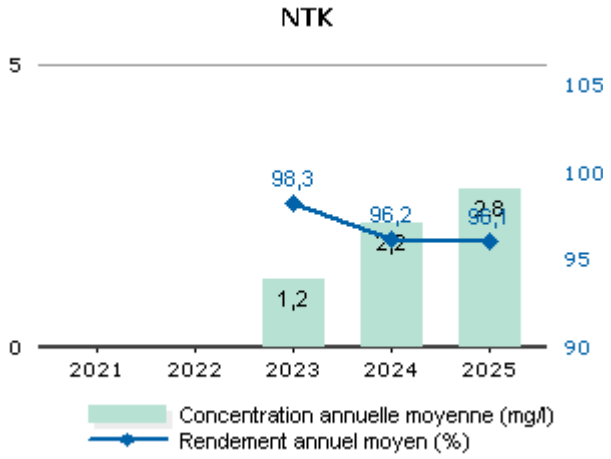

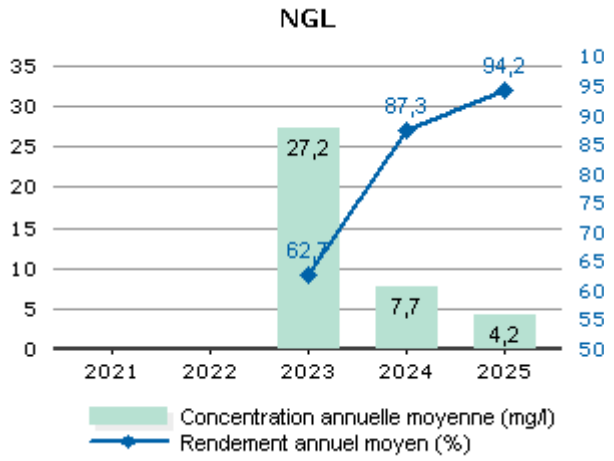

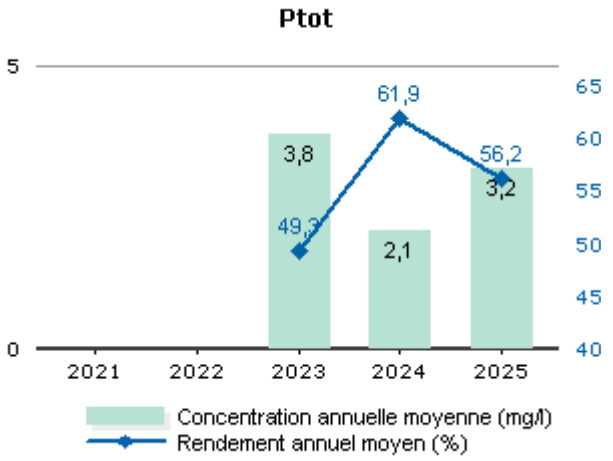

Les valeurs moyennes observées en sortie du système de traitement (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la prescription qui est à présent à calculer en considérant les débits à hauteur du débit de référence. L'évaluation du taux de respect fait l'objet de l'indicateur de conformité locale présenté dans la suite de la présente section.

Conformité de la performance

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations, …). La conformité locale est définie au regard des prescriptions de l'arrêté préfectoral.

	2021	2022	2023	2024	2025
Conformité à l'arrêté préfectoral			100,00	100,00	100,00

A partir de 2019, cette conformité est évaluée suivant les nouvelles règles de calcul que celles des outils du Ministère (prise en compte des débits à hauteur du débit de référence en entrée et sortie, prise en compte du débit entrant en station pour définir si la station est en ou hors condition normale de fonctionnement, prise en compte du débit de référence mentionné dans l'acte administratif (arrêté préfectoral local). Cette évaluation reste fournie à titre indicatif. Seule l'évaluation transmise par le Service de Police de l'Eau en mars a une valeur officielle.

Qualité du traitement des boues

Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration

Cet indicateur permet d'évaluer l'efficacité de dépollution des usines (extraction et concentration de la pollution de l'effluent traité). Il s'exprime en tonnage de matières sèches.

	2021	2022	2023	2024	2025
Boues évacuées (Tonnes de MS) (S6)			0,0	2,2	1,1

Boues évacuées par destination et proportion évacuée selon une filière conforme

Ce tableau présente la proportion de boues évacuées selon une filière conforme.

	2021	2022	2023	2024	2025
Taux de boues évacuées selon une filière conforme (%)				100,0	100,0

Destination des boues évacuées

Ce tableau présente le détail pour l'année des destinations des boues évacuées.

	Produit brut (t)	Siccité (%)	Matières sèches (t)	Destination conforme (%) *
Station d'épuration	42,3	2,60	1,1	100,00
Total	**42,3**	**2,60**	**1,1**	**100,00**

* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches.

Sous-produits évacués par destination

Ce tableau présente les sous-produits générés et leur devenir.

	2021	2022	2023	2024	2025
Centre de stockage de déchets (t) Refus			0,3		
Total (t)			0,3		

STEP VILLARS LES BLAMONT Rhizo

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le tableau qui suit. Il s'agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté préfectoral d'autorisation, ou à défaut manuel d'autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de conformité


	2025
Débit de référence (m3/j)	83
Capacité nominale (kg/j)	33


Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*)

	DCO	DBO5	MES	NTK	NGL	NH4	Ptot
Concentration maximale à respecter (mg/L) (*)							
moyenne journalière par bilan	100,00	25,00	35,00	18,00			11,50
Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L)							
moyenne journalière par bilan	400,00	70,00	85,00				
Charge maximale à respecter (kg/j)							
Rendement minimum moyen (%)							
moyen journalier par bilan	80,00	90,00	90,00	70,00			40,00


* : En général, pour les paramètres NTK, NGL et Ptot, les conformités se jugent en moyennes annuelles, et pour les autres paramètres en moyennes journalières par bilan, cela sous réserve d'absence d'indications complémentaires d'arrêtés préfectoraux locaux.

File Eau

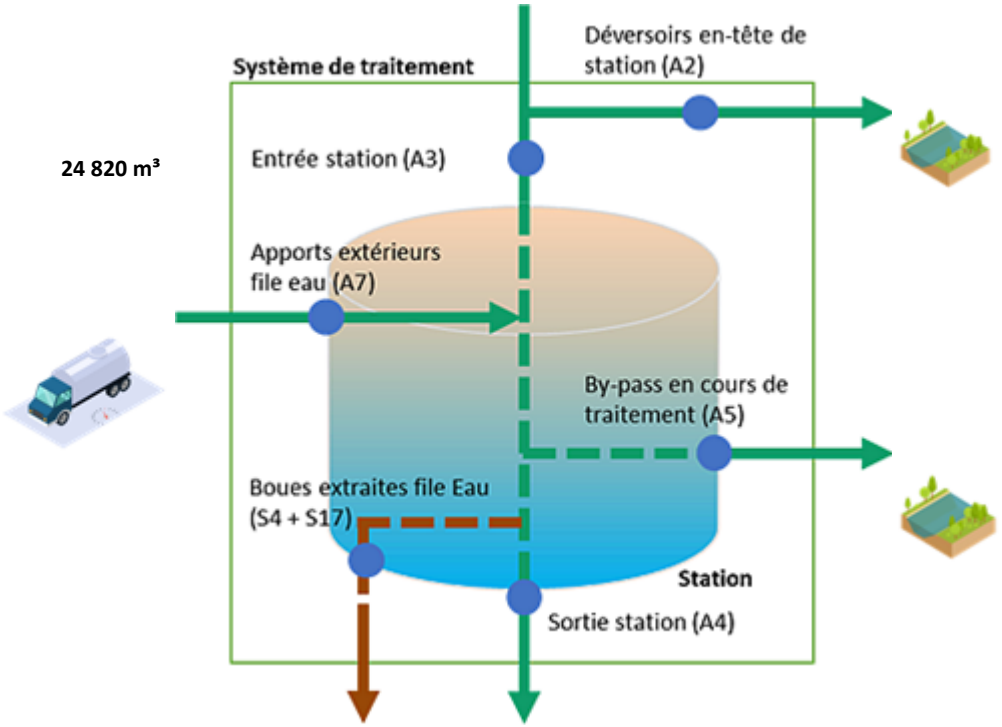


0 m³
24 820 m³

File Boue

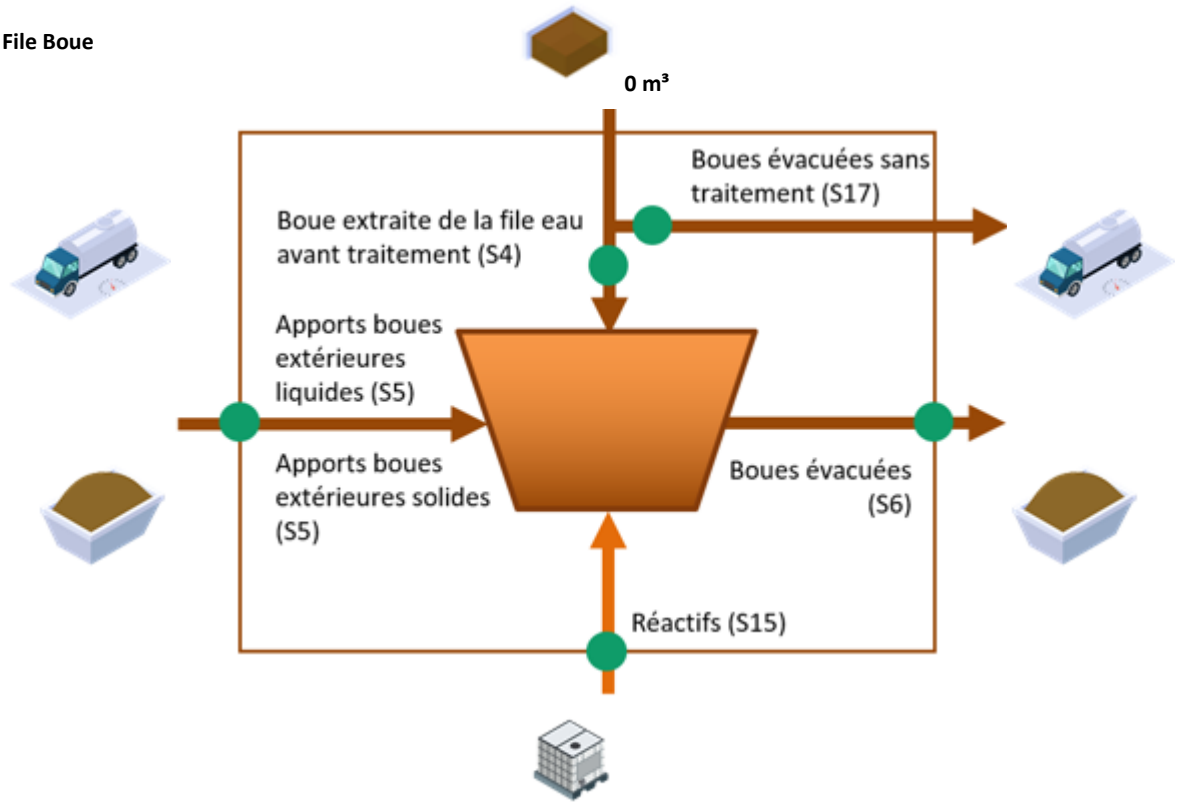
0 m³
Boues évacuées sans traitement (S17)
Boue extraite de la file eau avant traitement (S4)
Apports boues extérieures liquides (S5)
Apports boues extérieures solides (S5)
Boues évacuées (S6)
Réactifs (S15)


Fréquences d'analyses


Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre.


	2025
DCO	1
DBO5	1
MES	1
NTK	1
NGL	1
Ptot	1


Concentrations en sortie et rendements épuratoires


Les graphiques suivants présentent la qualité d'eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les rendements épuratoires obtenus :

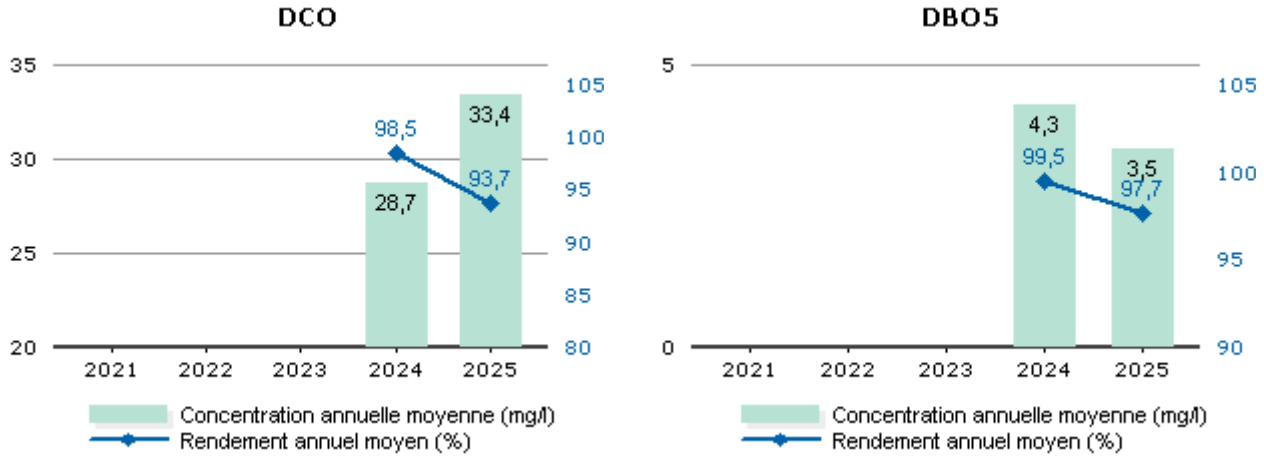

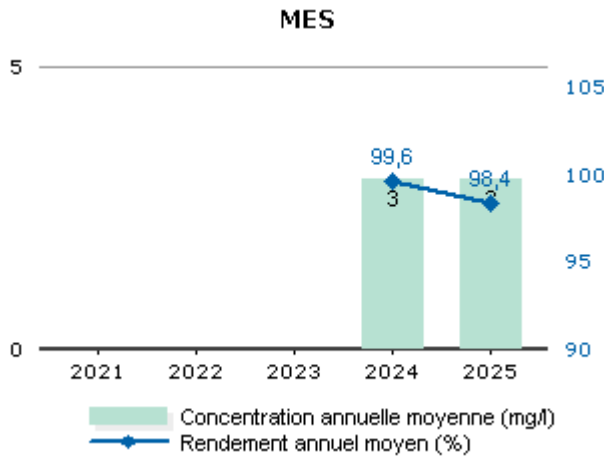

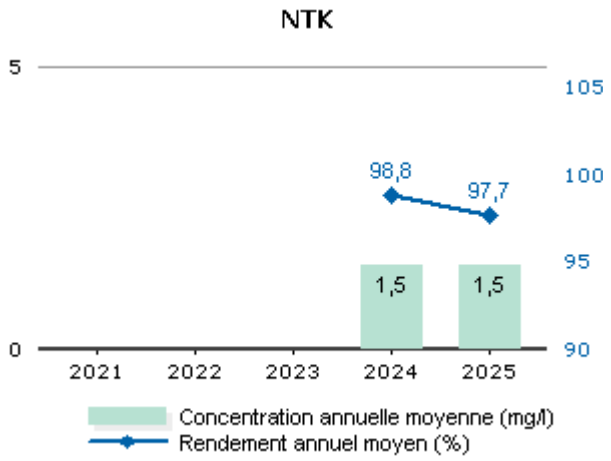

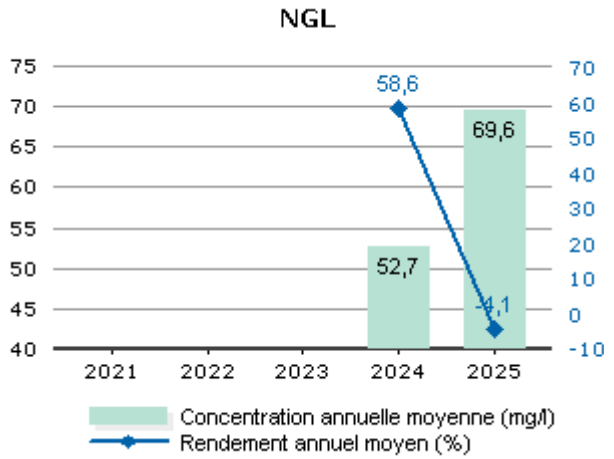

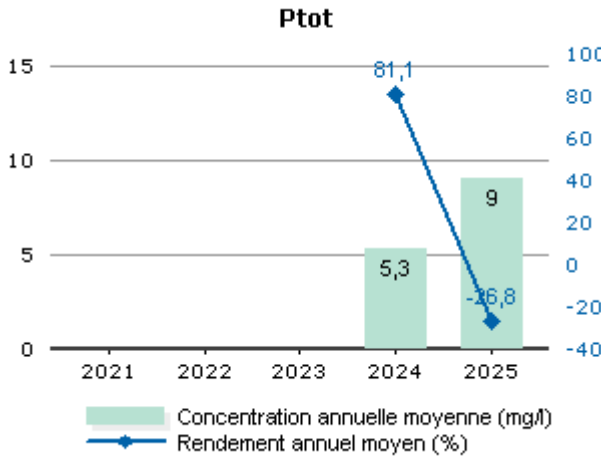

Les 2 paramètres en concentrations NGL et Ptot sont plus élevés en sortie qu'en entrée . Pour le NGL nous pensons à un relargage de nitrate en sortie 68mg/l . C'est dû à l'absence de dénitrification à cause du faible temps de séjour de l'effluent dans les lits de roseaux.

Les valeurs moyennes observées en sortie du système de traitement (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la prescription qui est à présent à calculer en considérant les débits à hauteur du débit de référence. L'évaluation du taux de respect fait l'objet de l'indicateur de conformité locale présenté dans la suite de la présente section.

Conformité de la performance

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations, …). La conformité locale est définie au regard des prescriptions de l'arrêté préfectoral.

	2021	2022	2023	2024	2025
Conformité à l'arrêté préfectoral				100,00	100,00

A partir de 2019, cette conformité est évaluée suivant les nouvelles règles de calcul que celles des outils du Ministère (prise en compte des débits à hauteur du débit de référence en entrée et sortie, prise en compte du débit entrant en station pour définir si la station est en ou hors condition normale de fonctionnement, prise en compte du débit de référence mentionné dans l'acte administratif (arrêté préfectoral local). Cette évaluation reste fournie à titre indicatif. Seule l'évaluation transmise par le Service de Police de l'Eau en mars a une valeur officielle.

Qualité du traitement des boues

Destination des boues évacuées

Ce tableau présente le détail pour l'année des destinations des boues évacuées.

	Produit brut (t)	Siccité (%)	Matières sèches (t)	Destination conforme (%) *
Total				

* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches.

PMA - SECTEUR PMA29 ASS

UDEP ARBOUANS

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le tableau qui suit. Il s'agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté préfectoral d'autorisation, ou à défaut manuel d'autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de conformité


	2025
Débit de référence (m3/j)	26 888
Capacité nominale (kg/j)	4 300


Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*)

	DCO	DBO5	MES	NTK	NGL	NH4	Ptot
Concentration maximale à respecter (mg/L) (*)							
moyenne journalière par bilan	90,00	25,00	30,00				
moyenne annuelle					15,00		2,00
Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L)							
moyenne journalière par bilan	250,00	50,00	85,00				
Charge maximale à respecter (kg/j)							
journalière par bilan	2 520,00	700,00	840,00				
moyenne annuelle					420,00		56,00
Rendement minimum moyen (%)							
moyen journalier par bilan	75,00	80,00	90,00				
moyen annuel					70,00		80,00

* : En général, pour les paramètres NTK, NGL et Ptot, les conformités se jugent en moyennes annuelles, et pour les autres paramètres en moyennes journalières par bilan, cela sous réserve d'absence d'indications complémentaires d'arrêtés préfectoraux locaux.

File Eau

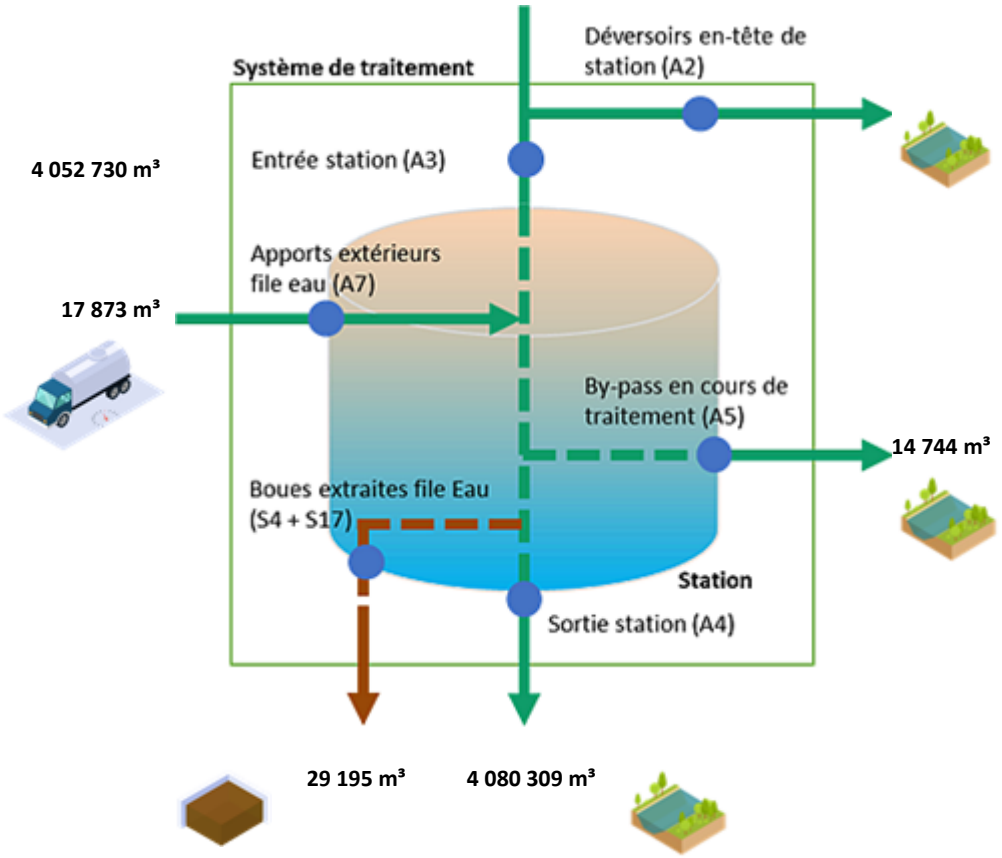
Système de traitement
Déversoirs en-tête de station (A2)
4 052 730 m³
Entrée station (A3)
Apports extérieurs file eau (A7)
17 873 m³
By-pass en cours de traitement (A5)
14 744 m³
Boues extraites file Eau (S4 + S17)
Station
Sortie station (A4)
29 195 m³
4 080 309 m³

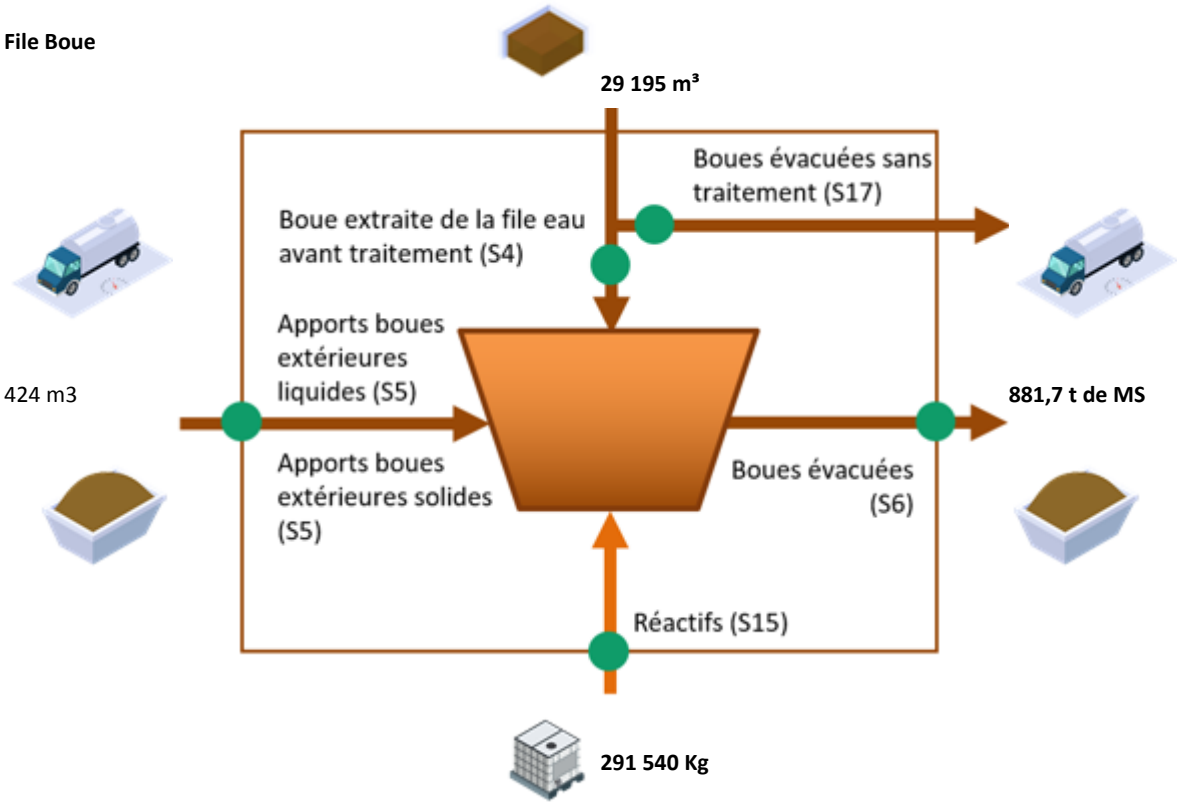
File Boue
29 195 m³
Boues évacuées sans traitement (S17)
Boue extraite de la file eau avant traitement (S4)
Apports boues extérieures liquides (S5)
424 m3
881,7 t de MS
Apports boues extérieures solides (S5)
Boues évacuées (S6)
Réactifs (S15)
291 540 Kg


Fréquences d'analyses


Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre.


	2025
DCO	105
DBO5	105
MES	105
NTK	52
NGL	52
Ptot	52


Concentrations en sortie et rendements épuratoires

Les graphiques suivants présentent la qualité d'eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les rendements épuratoires obtenus :

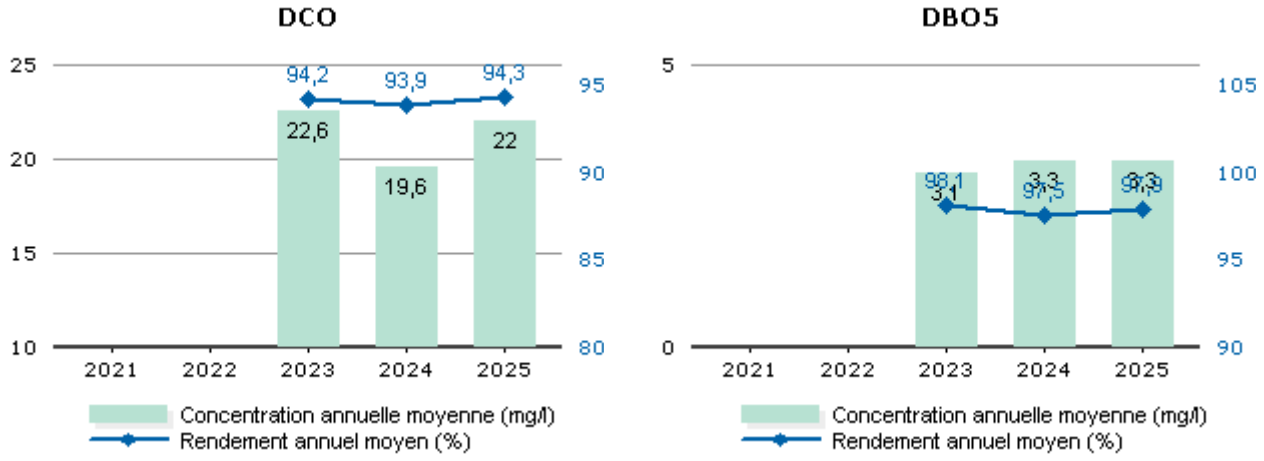

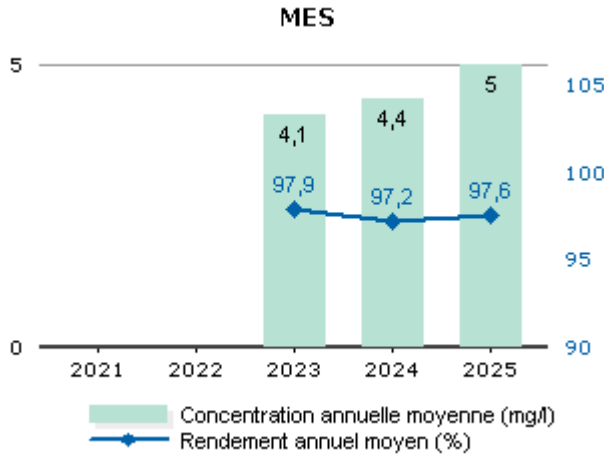

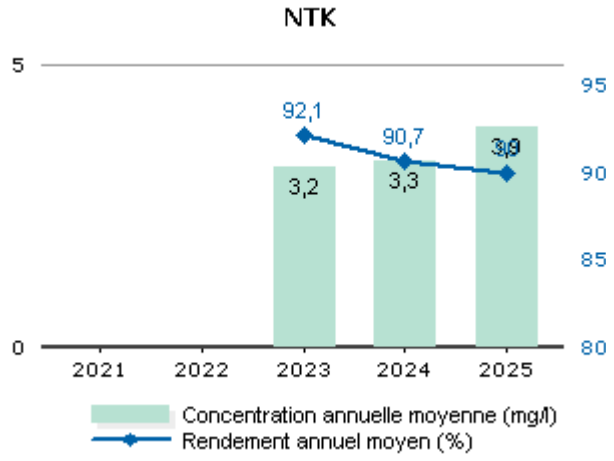

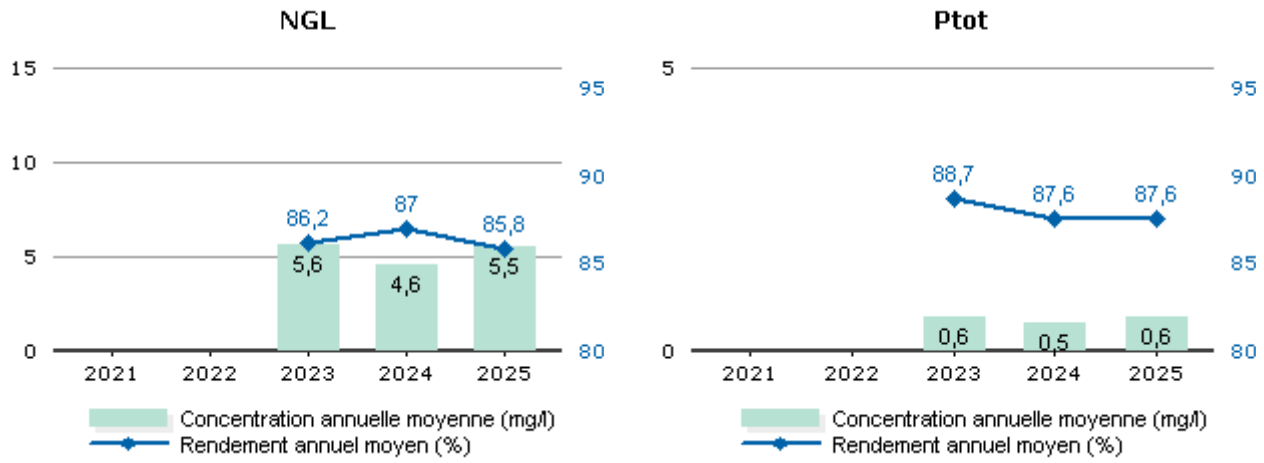

Les valeurs moyennes observées en sortie du système de traitement (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la prescription qui est à présent à calculer en considérant les débits à hauteur du débit de référence. L'évaluation du taux de respect fait l'objet de l'indicateur de conformité locale présenté dans la suite de la présente section.

Conformité de la performance

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations, …). La conformité locale est définie au regard des prescriptions de l'arrêté préfectoral.

	2021	2022	2023	2024	2025
Conformité à l'arrêté préfectoral			100,00	100,00	100,00

A partir de 2019, cette conformité est évaluée suivant les nouvelles règles de calcul que celles des outils du Ministère (prise en compte des débits à hauteur du débit de référence en entrée et sortie, prise en compte du débit entrant en station pour définir si la station est en ou hors condition normale de fonctionnement, prise en compte du débit de référence mentionné dans l'acte administratif (arrêté préfectoral local). Cette évaluation reste fournie à titre indicatif. Seule l'évaluation transmise par le Service de Police de l'Eau en mars a une valeur officielle.

Qualité du traitement des boues

Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration

Cet indicateur permet d'évaluer l'efficacité de dépollution des usines (extraction et concentration de la pollution de l'effluent traité). Il s'exprime en tonnage de matières sèches.

	2021	2022	2023	2024	2025
Boues évacuées (Tonnes de MS) (S6)			1 056,9	1 039,2	881,7

Boues évacuées par destination et proportion évacuée selon une filière conforme

Ce tableau présente la proportion de boues évacuées selon une filière conforme.

	2021	2022	2023	2024	2025
Taux de boues évacuées selon une filière conforme (%)			100,0	100,0	100,0

Destination des boues évacuées

Ce tableau présente le détail pour l'année des destinations des boues évacuées.

	Produit brut (t)	Siccité (%)	Matières sèches (t)	Destination conforme (%) *
Valorisation agricole	2345,4	27,70	649,7	100,00
Compostage norme NF	840,8	27,60	232,1	100,00
Total	**3186,2**	**27,68**	**881,8**	**100,00**

* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches.

Sous-produits évacués par destination

Ce tableau présente les sous-produits générés et leur devenir.

	2021	2022	2023	2024	2025
Incinération (t) Refus			19,2	18,7	19,9
Total (t)			19,2	18,7	19,9
Autre STEP (t) Sables			75,8	83,3	87,5
Total (t)			75,8	83,3	87,5
Incinération (m^3) Graisses			15,9	15,7	17,0
Total (m^3)			15,9	15,7	17,0

UDEP BAVANS

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le tableau qui suit. Il s'agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté préfectoral d'autorisation, ou à défaut manuel d'autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de conformité


	2025
Débit de référence (m3/j)	12 893
Capacité nominale (kg/j)	1 187


Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*)

	DCO	DBO5	MES	NTK	NGL	NH4	Ptot
Concentration maximale à respecter (mg/L) (*)							
moyenne journalière par bilan	90,00	20,00	30,00				
moyenne annuelle					15,00		2,00
Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L)							
moyenne journalière par bilan	180,00	40,00	60,00				
Charge maximale à respecter (kg/j)							
journalière par bilan	1 166,00	259,00	389,00				
moyenne annuelle					114,00		26,00
Rendement minimum moyen (%)							
moyen journalier par bilan	75,00	85,00	90,00				
moyen annuel					70,00		80,00

* : En général, pour les paramètres NTK, NGL et Ptot, les conformités se jugent en moyennes annuelles, et pour les autres paramètres en moyennes journalières par bilan, cela sous réserve d'absence d'indications complémentaires d'arrêtés préfectoraux locaux.

File Eau

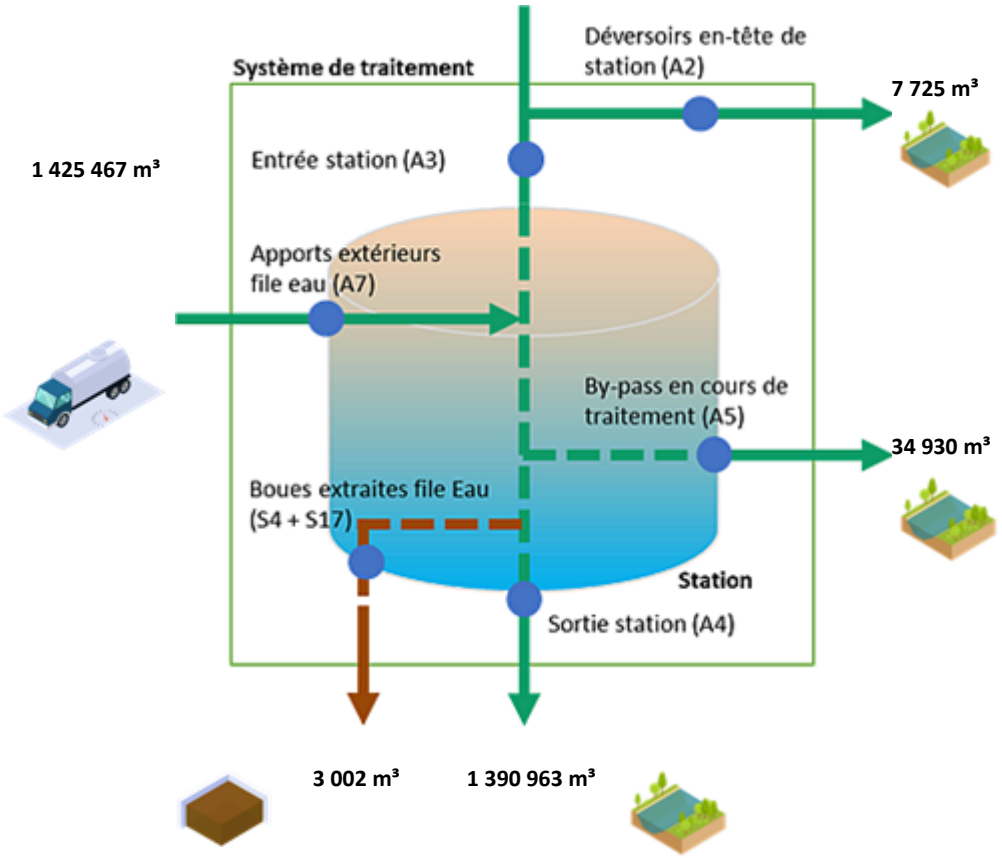
Système de traitement
Déversoirs en-tête de station (A2)
7 725 m³
1 425 467 m³
Entrée station (A3)
Apports extérieurs file eau (A7)
By-pass en cours de traitement (A5)
34 930 m³
Boues extraites file Eau (S4 + S17)
Station
Sortie station (A4)
3 002 m³
1 390 963 m³

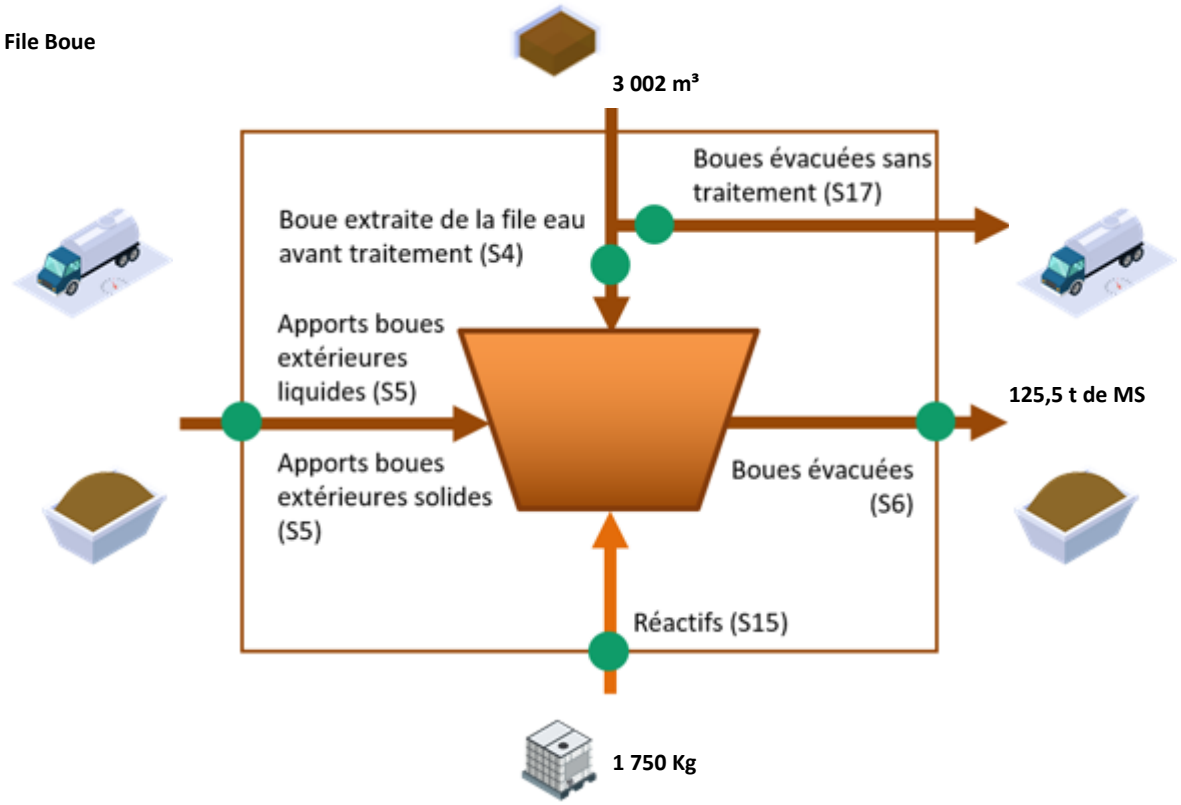
File Boue
3 002 m³
Boues évacuées sans traitement (S17)
Boue extraite de la file eau avant traitement (S4)
Apports boues extérieures liquides (S5)
125,5 t de MS
Apports boues extérieures solides (S5)
Boues évacuées (S6)
Réactifs (S15)
1 750 Kg


Fréquences d'analyses


Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre.


	2025
DCO	24
DBO5	24
MES	24
NTK	24
NGL	12
Ptot	24


Concentrations en sortie et rendements épuratoires

Les graphiques suivants présentent la qualité d'eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les rendements épuratoires obtenus :

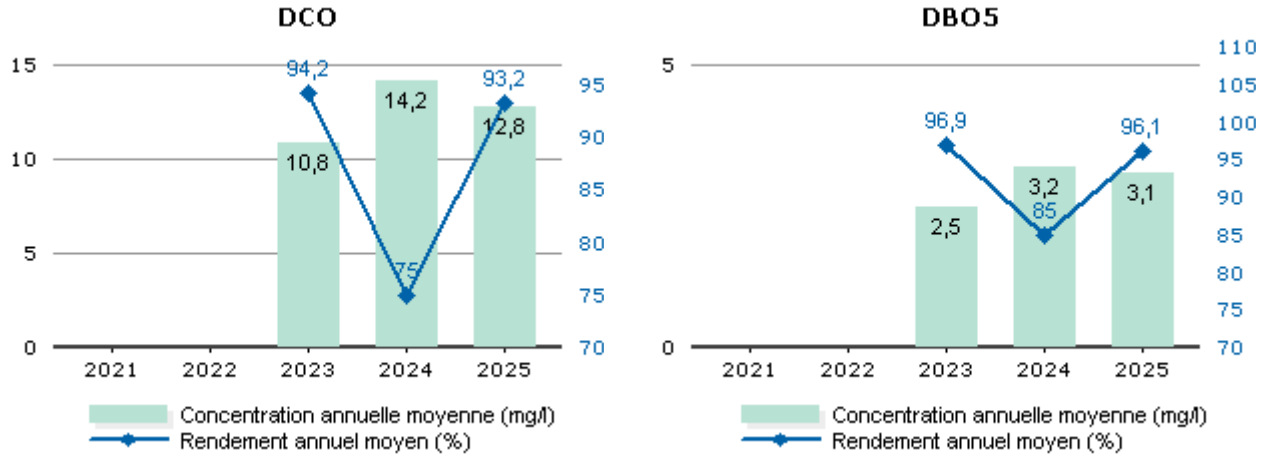

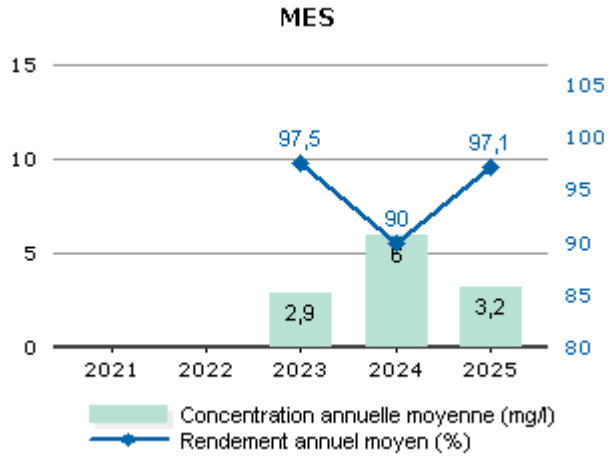

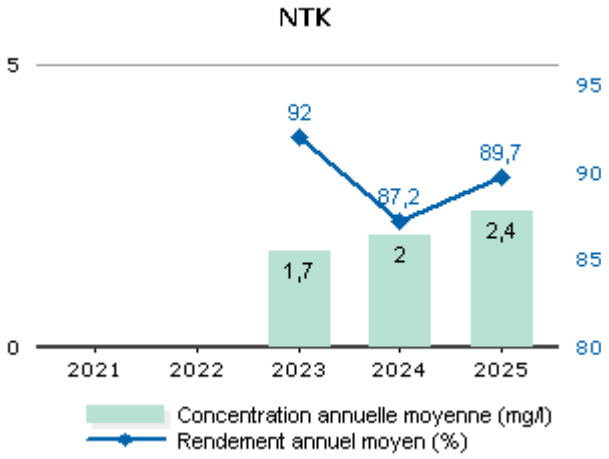

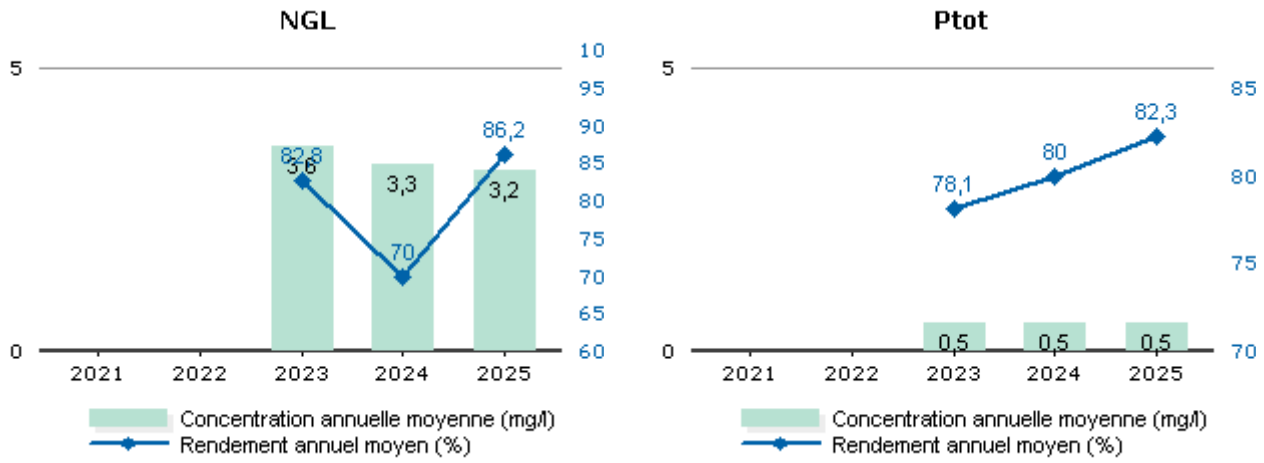

Les valeurs moyennes observées en sortie du système de traitement (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la prescription qui est à présent à calculer en considérant les débits à hauteur du débit de référence. L'évaluation du taux de respect fait l'objet de l'indicateur de conformité locale présenté dans la suite de la présente section.

Conformité de la performance

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations, …). La conformité locale est définie au regard des prescriptions de l'arrêté préfectoral.

	2021	2022	2023	2024	2025
Conformité à l'arrêté préfectoral			100,00	100,00	100,00

A partir de 2019, cette conformité est évaluée suivant les nouvelles règles de calcul que celles des outils du Ministère (prise en compte des débits à hauteur du débit de référence en entrée et sortie, prise en compte du débit entrant en station pour définir si la station est en ou hors condition normale de fonctionnement, prise en compte du débit de référence mentionné dans l'acte administratif (arrêté préfectoral local). Cette évaluation reste fournie à titre indicatif. Seule l'évaluation transmise par le Service de Police de l'Eau en mars a une valeur officielle.

Qualité du traitement des boues

Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration

Cet indicateur permet d'évaluer l'efficacité de dépollution des usines (extraction et concentration de la pollution de l'effluent traité). Il s'exprime en tonnage de matières sèches.

	2021	2022	2023	2024	2025
Boues évacuées (Tonnes de MS) (S6)			122,0	114,6	125,5

Boues évacuées par destination et proportion évacuée selon une filière conforme

Ce tableau présente la proportion de boues évacuées selon une filière conforme.

	2021	2022	2023	2024	2025
Taux de boues évacuées selon une filière conforme (%)			100,0	100,0	100,0

Destination des boues évacuées

Ce tableau présente le détail pour l'année des destinations des boues évacuées.

	Produit brut (t)	Siccité (%)	Matières sèches (t)	Destination conforme (%) *
Station d'épuration			125,5	100,00
Total			**125,5**	**100,00**

* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches.

Sous-produits évacués par destination

Ce tableau présente les sous-produits générés et leur devenir.

	2021	2022	2023	2024	2025
Incinération (t) Refus			1,5	3,8	3,8
Total (t)			1,5	3,8	3,8
Autre STEP (t) Sables			3,0	1,9	1,9
Total (t)			3,0	1,9	1,9

UDEP SAINTE SUZANNE

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le tableau qui suit. Il s'agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté préfectoral d'autorisation, ou à défaut manuel d'autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de conformité


	2025
Débit de référence (m3/j)	30 580
Capacité nominale (kg/j)	3 500


Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*)

	DCO	DBO5	MES	NTK	NGL	NH4	Ptot
Concentration maximale à respecter (mg/L) (*)							
moyenne journalière par bilan	90,00	25,00	30,00				
moyenne annuelle				10,00	15,00		2,00
Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L)							
moyenne journalière par bilan	250,00	50,00	85,00				
Charge maximale à respecter (kg/j)							
journalière par bilan	1 800,00	600,00	600,00				
moyenne annuelle				200,00			42,00
Rendement minimum moyen (%)							
moyen annuel					70,00		

* : En général, pour les paramètres NTK, NGL et Ptot, les conformités se jugent en moyennes annuelles, et pour les autres paramètres en moyennes journalières par bilan, cela sous réserve d'absence d'indications complémentaires d'arrêtés préfectoraux locaux.

File Eau

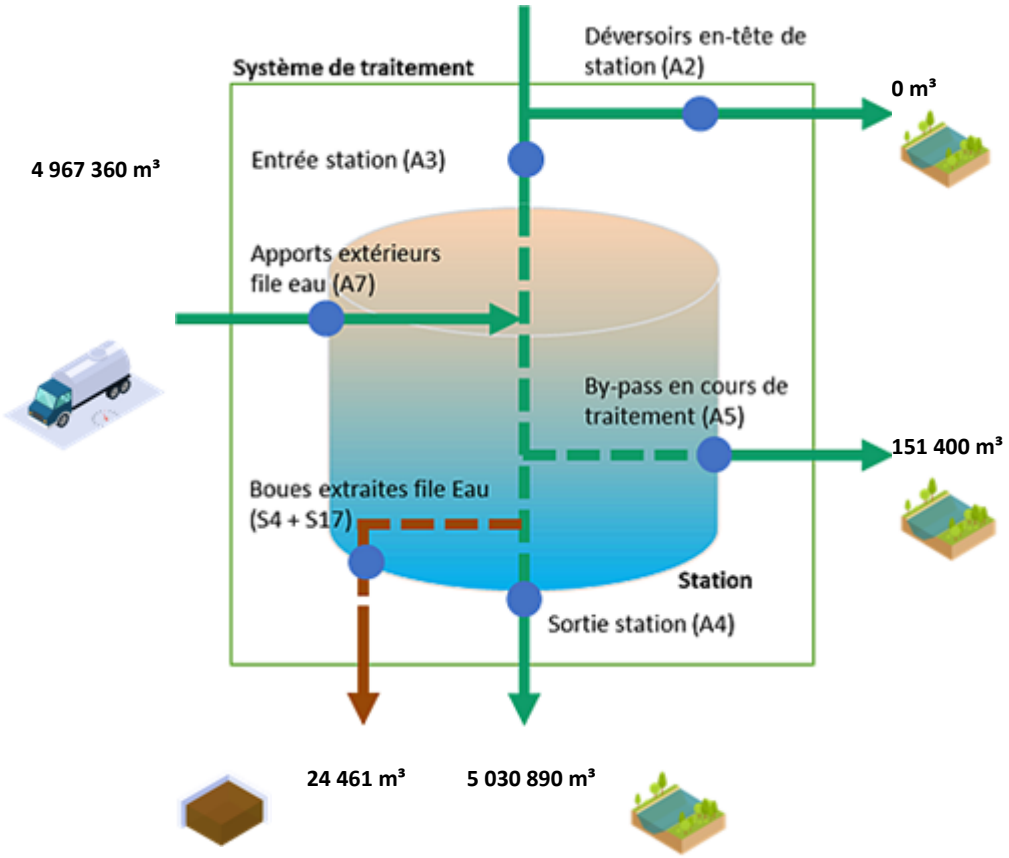
Système de traitement
Déversoirs en-tête de station (A2)
0 m³
4 967 360 m³
Entrée station (A3)
Apports extérieurs file eau (A7)
By-pass en cours de traitement (A5)
151 400 m³
Boues extraites file Eau (S4 + S17)
Station
Sortie station (A4)
24 461 m³
5 030 890 m³

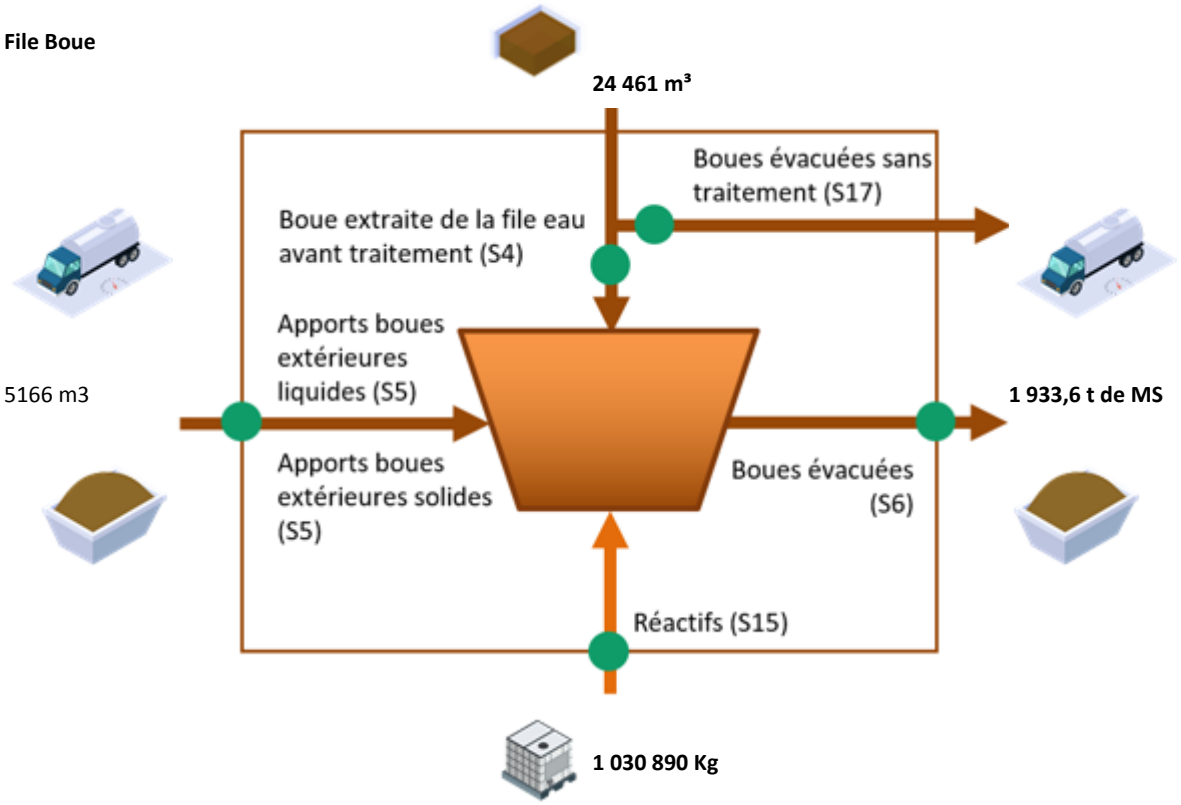
File Boue
24 461 m³
Boues évacuées sans traitement (S17)
Boue extraite de la file eau avant traitement (S4)
Apports boues extérieures liquides (S5)
5166 m3
1 933,6 t de MS
Apports boues extérieures solides (S5)
Boues évacuées (S6)
Réactifs (S15)
1 030 890 Kg


Fréquences d'analyses


Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre.


	2025
DCO	105
DBO5	105
MES	105
NTK	105
NGL	53
Ptot	105


Concentrations en sortie et rendements épuratoires

Les graphiques suivants présentent la qualité d'eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les rendements épuratoires obtenus :

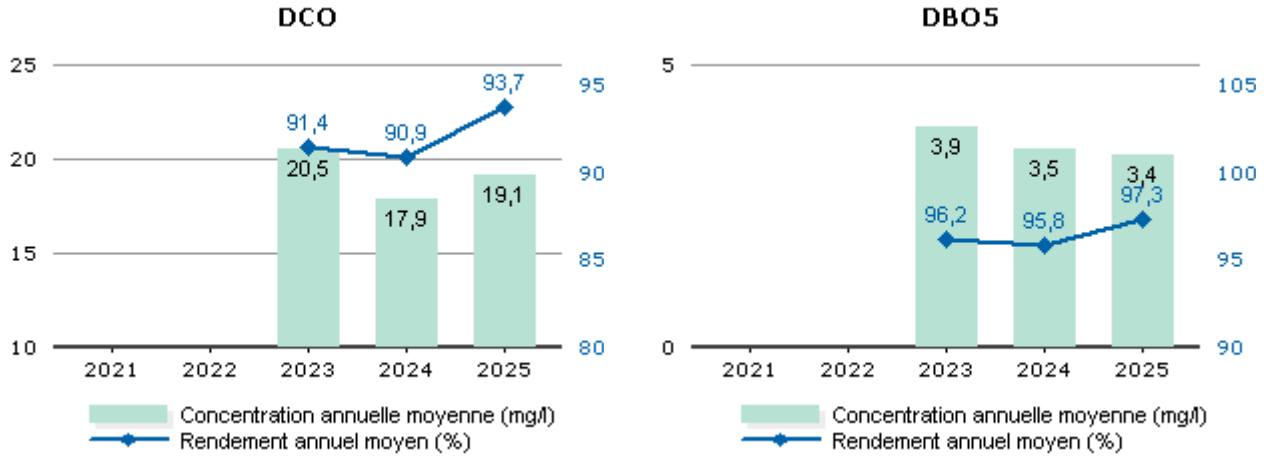

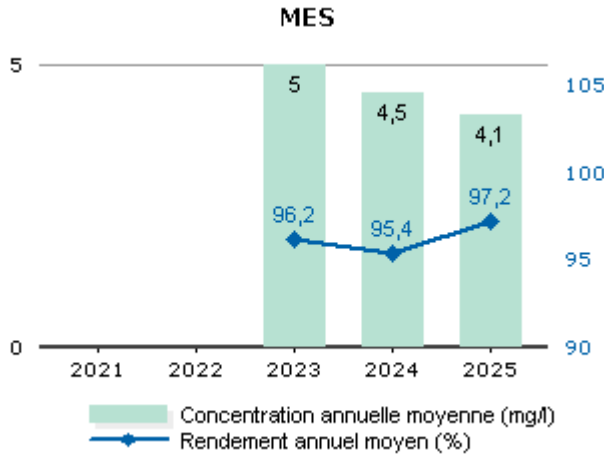

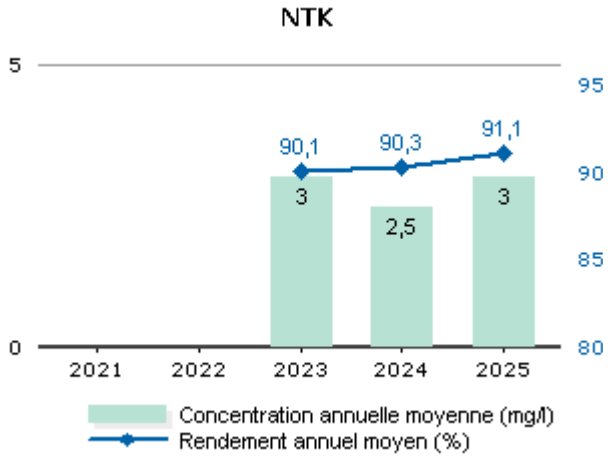

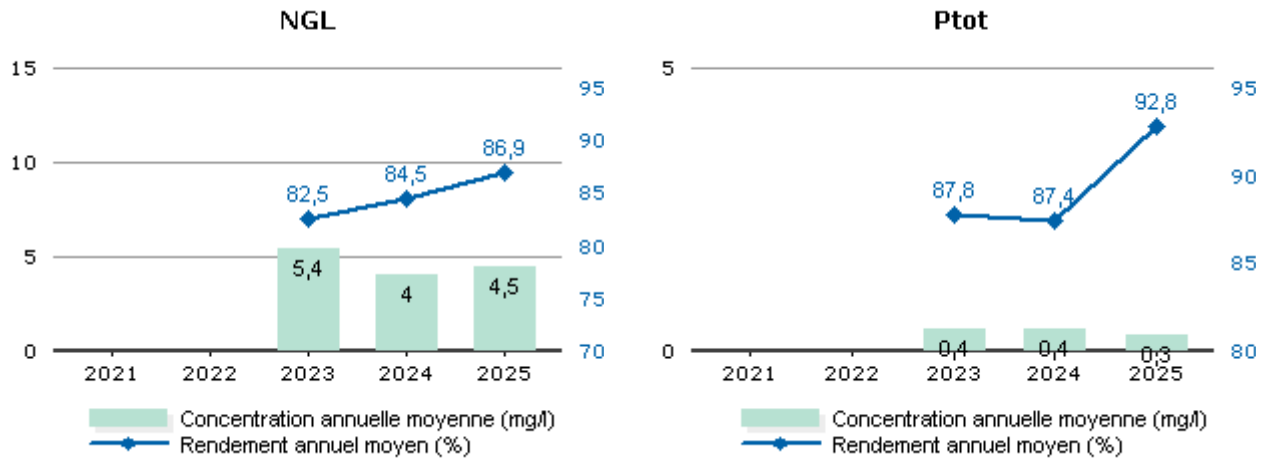

Les valeurs moyennes observées en sortie du système de traitement (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la prescription qui est à présent à calculer en considérant les débits à hauteur du débit de référence. L'évaluation du taux de respect fait l'objet de l'indicateur de conformité locale présenté dans la suite de la présente section.

Conformité de la performance

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations, …). La conformité locale est définie au regard des prescriptions de l'arrêté préfectoral.

	2021	2022	2023	2024	2025
Conformité à l'arrêté préfectoral			100,00	100,00	100,00

A partir de 2019, cette conformité est évaluée suivant les nouvelles règles de calcul que celles des outils du Ministère (prise en compte des débits à hauteur du débit de référence en entrée et sortie, prise en compte du débit entrant en station pour définir si la station est en ou hors condition normale de fonctionnement, prise en compte du débit de référence mentionné dans l'acte administratif (arrêté préfectoral local). Cette évaluation reste fournie à titre indicatif. Seule l'évaluation transmise par le Service de Police de l'Eau en mars a une valeur officielle.

Qualité du traitement des boues

Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration

Cet indicateur permet d'évaluer l'efficacité de dépollution des usines (extraction et concentration de la pollution de l'effluent traité). Il s'exprime en tonnage de matières sèches.

	2021	2022	2023	2024	2025
Boues évacuées (Tonnes de MS) (S6)			981,4	1 414,7	1 933,6

Boues évacuées par destination et proportion évacuée selon une filière conforme

Ce tableau présente la proportion de boues évacuées selon une filière conforme.

	2021	2022	2023	2024	2025
Taux de boues évacuées selon une filière conforme (%)			100,0	100,0	100,0

Destination des boues évacuées

Ce tableau présente le détail pour l'année des destinations des boues évacuées.

	Produit brut (t)	Siccité (%)	Matières sèches (t)	Destination conforme (%) *
Valorisation agricole	6207,5	31,15	1933,6	100,00
Total	**6207,5**	**31,15**	**1933,6**	**100,00**

* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches.

Sous-produits évacués par destination

Ce tableau présente les sous-produits générés et leur devenir.

	2021	2022	2023	2024	2025
Incinération (t) Refus			35,2	20,2	16,1
Total (t)			35,2	20,2	16,1
Valorisation industrielle (t) Sables			275,1	149,2	305,1
Total (t)			275,1	149,2	305,1
Incinération (m^3) Graisses			21,2	21,9	17,6
Total (m^3)			21,2	21,9	17,6

BILAN QUALITÉ PAR STEP

PMA - SECTEUR PERI URBAIN ASS

LAGUNE BEUTAL village

Charges entrant sur le système de traitement :


Charges entrantes et dépassement de capacité	Bilan HCNF*	Volume	MES	DCO	DBO5	NTK	NGL	Pt
		Charge (m3/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)
18/06/2025	Non	38	12,54	23,29	9,12	2,77	2,78	0,4

* Hors conditions Normales de Fonctionnement selon le volume reçu en entrée de station

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :

Charges en sortie et rendement	MES		DCO		DBO5		NTK		NGL		Pt	
	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%
18/06/2025	1,1	91,2	3,19	86,3	0,57	93,8	0,56	79,7	0,57	79,5	0,11	72,1

Boues évacuées par mois

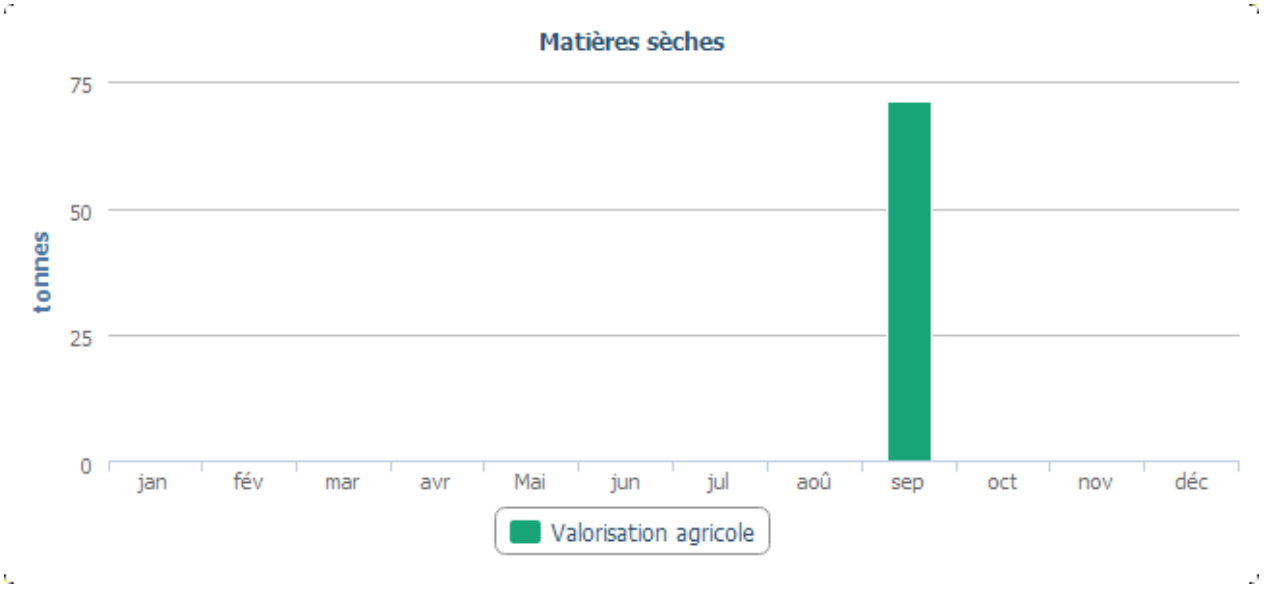

LAGUNE BRETIGNEY

Charges entrant sur le système de traitement :

Charges entrantes et dépassement de capacité	Bilan HCNF*	Volume	MES	DCO	DBO5	NTK	NGL	Pt
		Charge (m3/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)
21/05/2025	Non	12	3,12	8,84	3,6	1,26	1,26	0,12

* Hors conditions Normales de Fonctionnement selon le volume reçu en entrée de station

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :

Charges en sortie et rendement	MES		DCO		DBO5		NTK		NGL		Pt	
	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%
21/05/2025	0,26	91,5	0,83	90,6	0,23	93,7	0,14	89,1	0,88	30,2	0,14	-13,0

LAGUNE PRESENTVILLERS

Charges entrant sur le système de traitement :

Charges entrantes et dépassement de capacité	Bilan HCNF*	Volume	MES	DCO	DBO5	NTK	NGL	Pt
		Charge (m3/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)
27/05/2025	Non	78,44	37,65	83,15	32,16	6,83	6,87	0,82

* Hors conditions Normales de Fonctionnement selon le volume reçu en entrée de station

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :

Charges en sortie et rendement	MES		DCO		DBO5		NTK		NGL		Pt	
	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%
27/05/2025	1,41	96,3	5,96	92,8	0,47	98,5	1,26	81,6	1,28	81,4	0,19	77,1

LAGUNE SOLEMONT

Charges entrant sur le système de traitement :

Charges entrantes et dépassement de capacité	Bilan HCNF*	Volume	MES	DCO	DBO5	NTK	NGL	Pt
		Charge (m3/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)
30/06/2025	Non	23	6,44	10,03	5,98	1,96	1,98	0,22

* Hors conditions Normales de Fonctionnement selon le volume reçu en entrée de station

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :

Charges en sortie et rendement	MES		DCO		DBO5		NTK		NGL		Pt	
	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%
30/06/2025	0,12	98,2	0,37	96,3	0,07	98,9	0,06	97,2	0,06	97,1	0,13	41,5

STEP ABBEVILLERS

Charges entrant sur le système de traitement :


Charges entrantes et dépassement de capacité	Bilan HCNF*	Volume	MES	DCO	DBO5	NTK	NGL	Pt
		Charge (m3/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)
18/03/2025	Non	102	234,6	424,32	122,4	24,68	24,77	6,25
09/07/2025	Non	158	33,18	101,28	39,5	15,8	15,82	1,58
25/09/2025	Non	60,63	20,01	46,81	22,43	6,43	6,43	0,7

* Hors conditions Normales de Fonctionnement selon le volume reçu en entrée de station

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :

Charges en sortie et rendement	MES		DCO		DBO5		NTK		NGL		Pt	
	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%
18/03/2025	0,92	99,6	6,32	98,5	0,71	99,4	0,56	97,7	0,59	97,6	0,07	98,9
09/07/2025	0,32	99,1	4,9	95,2	0,22	99,4	0,27	98,3	0,64	96,0	0,1	93,7
25/09/2025	0,18	99,1	1,15	97,6	0,09	99,6	0,05	99,2	0,09	98,5	0,17	75,7

Boues évacuées par mois

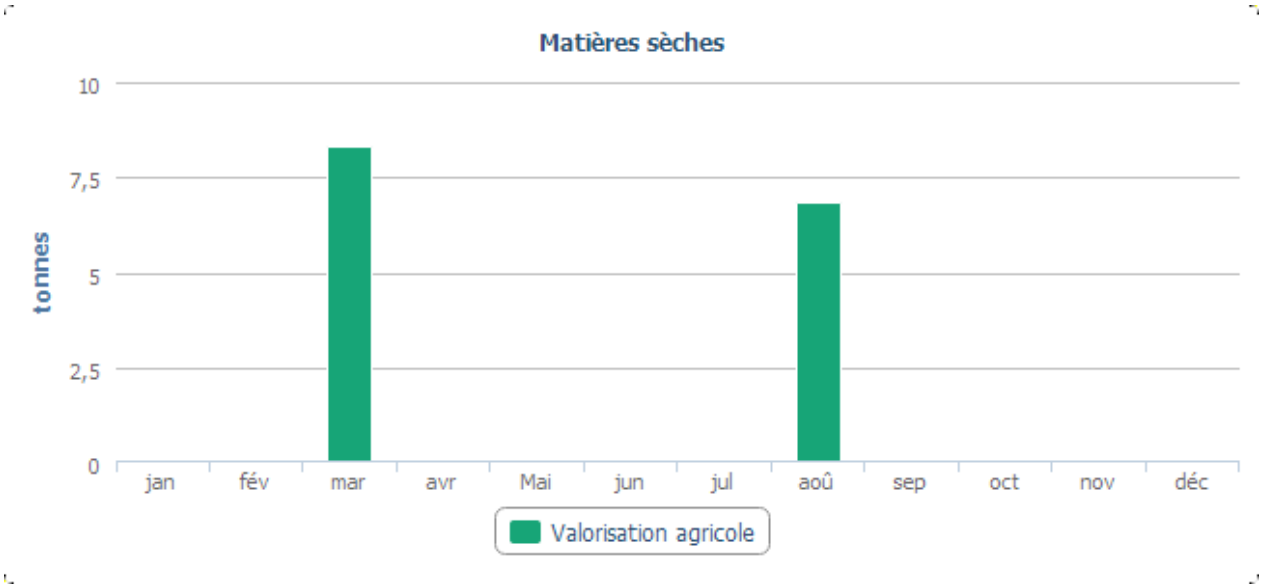

STEP BEUTAL de la Guinguette

Charges entrant sur le système de traitement :

Charges entrantes et dépassement de capacité	Bilan HCNF*	Volume	MES	DCO	DBO5	NTK	NGL	Pt
		Charge (m3/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)

* Hors conditions Normales de Fonctionnement selon le volume reçu en entrée de station

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :

Charges en sortie et rendement	MES		DCO		DBO5		NTK		NGL		Pt	
	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%

STEP BLAMONT

Charges entrant sur le système de traitement :


Charges entrantes et dépassement de capacité	Bilan HCNF*	Volume	MES	DCO	DBO5	NTK	NGL	Pt
		Charge (m3/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)
26/03/2025	Non	253	88,55	207,97	86,02	21,48	21,51	2,56
16/05/2025	Non	119,54	29,89	67,78	29,89	9,83	9,84	1,04
03/07/2025	Non	102,46	23,57	57,28	19,47	7,91	7,98	1,01
17/09/2025	Non	148,65	57,97	107,17	41,62	13,48	13,5	1,43
21/10/2025	Oui	373,31	171,72	337,47	126,93	27,81	27,88	4,55

* Hors conditions Normales de Fonctionnement selon le volume reçu en entrée de station

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :

Charges en sortie et rendement	MES		DCO		DBO5		NTK		NGL		Pt	
	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%
26/03/2025	10,88	87,7	25,55	87,7	8,86	89,7	10,8	49,7	10,9	49,3	0,23	91,1
16/05/2025	1,67	94,4	4,3	93,7	0,72	97,6	5,46	44,4	5,5	44,2	0,08	92,6
03/07/2025	0,82	96,5	3,1	94,6	0,39	98,0	2,12	73,2	2,29	71,4	0,08	91,9
17/09/2025	1,04	98,2	3,29	96,9	0,1	99,8	0,24	98,2	4,83	64,2	0,46	67,7
21/10/2025	1,87	98,9	6,53	98,1	0,52	99,6	0,9	96,8	1,37	95,1	0,07	98,4

Boues évacuées par mois

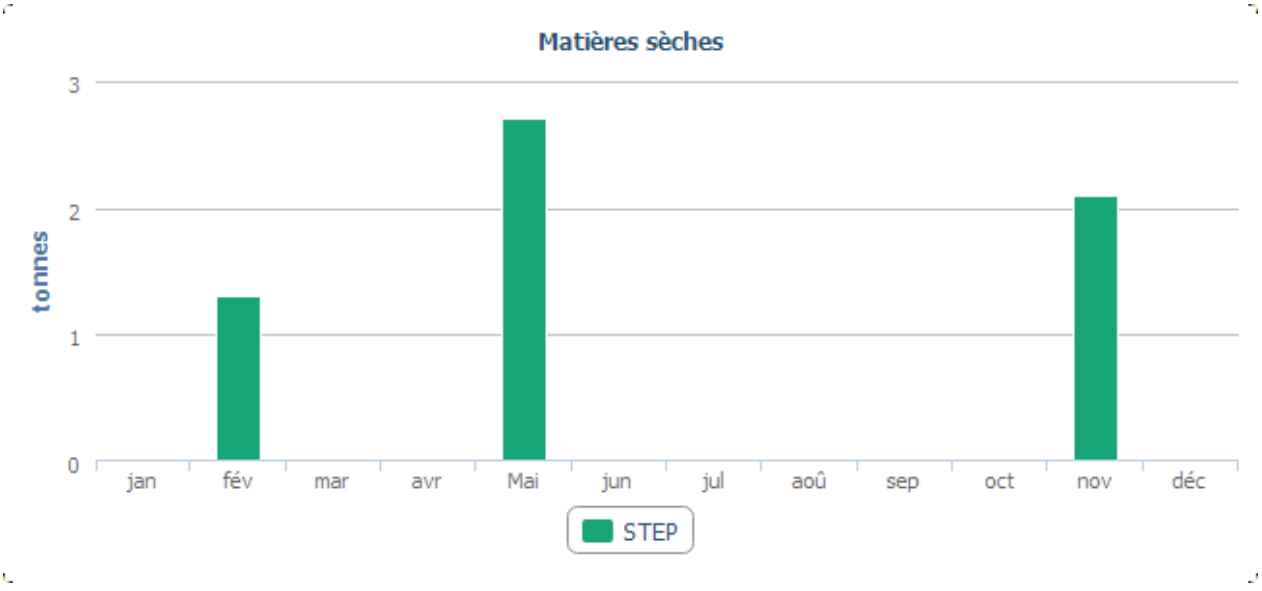


STEP COLOMBIER FONTAINE

Bilans HCNF / Bilans :

Charges entrantes et dépassement de capacité	Volume		MES	DCO	DBO5	NTK	NGL	Pt
	(m3/j)	Nbr Bilan HcNF* / nbr de bilans	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j
janvier	1 029	0 / 1	309	545	257	44,3	44,7	7,2
février	562	0 / 1	112	274	107	35,5	35,6	3,9
mars	467	0 / 1	140	341	121	36,9	36,9	4,1
avril	390	0 / 1	242	378	164	42,9	42,9	5,5
mai	399	0 / 1	144	277	104	32,5	32,5	3,9
juin	446	0 / 1	165	305	111	33,2	33,4	3,8
juillet	430	0 / 1	150	335	95	42,9	43,2	7,1
août	476	0 / 1	424	733	233	64,3	64,3	7,4
septembre	599	0 / 1	353	496	192	32,2	32,2	6,5
octobre	830	0 / 1	315	565	232	72,1	72,2	8,1
novembre	1 100	0 / 1	60	128	59	16,9	18,5	2,0
décembre	403	0 / 1	85	152	60	25,4	25,5	2,5


(*) Hors conditions normales de fonctionnement selon le volume reçu en entrée de station

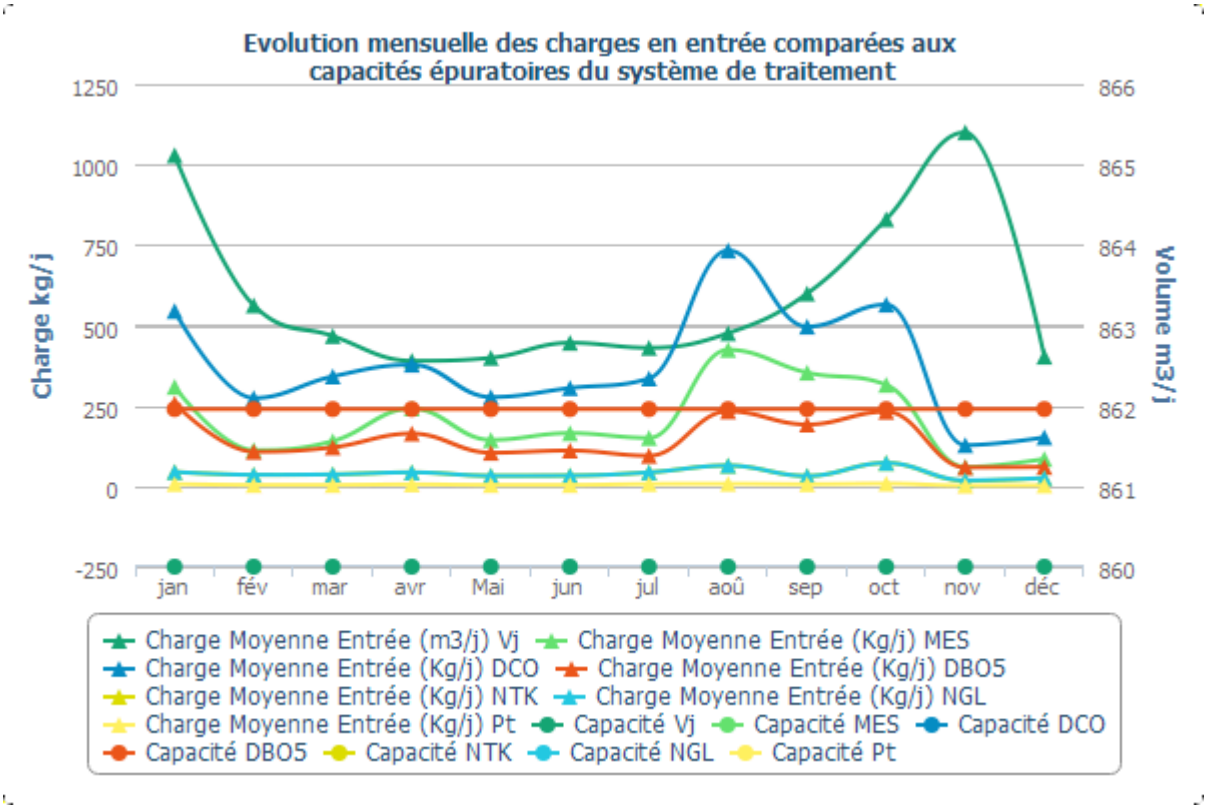


Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :


Charges en sortie et rendement	MES		DCO		DBO5		NTK		NGL		Pt	
	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%


janvier	3,10	99,00	9,20	98,32	2,98	98,84	1,30	96,98	2,70	94,08	0,40	94,00
février	1,70	98,50	11,40	95,85	1,46	98,63	1,00	97,15	1,60	95,41	0,50	87,14
mars	0,90	99,33	8,60	97,48	0,84	99,31	0,80	97,85	1,30	96,39	0,40	89,77
avril	0,80	99,68	10,50	97,23	1,01	99,38	1,10	97,36	1,30	96,92	0,80	85,82
mai	0,80	99,44	6,20	97,76	0,60	99,42	0,40	98,65	0,70	97,89	0,40	90,41
juin	0,90	99,46	8,90	97,09	0,67	99,40	1,00	96,91	1,10	96,64	0,20	94,19
juillet	1,30	99,14	9,70	97,11	0,26	99,73	1,80	95,80	2,00	95,33	0,20	97,59
août	1,40	99,66	10,50	98,57	1,05	99,55	1,70	97,33	2,10	96,73	0,20	97,82
septembre	4,80	98,64	12,30	97,51	3,59	98,13	3,20	89,94	3,40	89,47	0,30	94,91
octobre	1,70	99,47	27,70	95,10	1,74	99,25	1,30	98,27	1,70	97,60	0,20	97,14
novembre	2,20	96,36	11,90	90,69	2,31	96,11	0,90	94,55	5,40	70,73	0,70	66,11
décembre	0,80	99,05	4,00	97,39	0,89	98,53	0,30	98,83	3,10	87,78	0,30	87,74

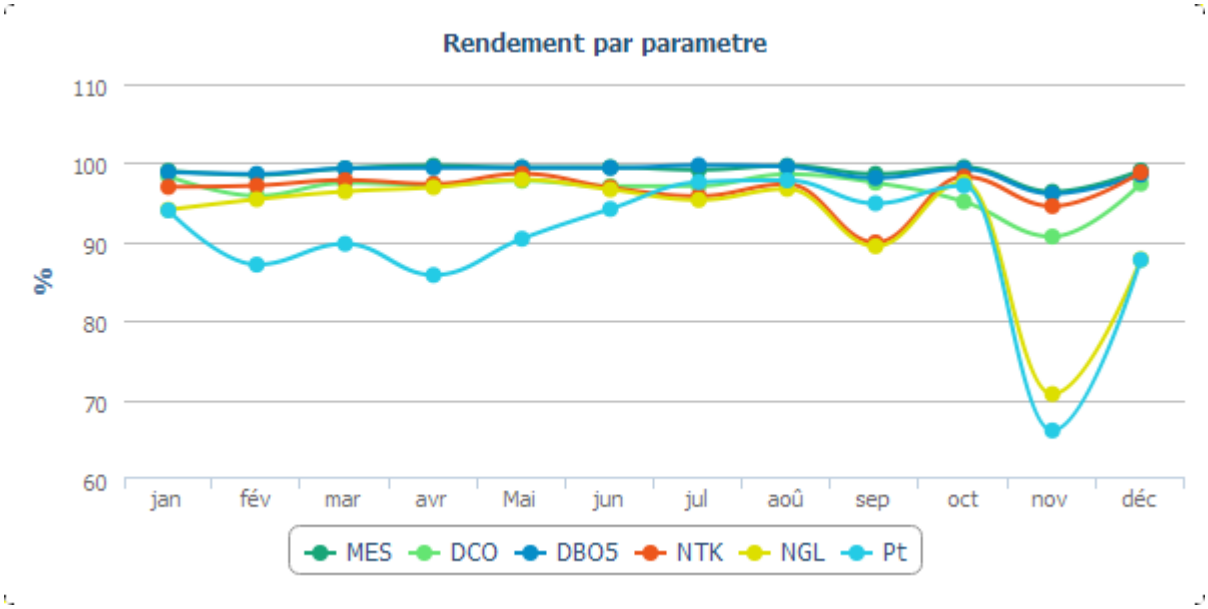



Evolution des charges et du rendement par paramètre

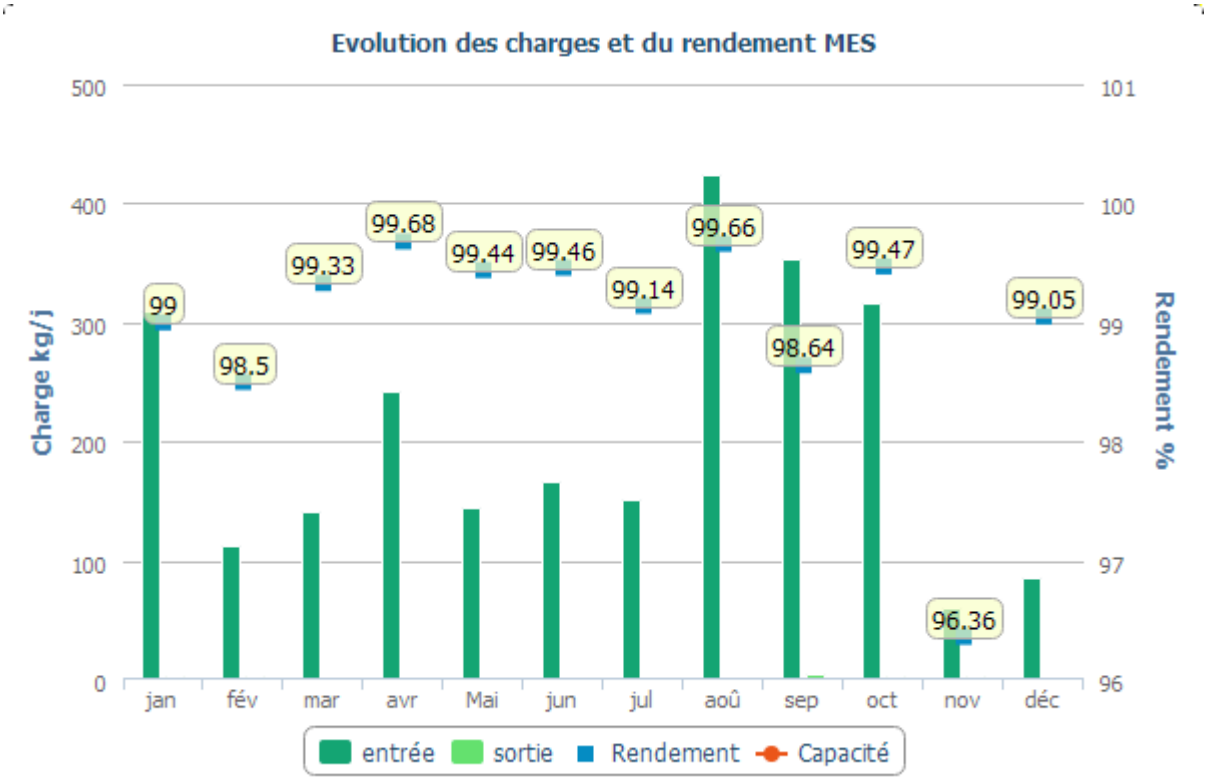

Evolution des charges et du rendement MES
Charge kg/j
Rendement %
500
400
300
200
100
0
101
100
99
98
97
96
99
98.5
99.33
99.68
99.44
99.46
99.14
99.66
98.64
99.47
96.36
99.05
jan
fév
mar
avr
Mai
jun
jul
aoû
sep
oct
nov
déc
entrée
sortie
Rendement
Capacité

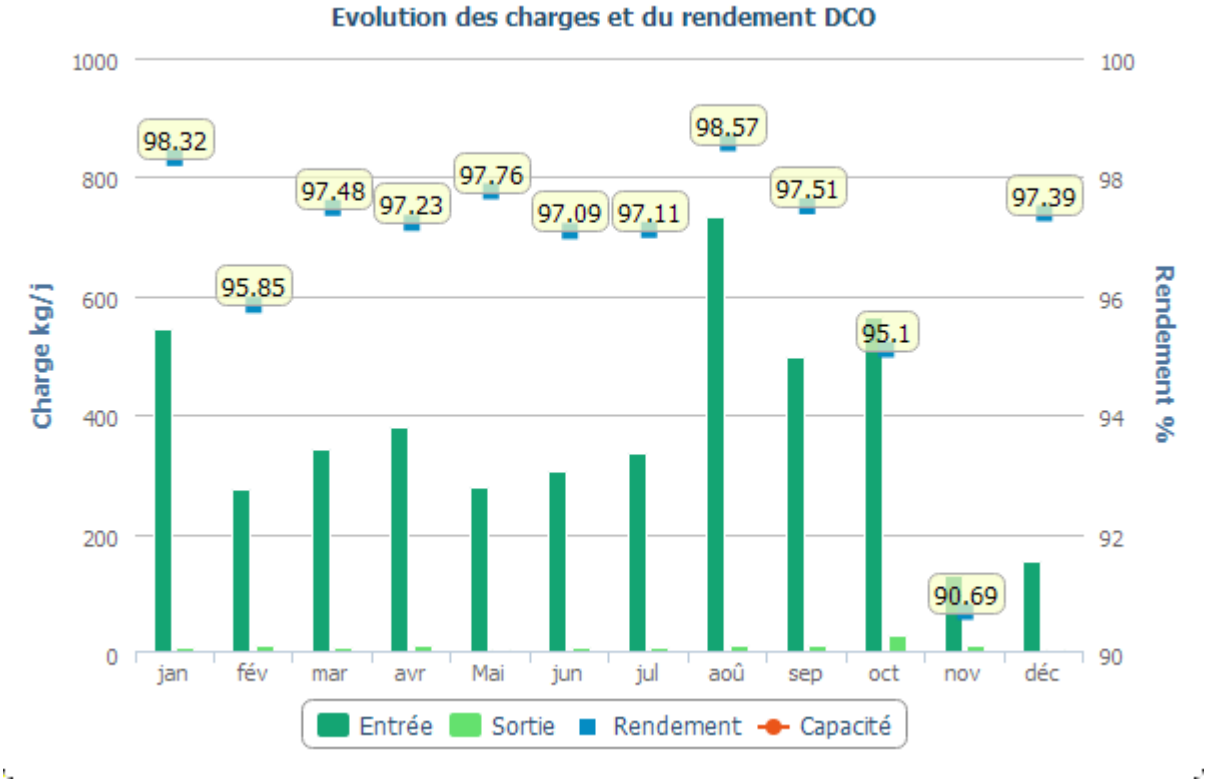
Evolution des charges et du rendement DCO
Charge kg/j
Rendement %
1000
800
600
400
200
0
100
98
96
94
92
90
98.32
95.85
97.48
97.23
97.76
97.09
97.11
98.57
97.51
95.1
90.69
97.39
jan
fév
mar
avr
Mai
jun
jul
aoû
sep
oct
nov
déc
Entrée
Sortie
Rendement
Capacité

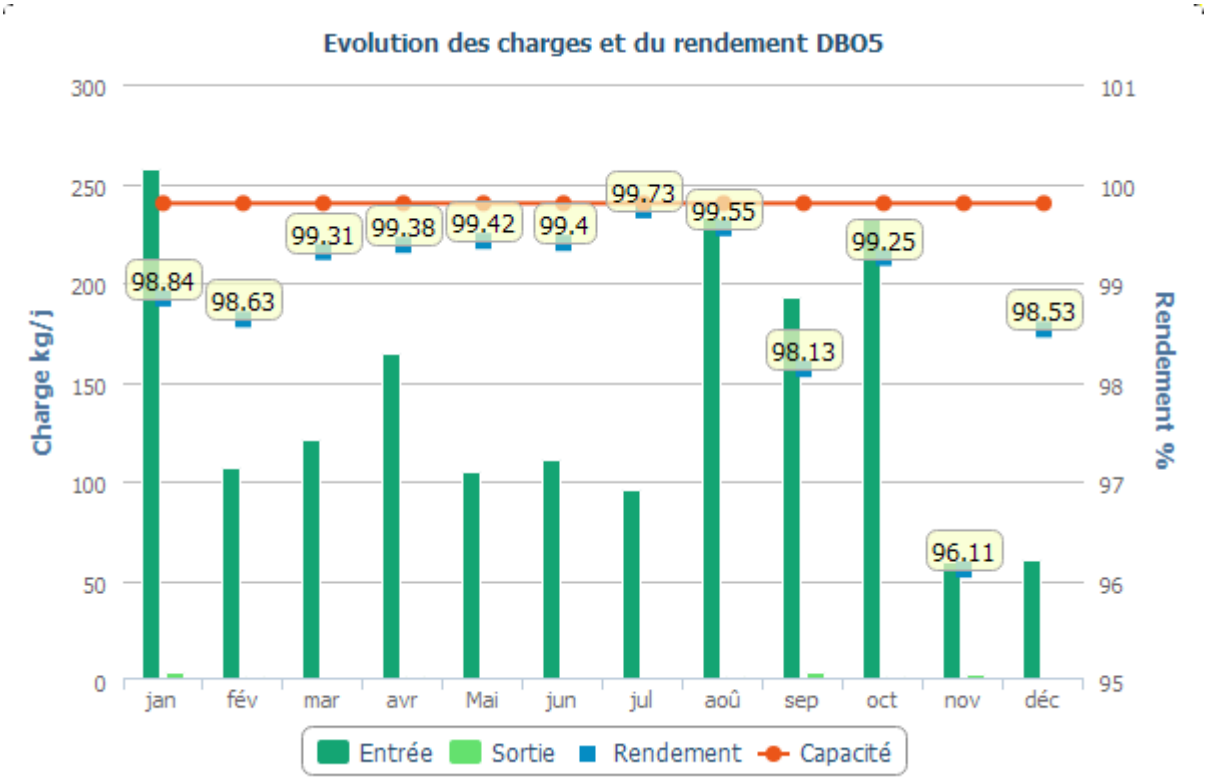

Evolution des charges et du rendement DBO5
Charge kg/j
Rendement %
300
250
200
150
100
50
0
101
100
99
98
97
96
95
98.84
98.63
99.31
99.38
99.42
99.4
99.73
99.55
98.13
99.25
96.11
98.53
jan
fév
mar
avr
Mai
jun
jul
aoû
sep
oct
nov
déc
Entrée
Sortie
Rendement
Capacité

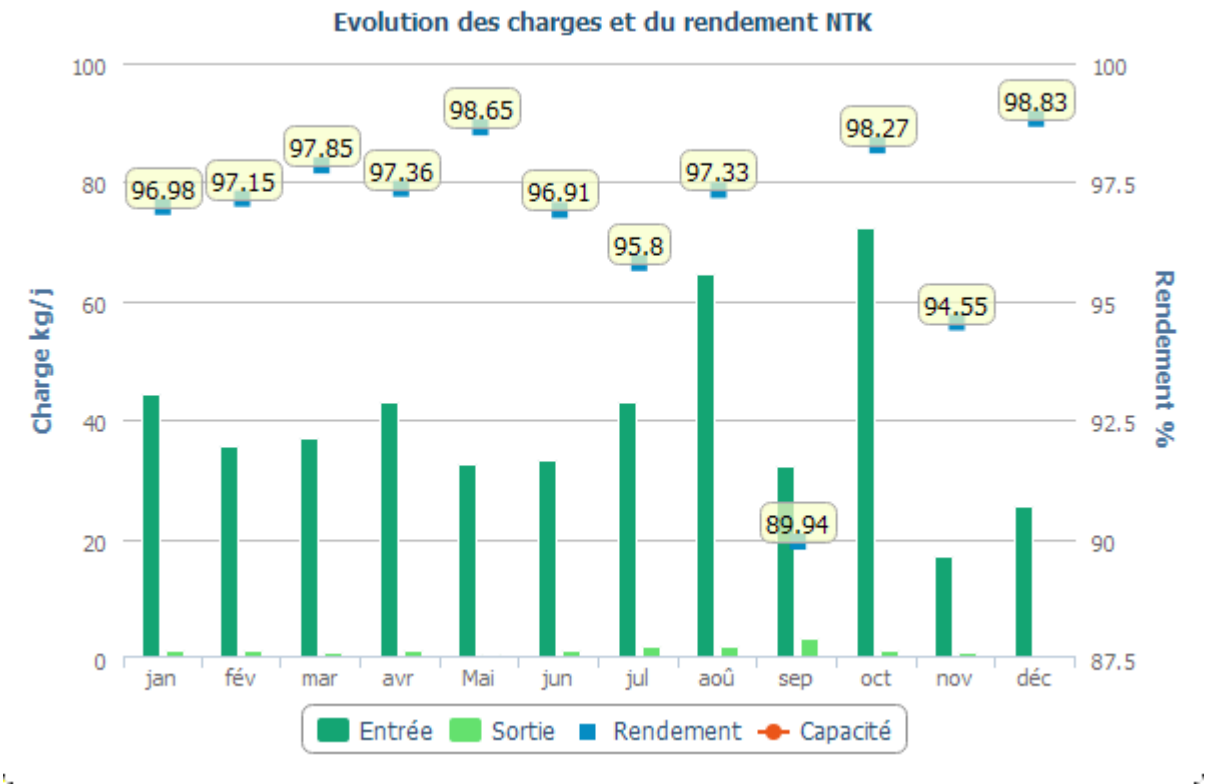
Evolution des charges et du rendement NTK
Charge kg/j
Rendement %
100
80
60
40
20
0
100
97.5
95
92.5
90
87.5
96.98
97.15
97.85
97.36
98.65
96.91
95.8
97.33
89.94
98.27
94.55
98.83
jan
fév
mar
avr
Mai
jun
jul
aoû
sep
oct
nov
déc
Entrée
Sortie
Rendement
Capacité

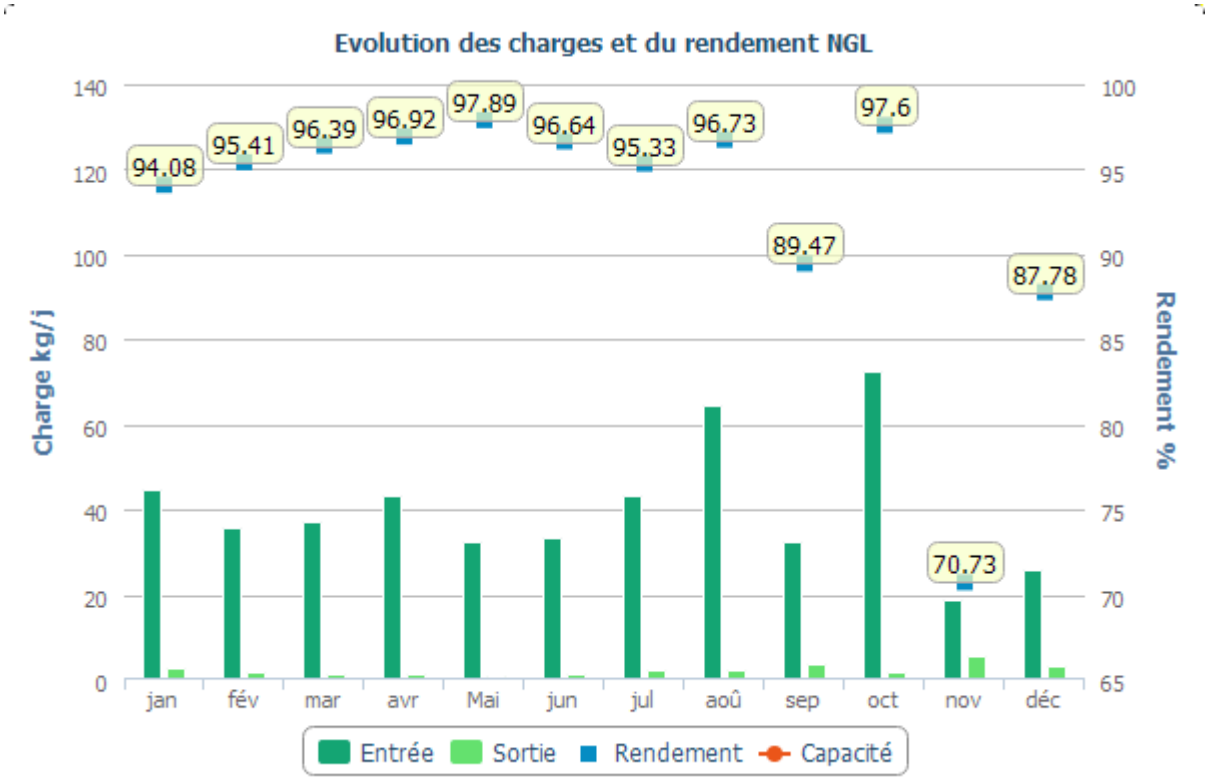

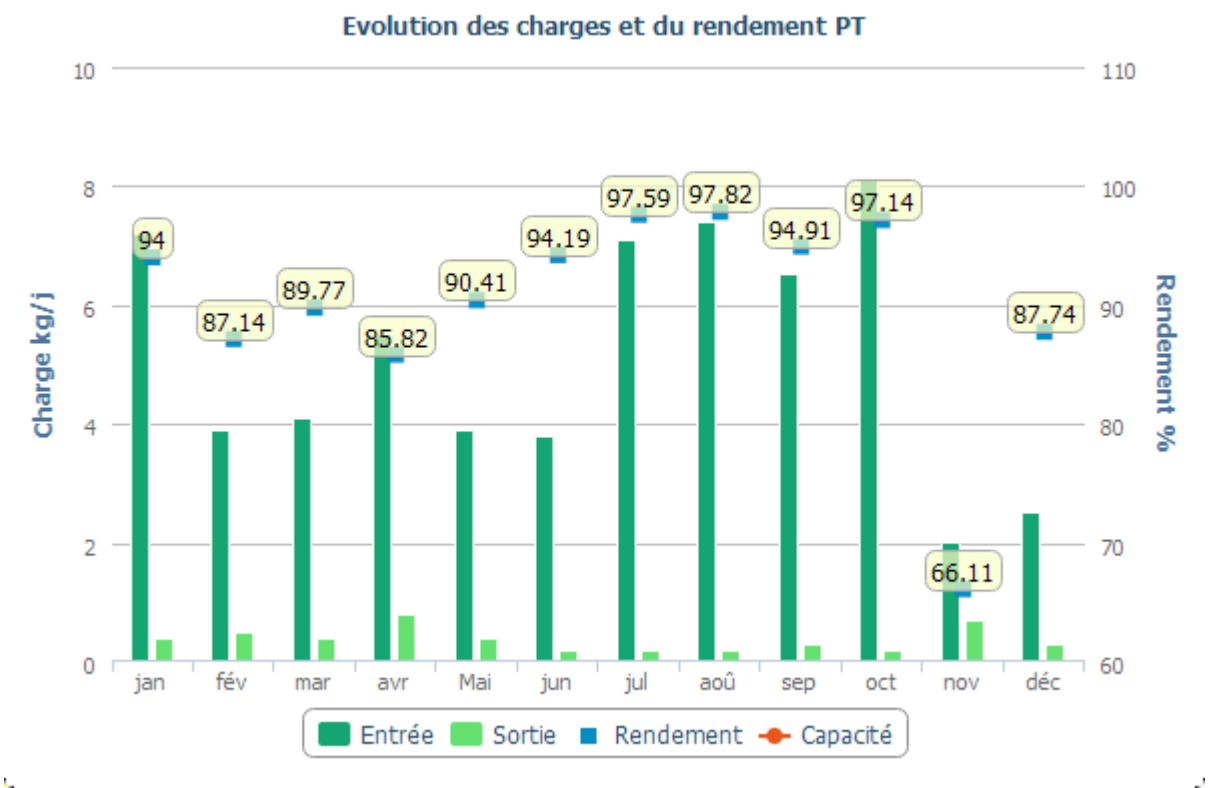

Boues évacuées par mois

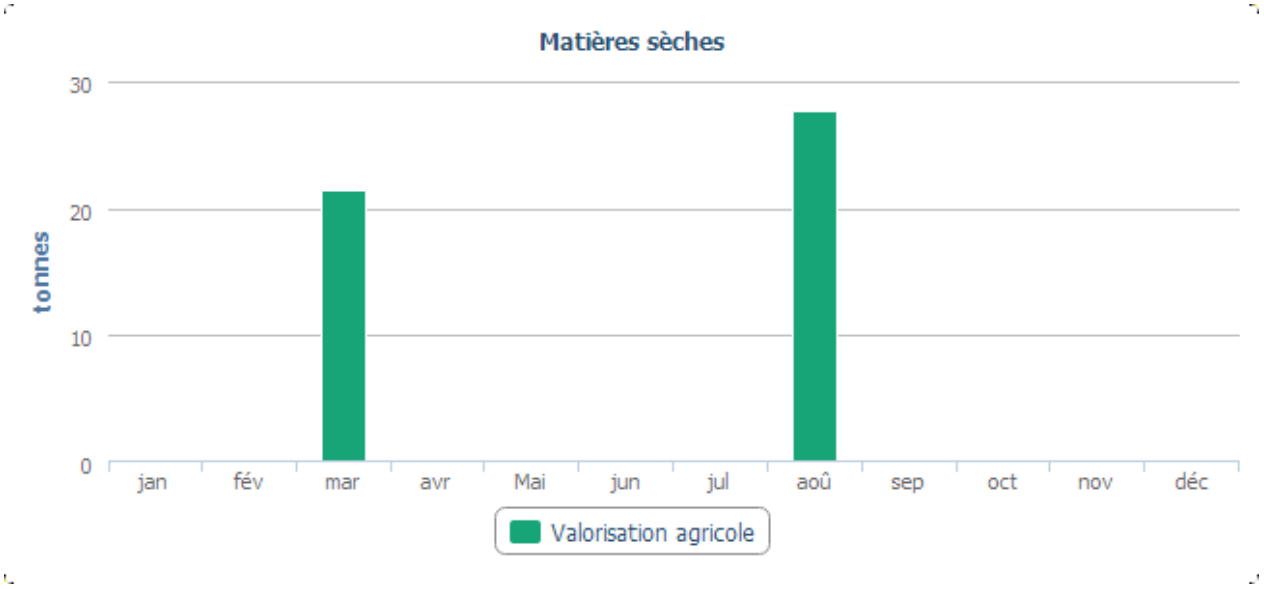

STEP DAMBELIN

Charges entrant sur le système de traitement :


Charges entrantes et dépassement de capacité	Bilan HCNF*	Volume	MES	DCO	DBO5	NTK	NGL	Pt
		Charge (m3/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)
03/02/2025	Non	150,78	39,2	65,29	40,71	10,95	11,05	1,21
02/04/2025	Non	88	22,88	64,86	31,68	8,98	8,99	1,06
05/06/2025	Non	125	21,25	48,88	25	7,05	7,06	0,94
06/08/2025	Non	73,09	19,73	57,81	24,12	6,8	6,82	0,74
03/09/2025	Non	98,35	19,67	38,36	21,64	6,89	7,98	0,79
05/11/2025	Non	154	20,02	46,97	21,56	6,98	6,99	0,72

* Hors conditions Normales de Fonctionnement selon le volume reçu en entrée de station

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :

Charges en sortie et rendement	MES		DCO		DBO5		NTK		NGL		Pt	
	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%
03/02/2025	1,21	96,9	3,02	95,4	0,86	97,9	0,26	97,7	0,45	96,0	0,24	80,0
02/04/2025	1,5	93,5	3,43	94,7	0,62	98,1	0,37	95,9	0,43	95,3	0,63	40,0
05/06/2025	1,38	93,5	3,36	93,1	0,53	97,9	0,25	96,5	0,33	95,4	0,08	91,2
06/08/2025	0,51	97,4	2,13	96,3	0,19	99,2	0,17	97,5	0,24	96,4	0,18	76,2
03/09/2025	0,59	97,0	2,27	94,1	0,16	99,3	0,23	96,7	0,34	95,8	0,37	52,5
05/11/2025	2,31	88,5	3,73	92,1	0,29	98,6	0,28	96,0	2,94	58,0	0,17	76,6

Boues évacuées par mois

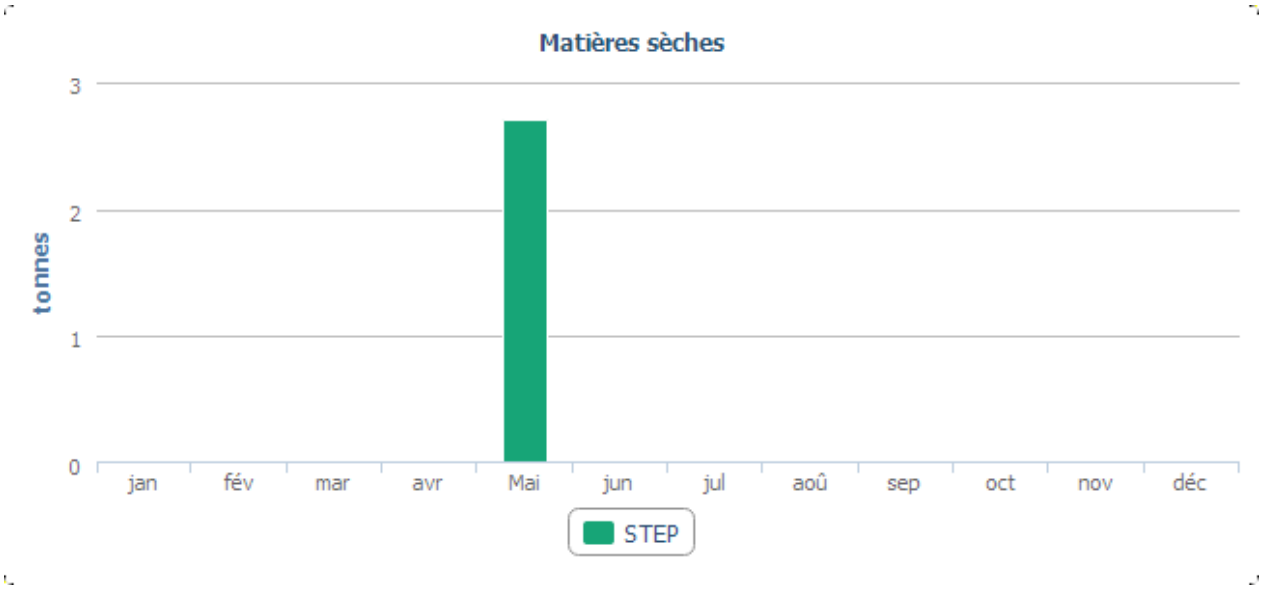


STEP DUNG

Bilans HCNF / Bilans :


Charges entrantes et dépassement de capacité	Volume		MES	DCO	DBO5	NTK	NGL	Pt
	(m3/j)	Nbr Bilan HcNF* / nbr de bilans	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j
janvier	1 312	0 / 1	35	52	14	4,9	8,3	0,7
février	1 025	0 / 1	80	137	65	23,0	24,3	2,6
mars	869	0 / 1	59	89	36	18,5	19,1	1,9
avril	548	0 / 1	93	134	66	22,4	22,7	2,9
mai	471	0 / 1	118	197	71	21,0	21,1	2,5
juin	502	0 / 1	65	124	35	17,0	17,2	1,9
juillet	407	0 / 1	69	97	45	15,0	15,2	1,6
août	537	0 / 1	50	85	38	19,8	20,1	1,9
septembre	675	0 / 1	32	68	32	20,4	20,5	1,7
octobre	897	0 / 1	108	110	90	30,2	30,9	3,5
novembre	957	0 / 1	115	162	77	33,8	34,2	3,7
décembre	676	0 / 1	21	38	20	11,3	12,5	0,9

(*) Hors conditions normales de fonctionnement selon le volume reçu en entrée de station

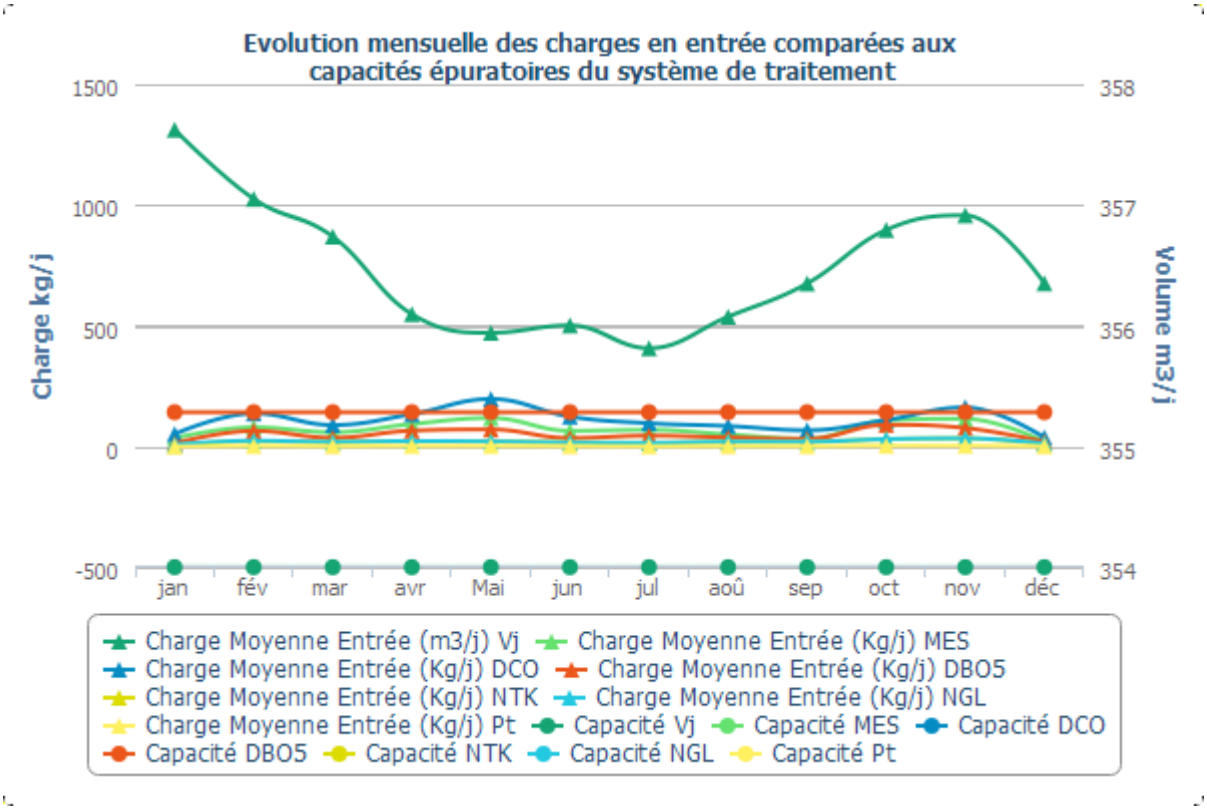



Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :


Charges en sortie et rendement	MES		DCO		DBO5		NTK		NGL		Pt	
	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%
janvier	19,60	44,69	27,20	48,12	7,74	46,40	2,50	49,59	6,70	19,90	0,50	25,63
février	2,90	96,41	10,80	92,12	3,45	94,66	6,60	71,21	8,80	63,77	0,20	92,15
mars	5,70	90,42	23,40	73,63	3,07	91,37	2,90	84,27	6,50	66,11	0,80	57,70
avril	7,00	92,48	18,10	86,46	2,28	96,54	3,00	86,71	3,60	83,96	0,90	67,20
mai	3,90	96,69	9,40	95,26	1,65	97,67	2,10	90,08	2,50	88,19	0,80	68,16
juin	4,40	93,26	12,30	90,07	1,56	95,55	1,10	93,38	1,30	92,41	0,60	65,82
juillet	3,30	95,25	7,40	92,32	0,66	98,53	0,40	97,54	3,80	75,41	0,80	49,50
août	2,60	94,81	8,00	90,62	0,89	97,63	0,60	97,09	4,10	79,86	0,80	55,43
septembre	3,60	88,71	11,30	83,50	1,36	95,80	0,60	97,05	8,90	56,58	1,10	36,31
octobre	4,50	95,79	16,10	85,46	1,18	98,69	1,40	95,49	7,60	75,51	1,40	61,14
novembre	1,90	98,37	11,40	92,93	1,41	98,16	0,80	97,50	7,10	79,34	1,30	64,82
décembre	1,30	93,65	7,50	80,33	1,86	90,50	0,70	94,11	3,40	72,55	0,40	54,60

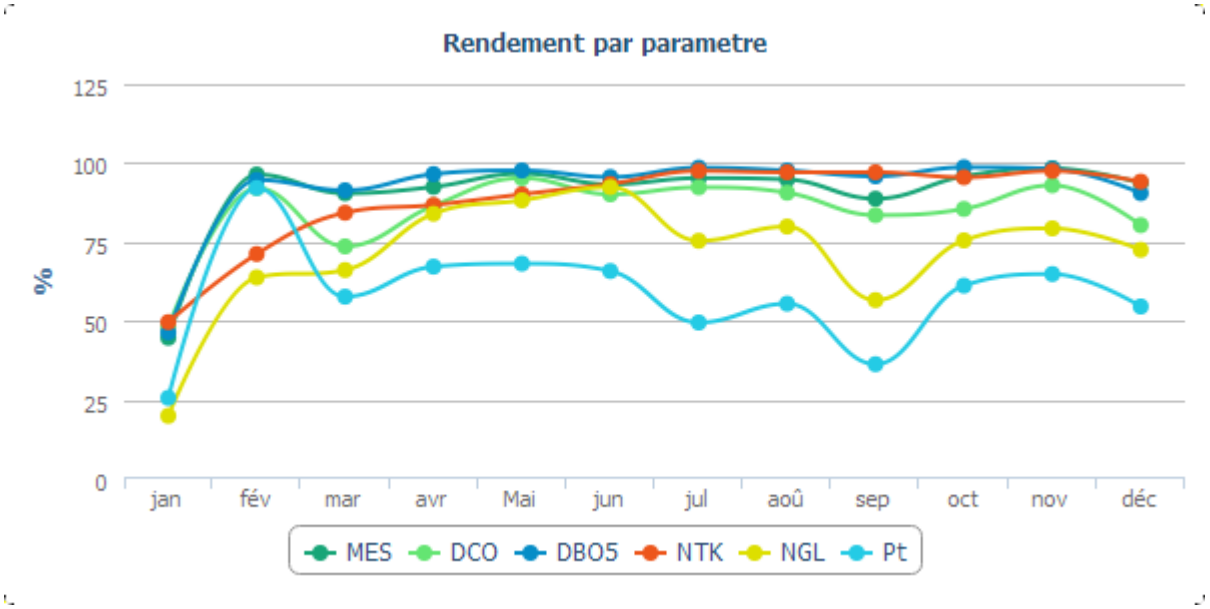



Evolution des charges et du rendement par paramètre

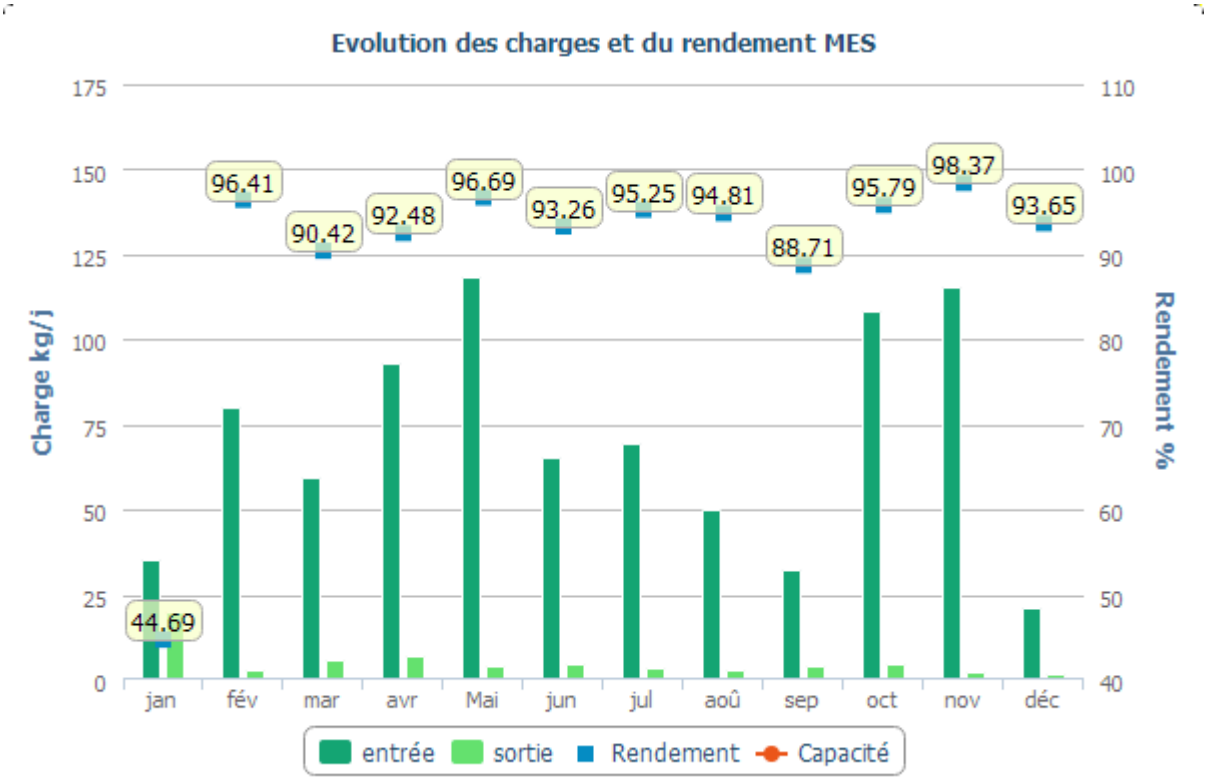

Evolution des charges et du rendement MES
Charge kg/j
Rendement %
175
150
125
100
75
50
25
0
110
100
90
80
70
60
50
40
96.41
90.42
92.48
96.69
93.26
95.25
94.81
88.71
95.79
98.37
93.65
44.69
jan
fév
mar
avr
Mai
jun
jul
aoû
sep
oct
nov
déc
entrée
sortie
Rendement
Capacité

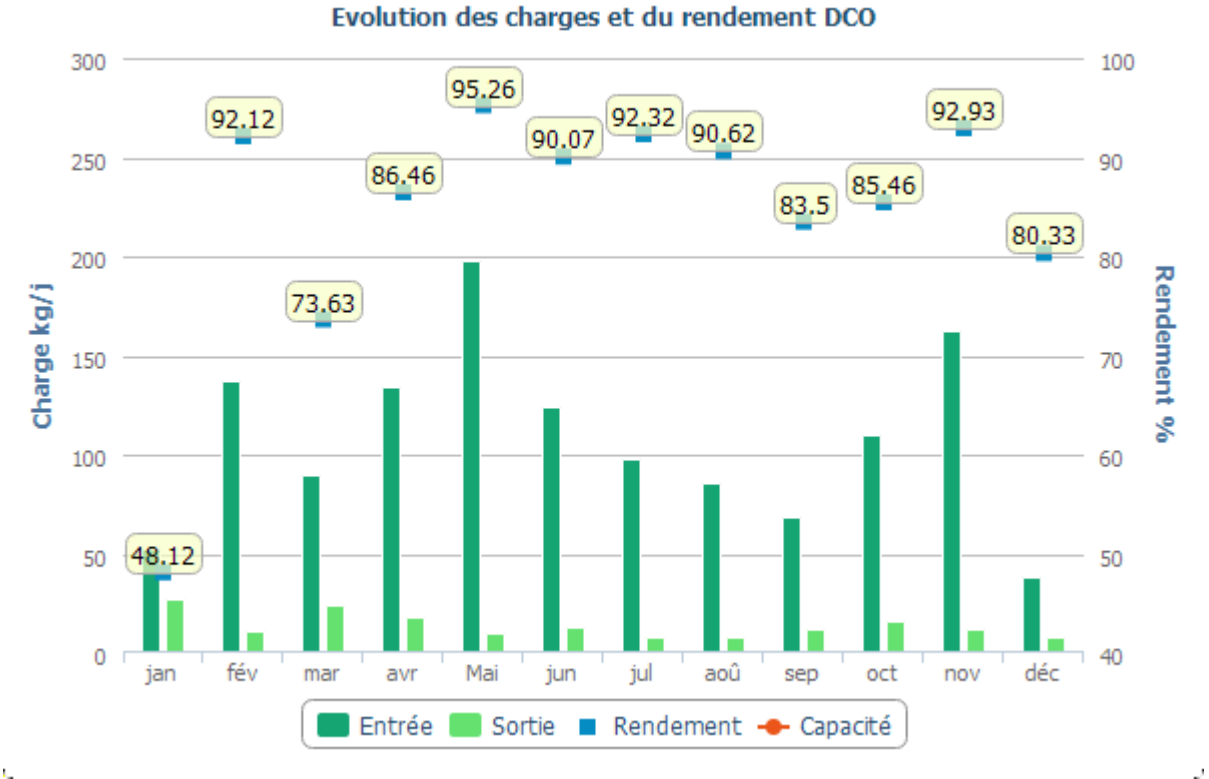
Evolution des charges et du rendement DCO
Charge kg/j
Rendement %
300
250
200
150
100
50
0
100
90
80
70
60
50
40
92.12
86.46
95.26
90.07
92.32
90.62
83.5
85.46
92.93
80.33
73.63
48.12
jan
fév
mar
avr
Mai
jun
jul
aoû
sep
oct
nov
déc
Entrée
Sortie
Rendement
Capacité

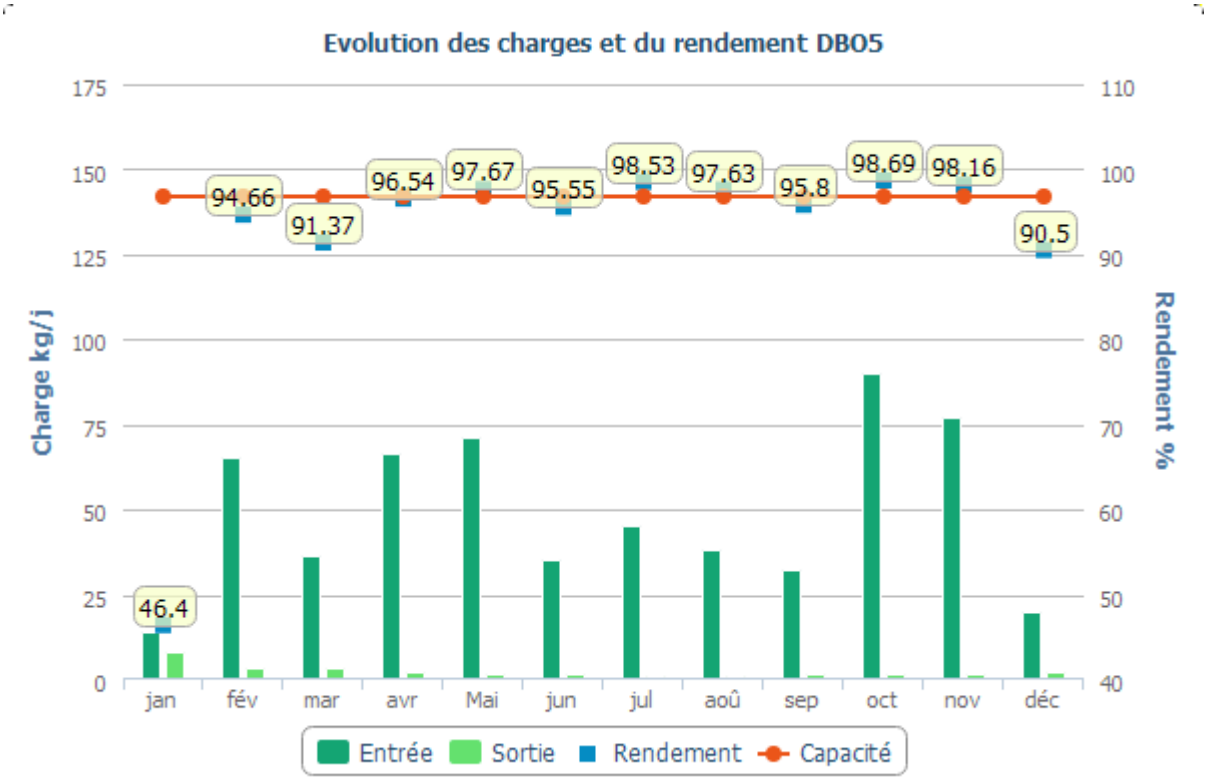

Evolution des charges et du rendement DBO5
Charge kg/j
Rendement %
175
150
125
100
75
50
25
0
110
100
90
80
70
60
50
40
94.66
91.37
96.54
97.67
95.55
98.53
97.63
95.8
98.69
98.16
90.5
46.4
jan
fév
mar
avr
Mai
jun
jul
aoû
sep
oct
nov
déc
Entrée
Sortie
Rendement
Capacité

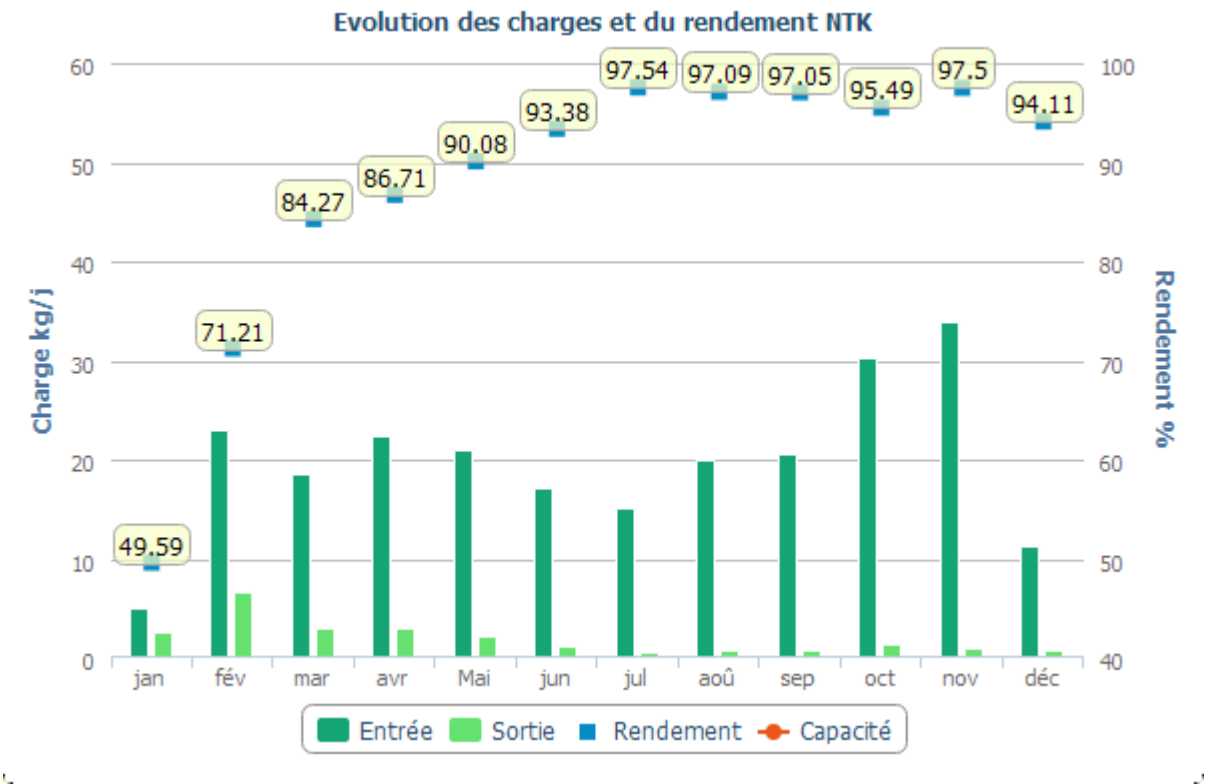
Evolution des charges et du rendement NTK
Charge kg/j
Rendement %
60
50
40
30
20
10
0
100
90
80
70
60
50
40
84.27
86.71
90.08
93.38
97.54
97.09
97.05
95.49
97.5
94.11
49.59
71.21
jan
fév
mar
avr
Mai
jun
jul
aoû
sep
oct
nov
déc
Entrée
Sortie
Rendement
Capacité

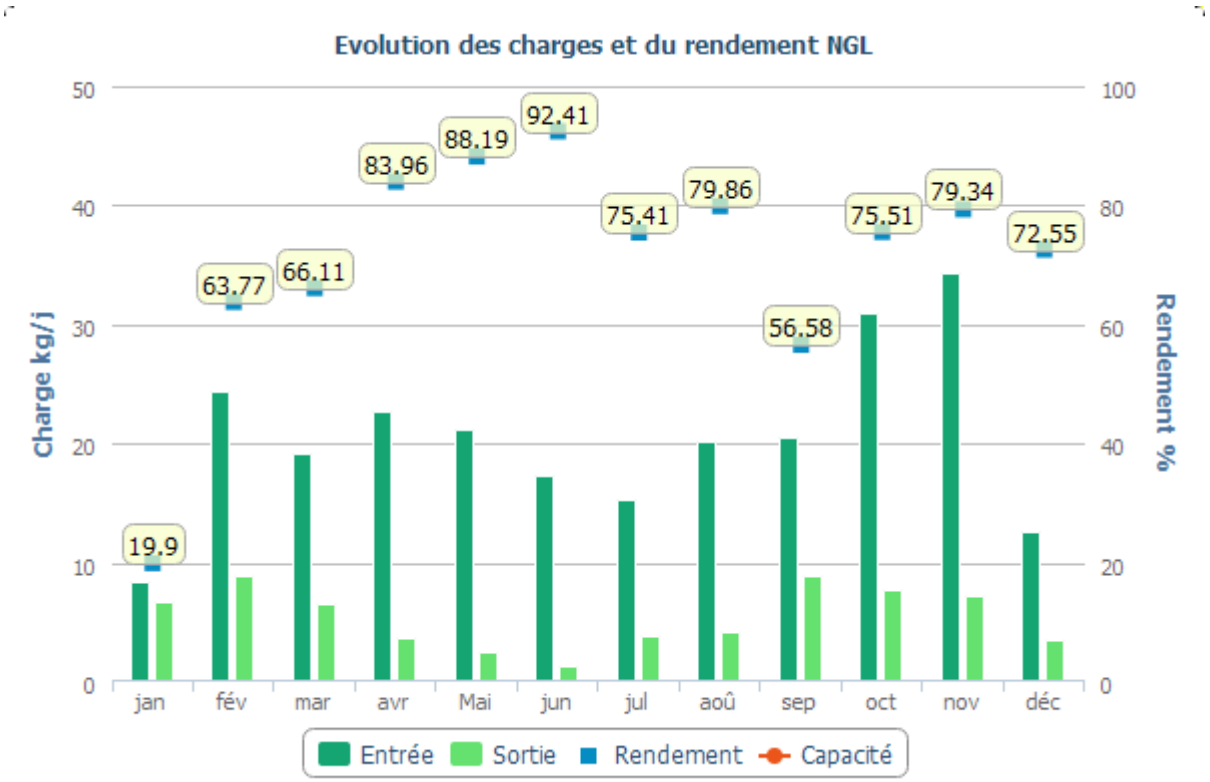

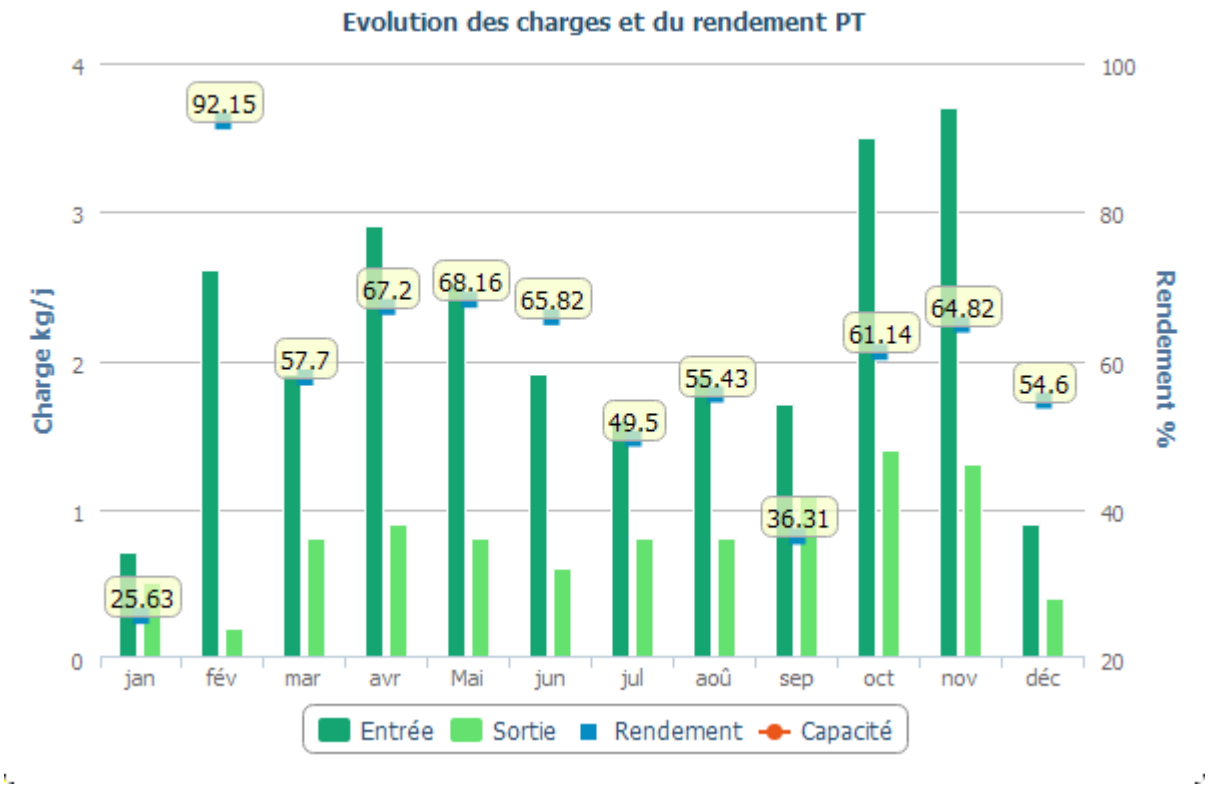

Boues évacuées par mois

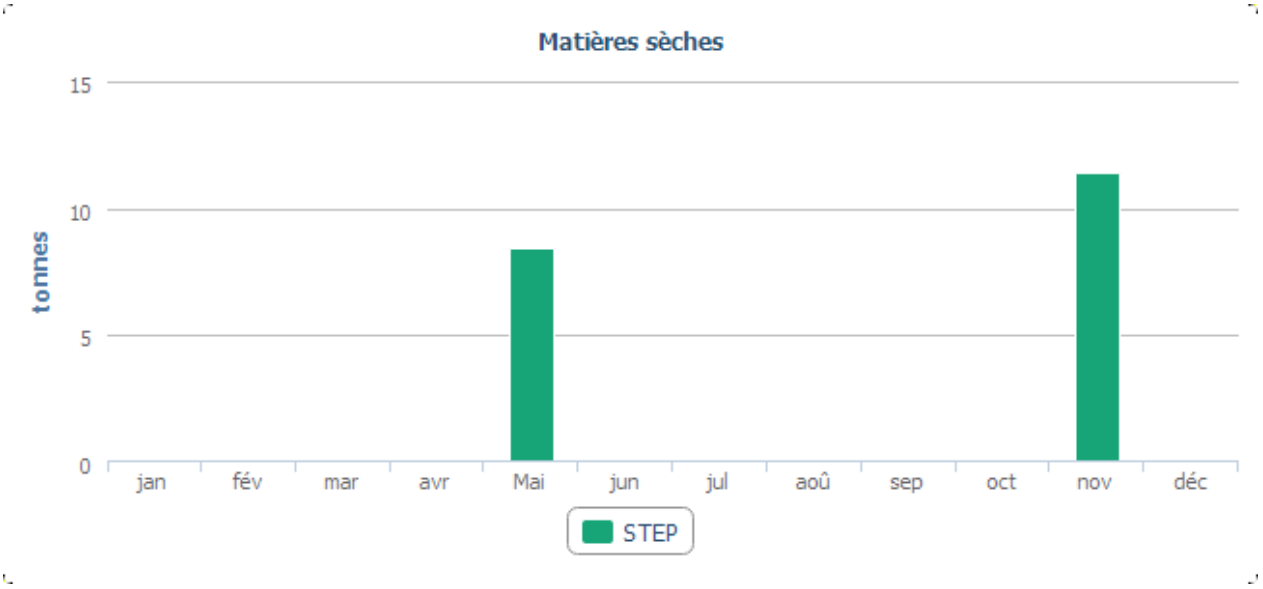


STEP ECHENANS

Bilans HCNF / Bilans :


Charges entrantes et dépassement de capacité	Volume		MES	DCO	DBO5	NTK	NGL	Pt
	(m3/j)	Nbr Bilan HcNF* / nbr de bilans	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j
janvier	1 304	0 / 1	38	87	20	6,8	9,7	1,0
février	1 020	0 / 1	102	210	102	24,1	24,8	3,0
mars	665	0 / 1	93	161	64	23,1	23,2	3,0
avril	418	0 / 1	19	165	71	21,4	21,5	2,4
mai	391	0 / 1	156	278	117	26,8	26,8	3,3
juin	458	0 / 1	50	150	78	20,3	20,5	2,3
juillet	264	0 / 1	53	120	45	14,6	14,7	1,6
août	455	0 / 1	96	161	86	26,6	26,7	2,9
septembre	575	0 / 1	115	189	75	15,9	16,1	2,2
octobre	927	0 / 1	120	237	102	33,0	33,1	4,1
novembre	1 055	0 / 1	158	324	148	45,1	45,3	5,0
décembre	611	0 / 1	35	87	23	9,8	10,5	1,0

(*) Hors conditions normales de fonctionnement selon le volume reçu en entrée de station

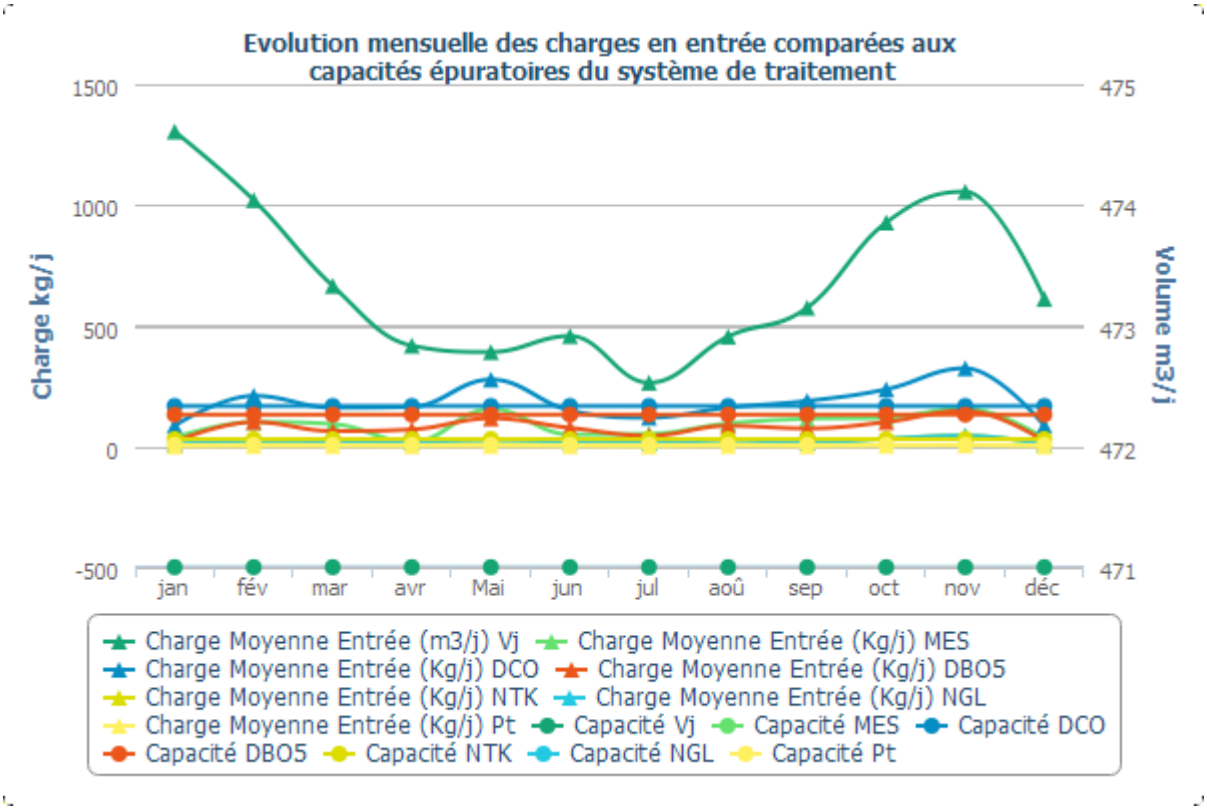



Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :


Charges en sortie et rendement	MES		DCO		DBO5		NTK		NGL		Pt	
	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%
janvier	16,60	56,22	42,10	51,83	9,51	51,37	3,10	53,60	7,10	26,64	0,70	23,67
février	11,80	88,47	32,30	84,64	7,63	92,51	4,90	79,84	6,00	75,98	0,70	75,29
mars	2,90	96,94	12,40	92,29	2,64	95,87	1,90	91,96	2,60	88,67	0,50	84,27
avril	6,80	64,53	11,80	92,84	2,27	96,80	0,60	97,34	1,10	94,88	0,40	84,10
mai	0,80	99,51	3,90	98,60	0,76	99,35	0,50	98,15	1,10	96,01	0,60	81,25
juin	1,00	98,09	6,90	95,37	0,67	99,13	0,30	98,34	0,40	97,84	0,80	66,38
juillet	0,80	98,44	3,40	97,16	0,52	98,84	0,20	98,72	1,50	89,60	0,40	74,48
août	0,90	99,03	6,60	95,89	0,83	99,04	0,50	98,26	1,00	96,43	0,70	77,44
septembre	1,20	98,99	7,10	96,27	0,93	98,76	0,50	96,79	2,20	86,63	0,50	76,51
octobre	1,80	98,48	10,40	95,60	1,83	98,20	1,00	96,95	8,00	75,83	0,80	80,45
novembre	3,10	98,05	12,20	96,23	2,36	98,40	2,20	95,23	3,90	91,44	0,70	86,13
décembre	1,80	95,06	4,20	95,19	1,11	95,09	0,30	96,71	2,00	80,99	0,20	83,27

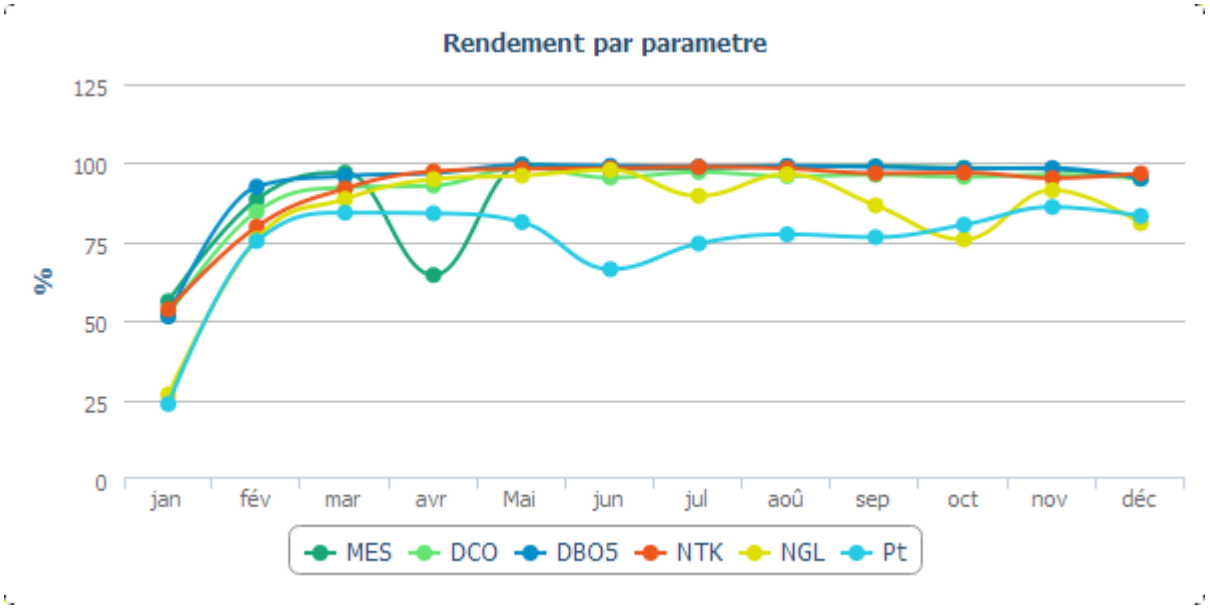



Evolution des charges et du rendement par paramètre

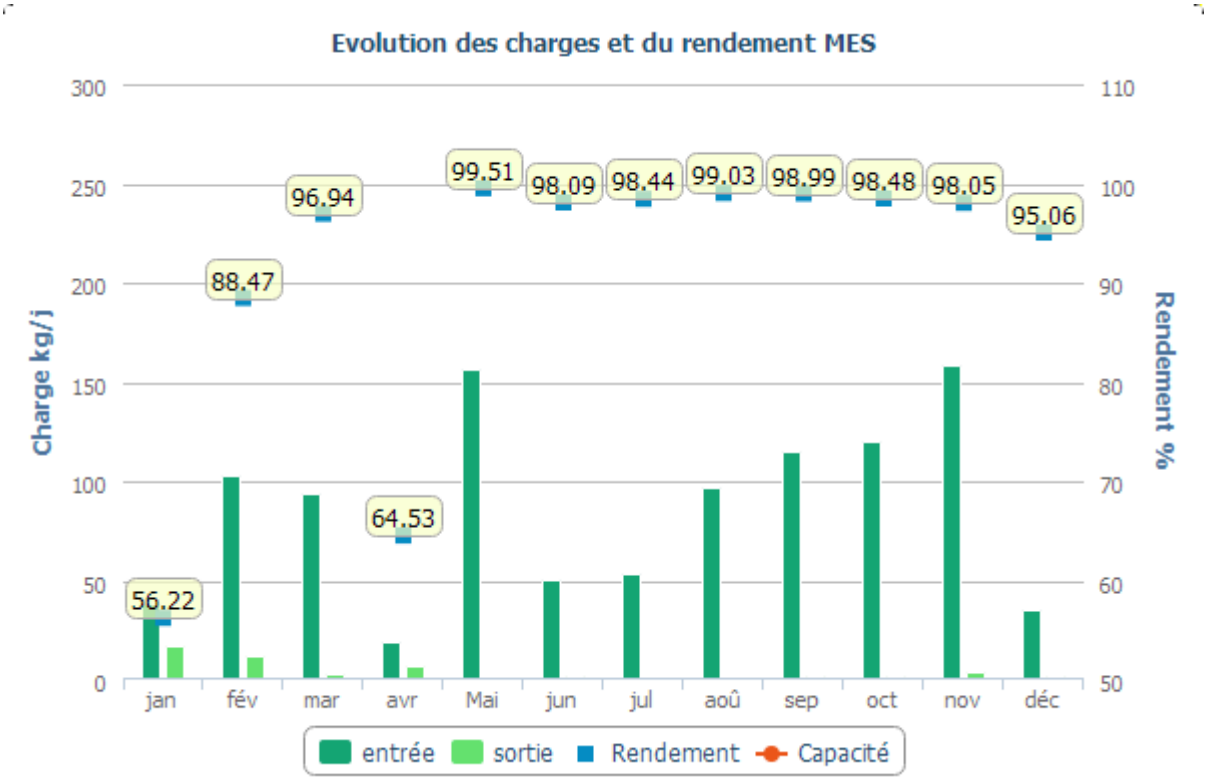

Evolution des charges et du rendement MES
Charge kg/j
Rendement %
300
250
200
150
100
50
0
110
100
90
80
70
60
50
56.22
88.47
96.94
64.53
99.51
98.09
98.44
99.03
98.99
98.48
98.05
95.06
jan
fév
mar
avr
Mai
jun
jul
aoû
sep
oct
nov
déc
entrée
sortie
Rendement
Capacité

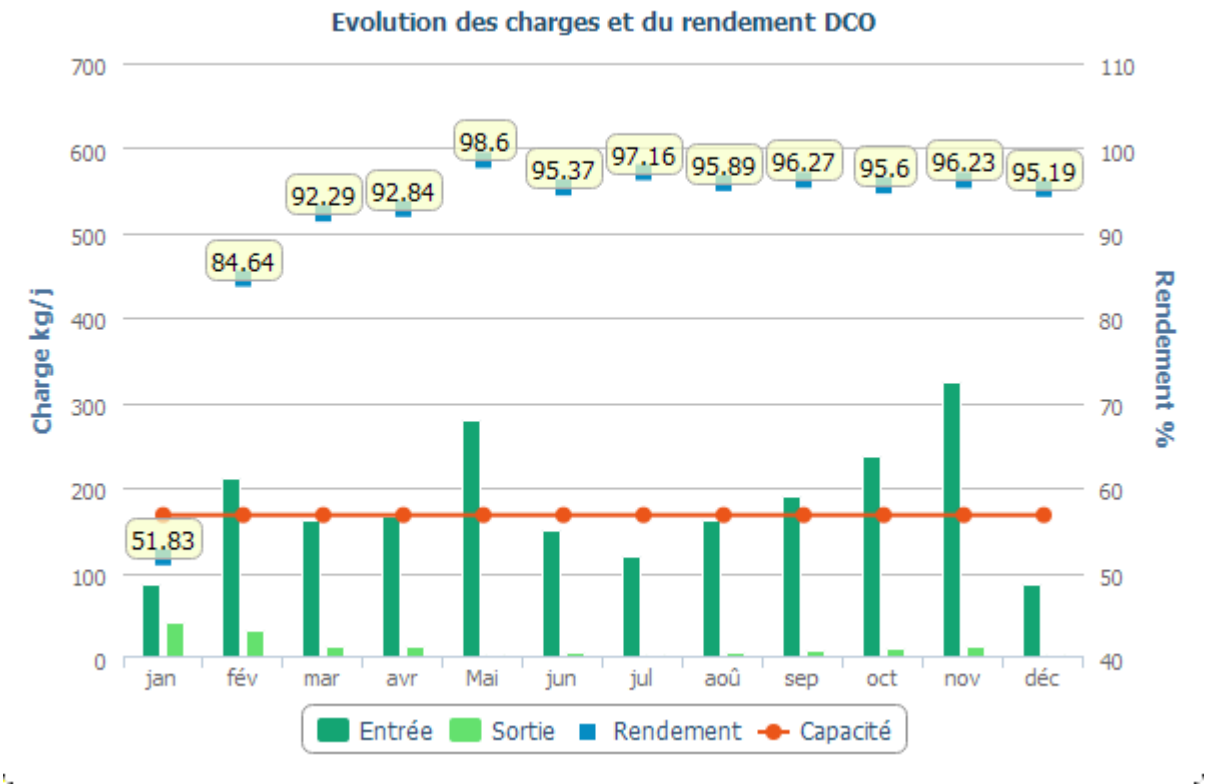
Evolution des charges et du rendement DCO
Charge kg/j
Rendement %
700
600
500
400
300
200
100
0
110
100
90
80
70
60
50
40
51.83
84.64
92.29
92.84
98.6
95.37
97.16
95.89
96.27
95.6
96.23
95.19
jan
fév
mar
avr
Mai
jun
jul
aoû
sep
oct
nov
déc
Entrée
Sortie
Rendement
Capacité

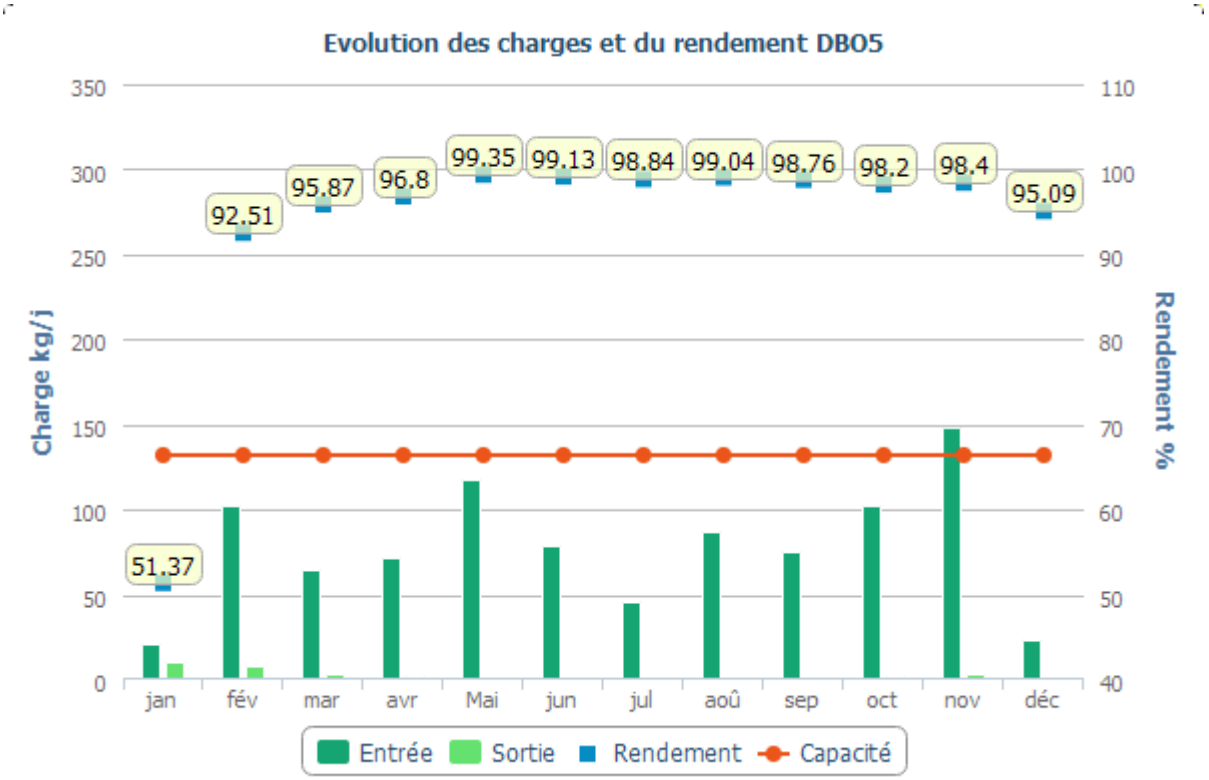

Evolution des charges et du rendement DBO5
Charge kg/j
Rendement %
350
300
250
200
150
100
50
0
110
100
90
80
70
60
50
40
92.51
95.87
96.8
99.35
99.13
98.84
99.04
98.76
98.2
98.4
95.09
51.37
jan
fév
mar
avr
Mai
jun
jul
aoû
sep
oct
nov
déc
Entrée
Sortie
Rendement
Capacité

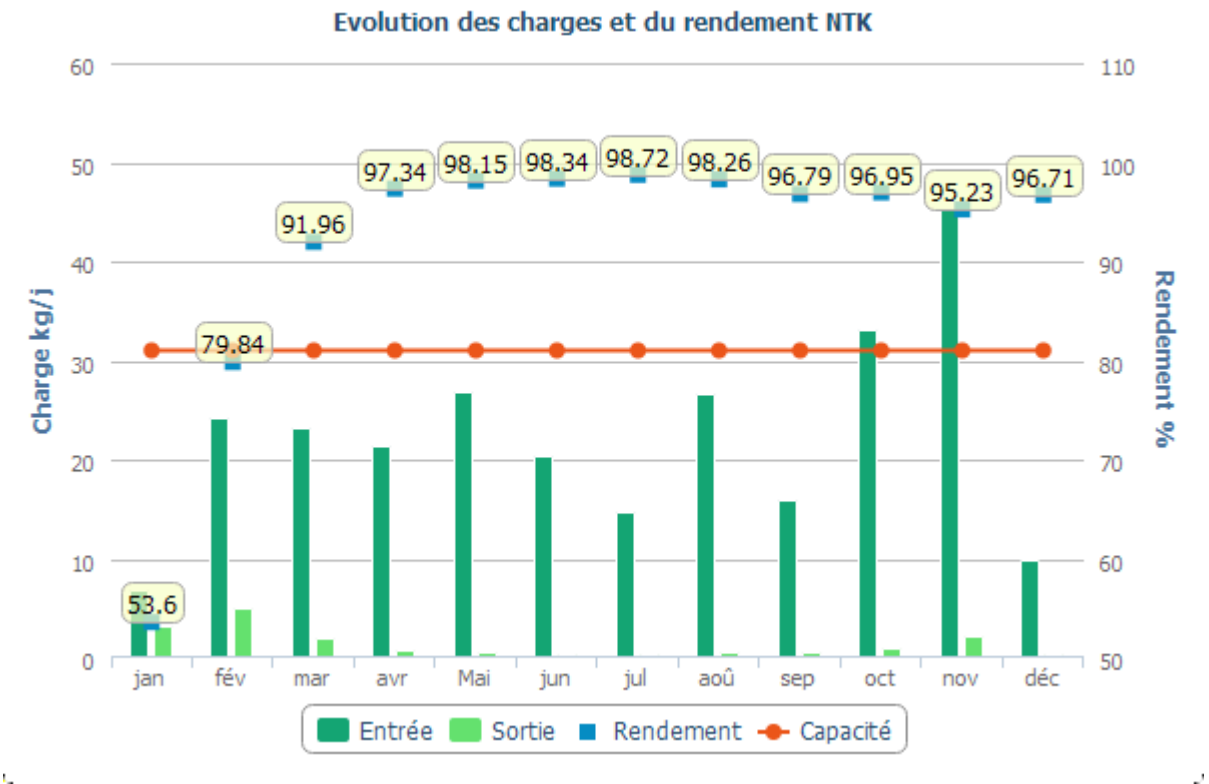
Evolution des charges et du rendement NTK
Charge kg/j
Rendement %
60
50
40
30
20
10
0
110
100
90
80
70
60
50
97.34
98.15
98.34
98.72
98.26
96.79
96.95
95.23
96.71
91.96
79.84
53.6
jan
fév
mar
avr
Mai
jun
jul
aoû
sep
oct
nov
déc
Entrée
Sortie
Rendement
Capacité

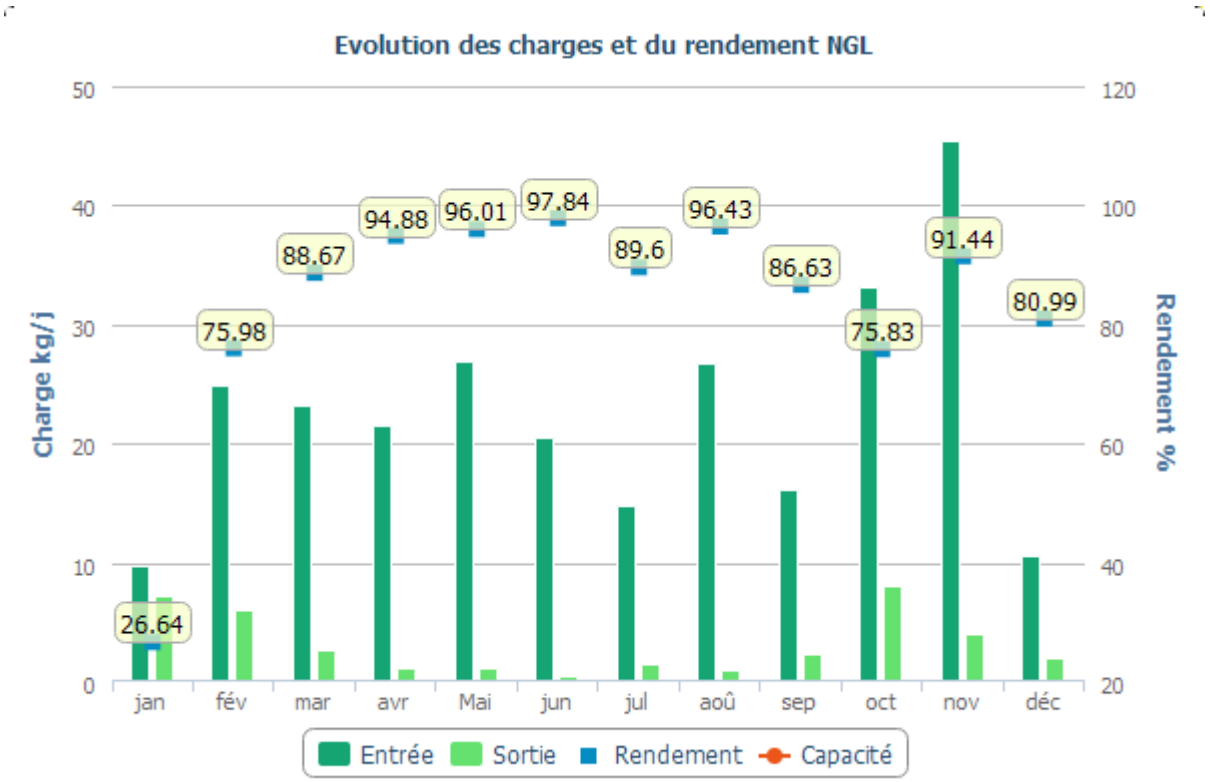

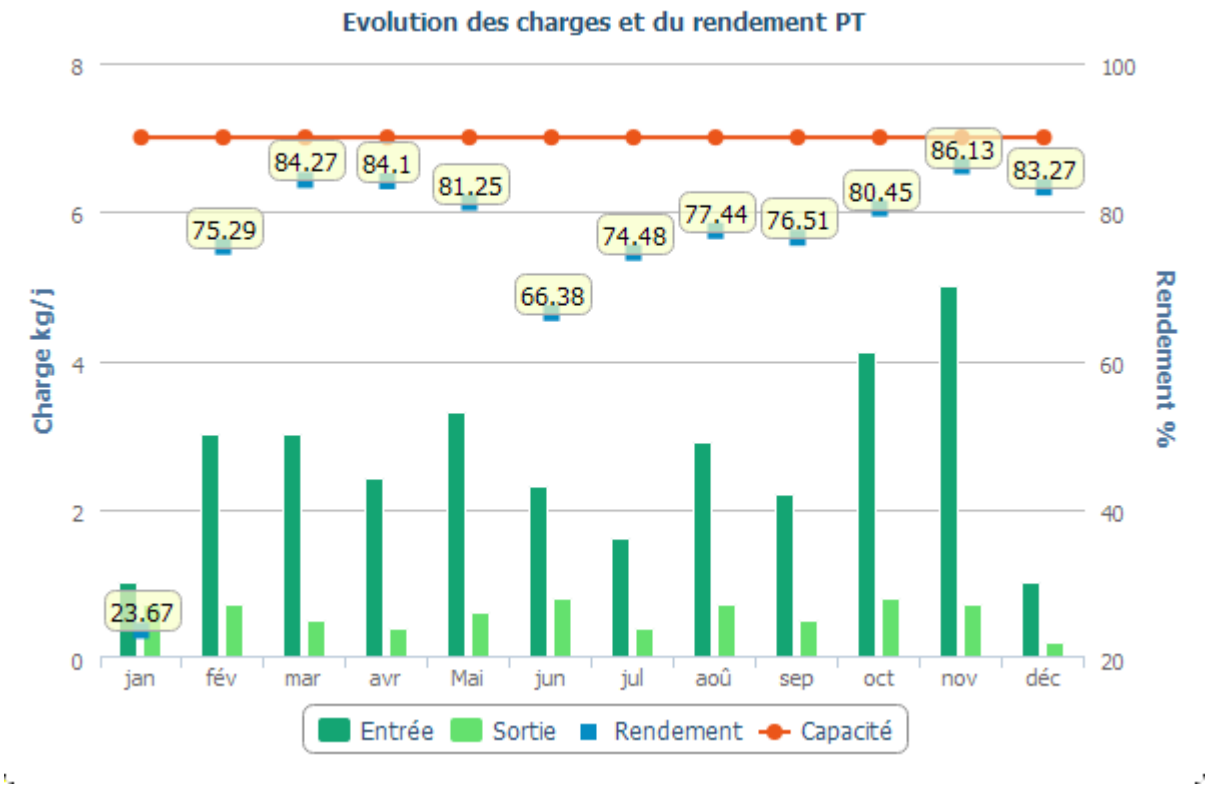

Boues évacuées par mois

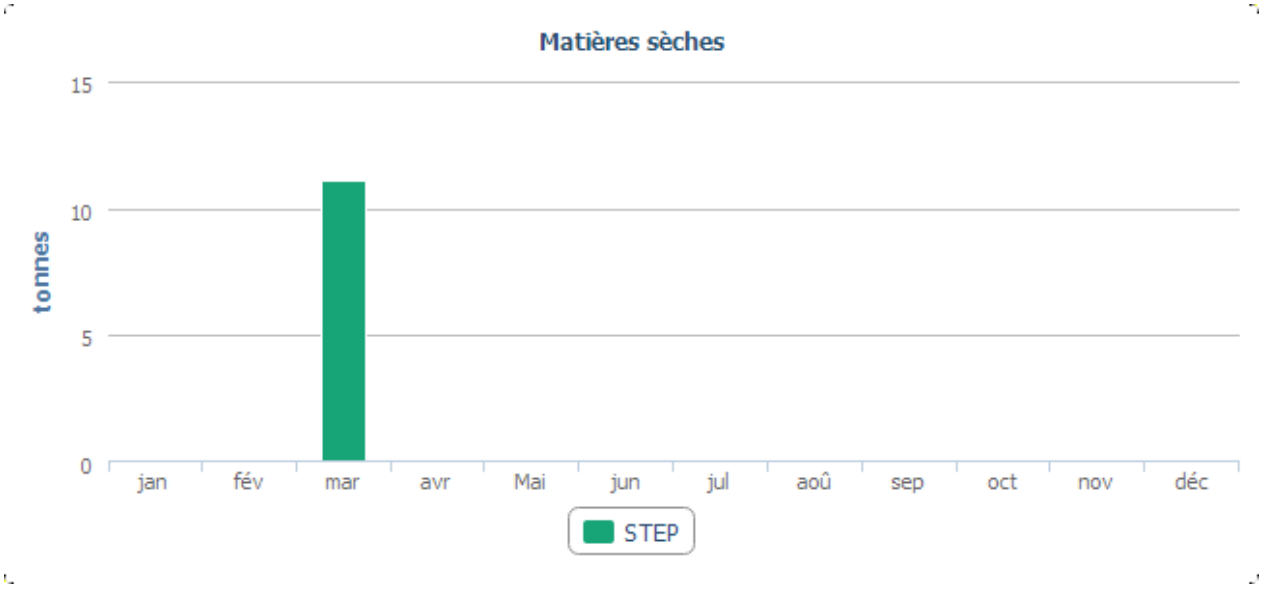

STEP ECOT

Charges entrant sur le système de traitement :


Charges entrantes et dépassement de capacité	Bilan HCNF*	Volume	MES	DCO	DBO5	NTK	NGL	Pt
		Charge (m3/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)
23/04/2025	Non	75	32,25	41,1	24,75	7,65	7,66	1,01
28/07/2025	Non	76	22,8	51,6	20,52	5,31	5,32	0,65
02/10/2025	Non	76	18,24	46,89	19,76	5,93	5,94	0,78
01/12/2025	Oui	122	19,52	45,51	29,28	7,22	7,27	0,81

* Hors conditions Normales de Fonctionnement selon le volume reçu en entrée de station

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :

Charges en sortie et rendement	MES		DCO		DBO5		NTK		NGL		Pt	
	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%
23/04/2025	3,15	90,2	6,68	83,8	1,88	92,4	4,04	47,2	4,06	47,0	0,15	85,1
28/07/2025	0,15	99,3	1,73	96,7	0,17	99,2	0,2	96,3	0,21	96,1	0,08	88,4
02/10/2025	0,46	97,5	3,04	93,5	0,3	98,5	0,86	85,5	1,1	81,5	0,06	91,8
01/12/2025	0,49	97,5	1,24	97,3	0,18	99,4	0,31	95,8	0,72	90,2	0,11	85,9

Boues évacuées par mois

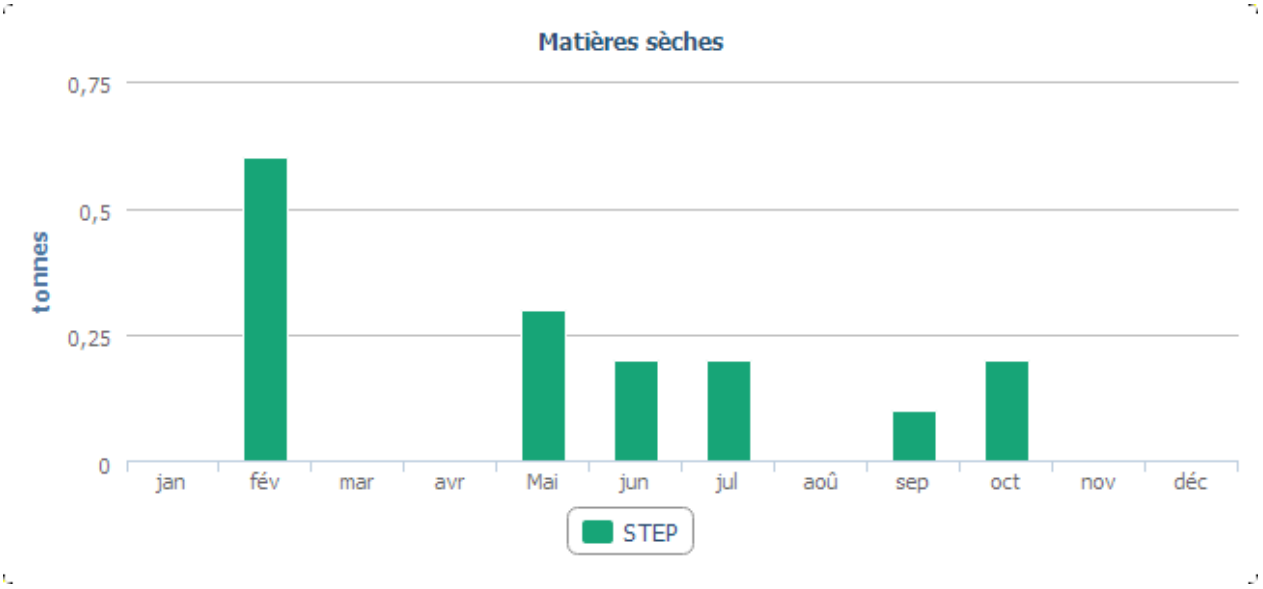

STEP FEULE Roselière

Charges entrant sur le système de traitement :

Charges entrantes et dépassement de capacité	Bilan HCNF*	Volume	MES	DCO	DBO5	NTK	NGL	Pt
		Charge (m3/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)
17/07/2025	Non	31	16,43	26,47	8,99	2,56	2,57	0,34

* Hors conditions Normales de Fonctionnement selon le volume reçu en entrée de station

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :

Charges en sortie et rendement	MES		DCO		DBO5		NTK		NGL		Pt	
	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%
17/07/2025	0,65	96,0	3,16	88,1	0,59	93,5	0,45	82,6	2,91	-13,5	0,26	25,2

STEP MONTENOIS

Charges entrant sur le système de traitement :

Charges entrantes et dépassement de capacité	Bilan HCNF*	Volume	MES	DCO	DBO5	NTK	NGL	Pt
		Charge (m3/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)
04/03/2025	Non	117,7	80,04	110,52	60,03	11,77	11,84	1,33
05/05/2025	Non	154,4	84,73	71,67	50	15,83	15,85	2,15


26/11/2025	Oui	361,5	65,07	109,53	47	12,4	13,31	1,3

* Hors conditions Normales de Fonctionnement selon le volume reçu en entrée de station

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :

Charges en sortie et rendement	MES		DCO		DBO5		NTK		NGL		Pt	
	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%
04/03/2025	0,47	99,4	2,82	97,4	0,28	99,5	0,36	96,9	0,47	96,1	0,05	95,9
05/05/2025	0,42	99,5	4,76	93,4	0,4	99,2	0,43	97,3	0,59	96,3	0,31	85,8
26/11/2025	1,08	98,3	7,99	92,7	0,76	98,4	0,47	96,2	2,11	84,1	0,1	91,9

Boues évacuées par mois

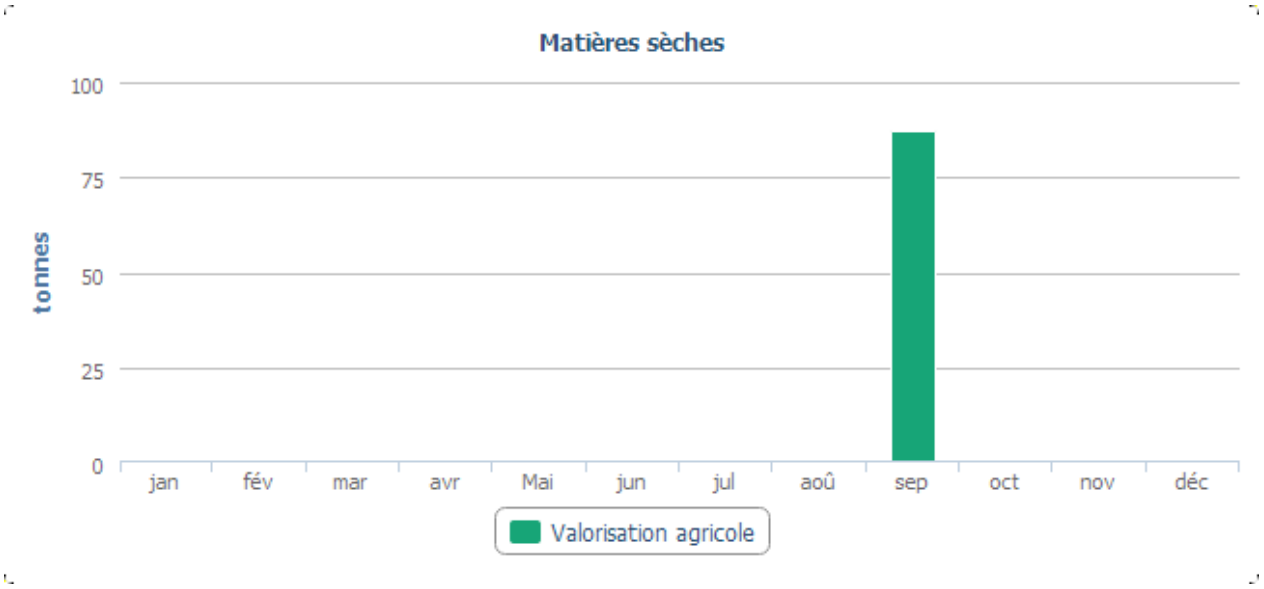


STEP PONT DE ROIDE VERMONDANS

Bilans HCNF / Bilans :

Charges entrantes et dépassement de capacité	Volume		MES	DCO	DBO5	NTK	NGL	Pt
	(m3/j)	Nbr Bilan HcNF* / nbr de bilans	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j
janvier	2 121	0 / 1	424	1 056	488	151,4	151,9	15,9
février	1 321	0 / 1	409	643	291	82,7	83,3	10,4
mars	1 048	0 / 1	409	753	356	89,1	89,2	10,8
avril	830	0 / 1	357	641	257	78,2	78,2	9,1
mai	808	0 / 1	445	1 302	437	105,9	106,0	11,9
juin	879	0 / 1	290	490	202	55,0	55,5	6,9

juillet	836	0 / 1	301	561	192	67,1	67,2	7,4
août	886	0 / 1	301	570	257	76,5	76,8	6,0
septembre	1 212	0 / 1	158	405	206	40,2	41,2	4,6
octobre	1 675	0 / 1	586	1 306	720	154,1	154,3	16,6
novembre	2 384	0 / 1	930	1 807	810	160,9	162,5	20,3
décembre	1 233	0 / 1	284	498	185	73,6	73,9	8,0


(*) Hors conditions normales de fonctionnement selon le volume reçu en entrée de station

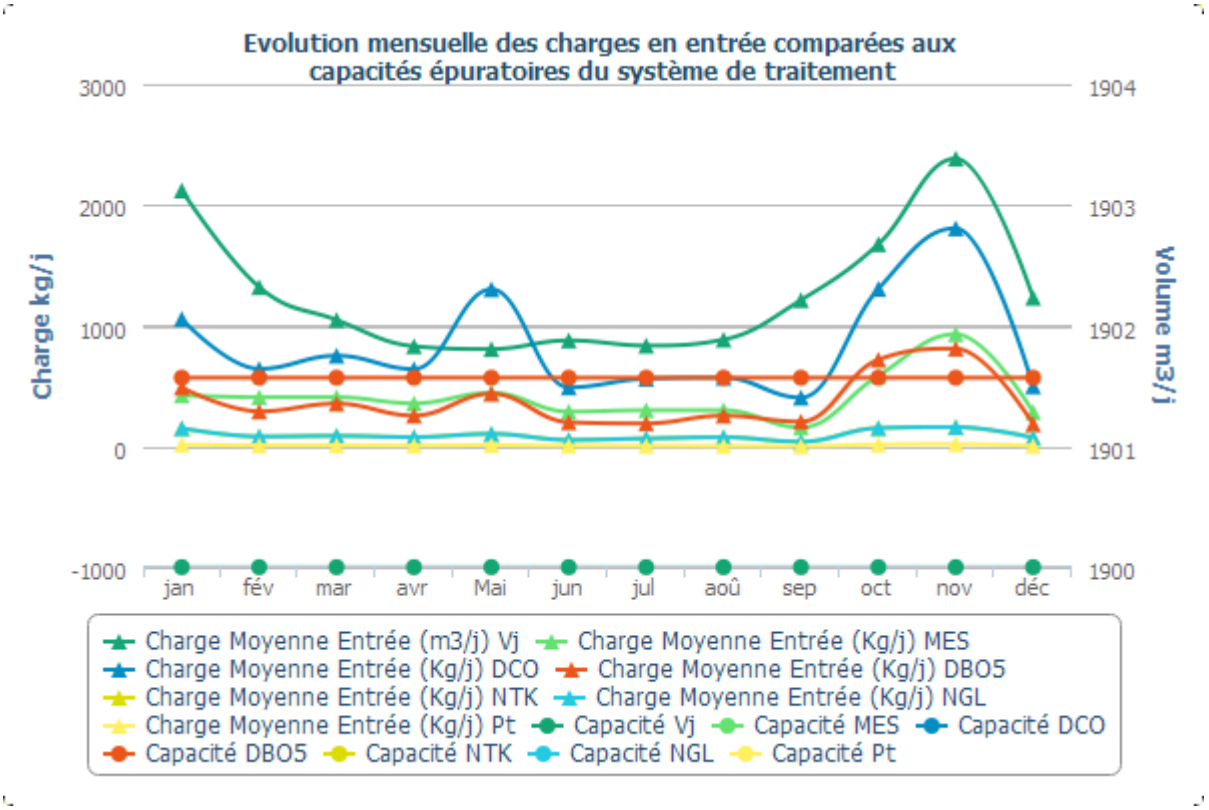


Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :


Charges en sortie et rendement	MES		DCO		DBO5		NTK		NGL		Pt	
	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%
janvier	11,10	97,38	47,00	95,55	11,98	97,54	5,80	96,19	7,20	95,26	0,80	94,84
février	18,90	95,40	37,40	94,18	4,85	98,33	3,90	95,28	4,60	94,44	2,70	74,19
mars	5,90	98,56	37,20	95,06	6,36	98,22	3,20	96,43	4,20	95,29	0,40	96,62
avril	5,00	98,61	23,60	96,32	3,39	98,68	2,20	97,14	2,60	96,66	0,30	96,55
mai	5,80	98,69	17,90	98,63	2,42	99,45	4,00	96,22	4,30	95,93	0,40	96,98
juin	1,80	99,37	9,10	98,15	1,18	99,42	1,00	98,19	1,30	97,73	0,10	99,21
juillet	1,70	99,45	19,40	96,54	1,81	99,06	1,20	98,16	2,30	96,54	1,20	83,24
août	2,60	99,14	21,50	96,23	3,37	98,69	2,30	96,95	3,00	96,04	0,60	89,40
septembre	8,80	94,41	24,50	93,94	4,40	97,86	2,40	94,06	3,40	91,67	1,90	59,03


octobre	7,00	98,81	50,00	96,17	7,82	98,91	4,00	97,41	4,50	97,10	3,10	81,14
novembre	7,50	99,20	57,00	96,85	8,95	98,90	6,50	95,98	8,70	94,62	1,20	93,99
décembre	10,60	96,25	32,20	93,54	6,11	96,70	3,50	95,31	5,60	92,41	0,80	89,56

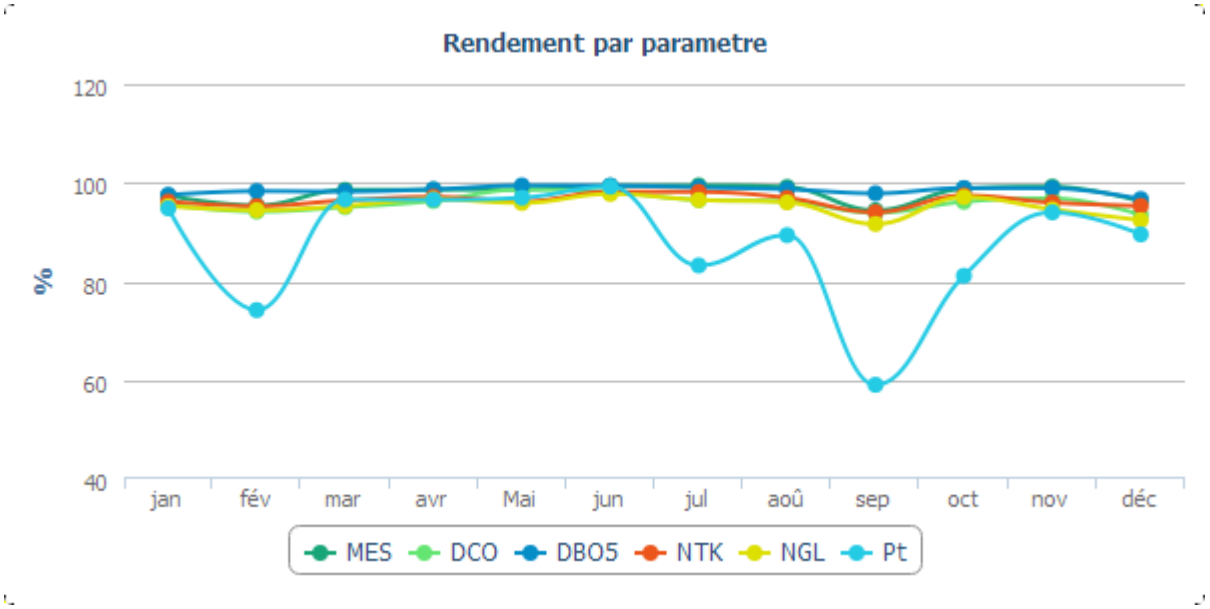



Evolution des charges et du rendement par paramètre

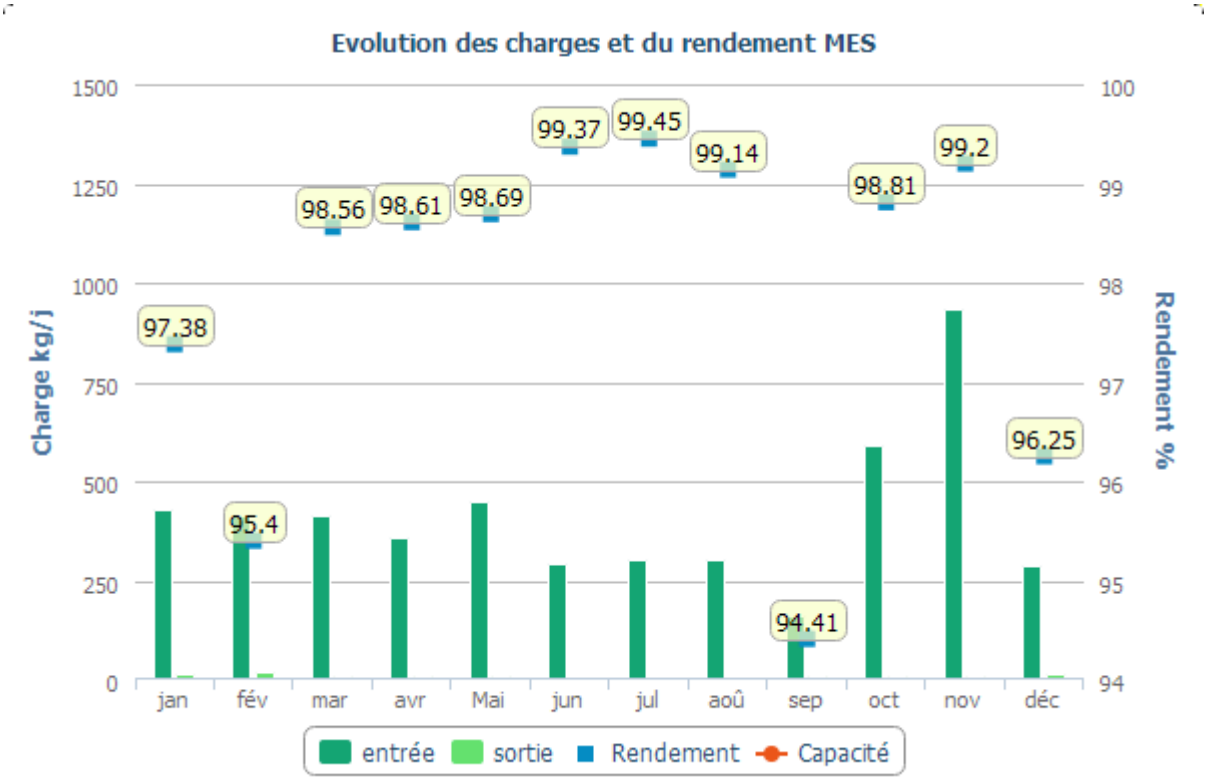

Evolution des charges et du rendement MES
Charge kg/j
Rendement %
1500
1250
1000
750
500
250
0
100
99
98
97
96
95
94
97,38
95,4
98,56
98,61
98,69
99,37
99,45
99,14
98,81
99,2
94,41
96,25
jan
fév
mar
avr
Mai
jun
jul
aoû
sep
oct
nov
déc
entrée
sortie
Rendement
Capacité

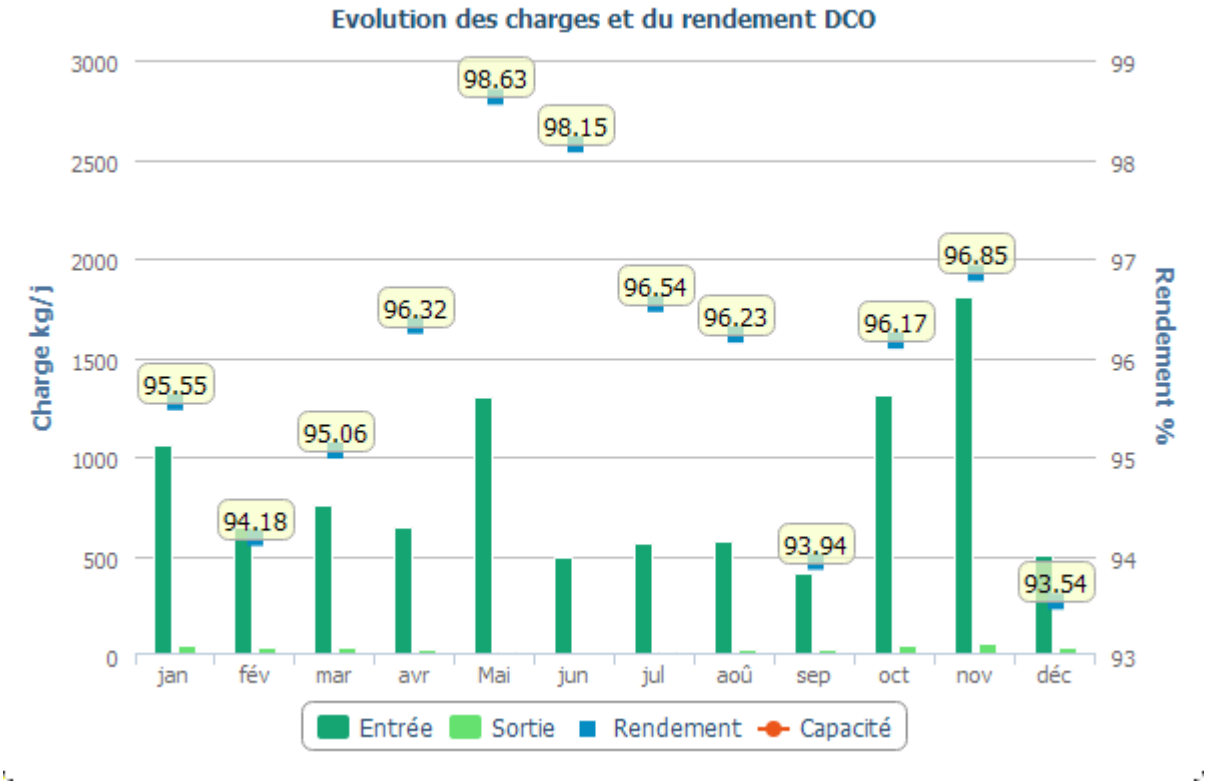
Evolution des charges et du rendement DCO
Charge kg/j
Rendement %
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
99
98
97
96
95
94
93
95,55
94,18
95,06
96,32
98,63
98,15
96,54
96,23
93,94
96,17
96,85
93,54
jan
fév
mar
avr
Mai
jun
jul
aoû
sep
oct
nov
déc
Entrée
Sortie
Rendement
Capacité

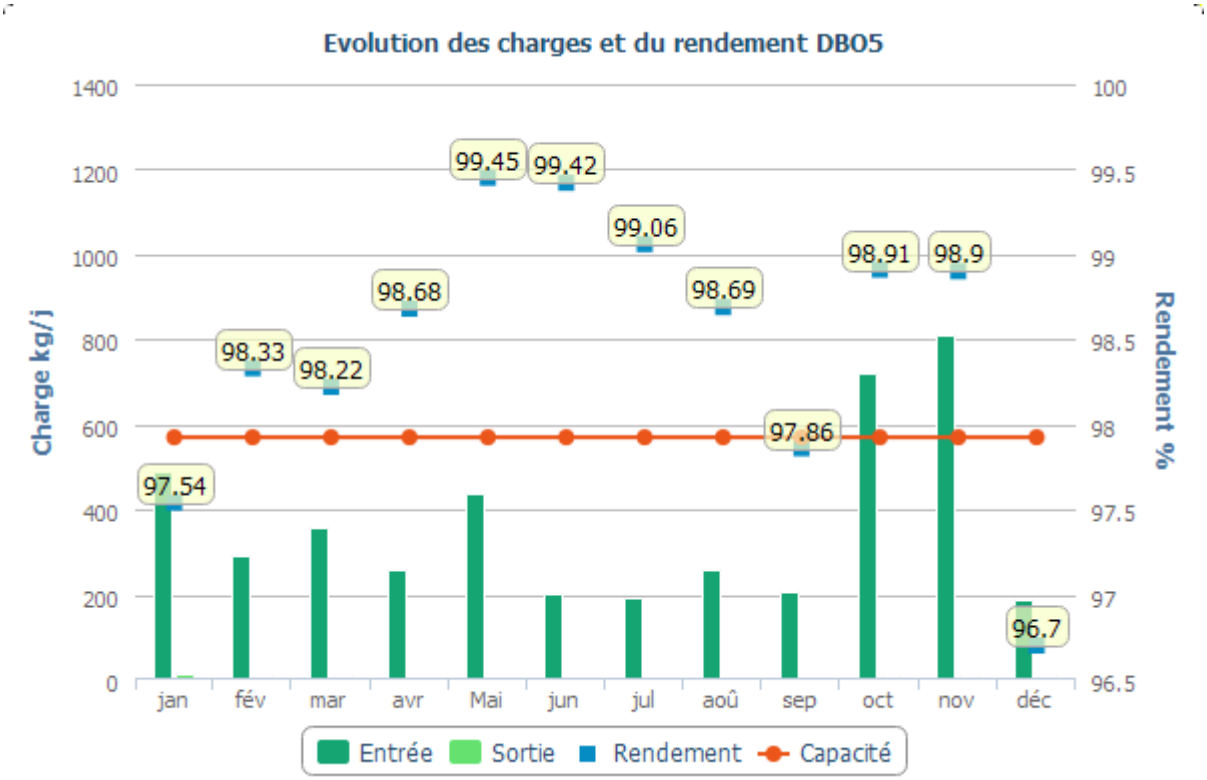

Evolution des charges et du rendement DBO5
Charge kg/j
Rendement %
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
100
99.5
99
98.5
98
97.5
97
96.5
99.45
99.42
99.06
98.91
98.9
98.68
98.69
98.33
98.22
97.86
97.54
96.7
jan
fév
mar
avr
Mai
jun
jul
aoû
sep
oct
nov
déc
Entrée
Sortie
Rendement
Capacité

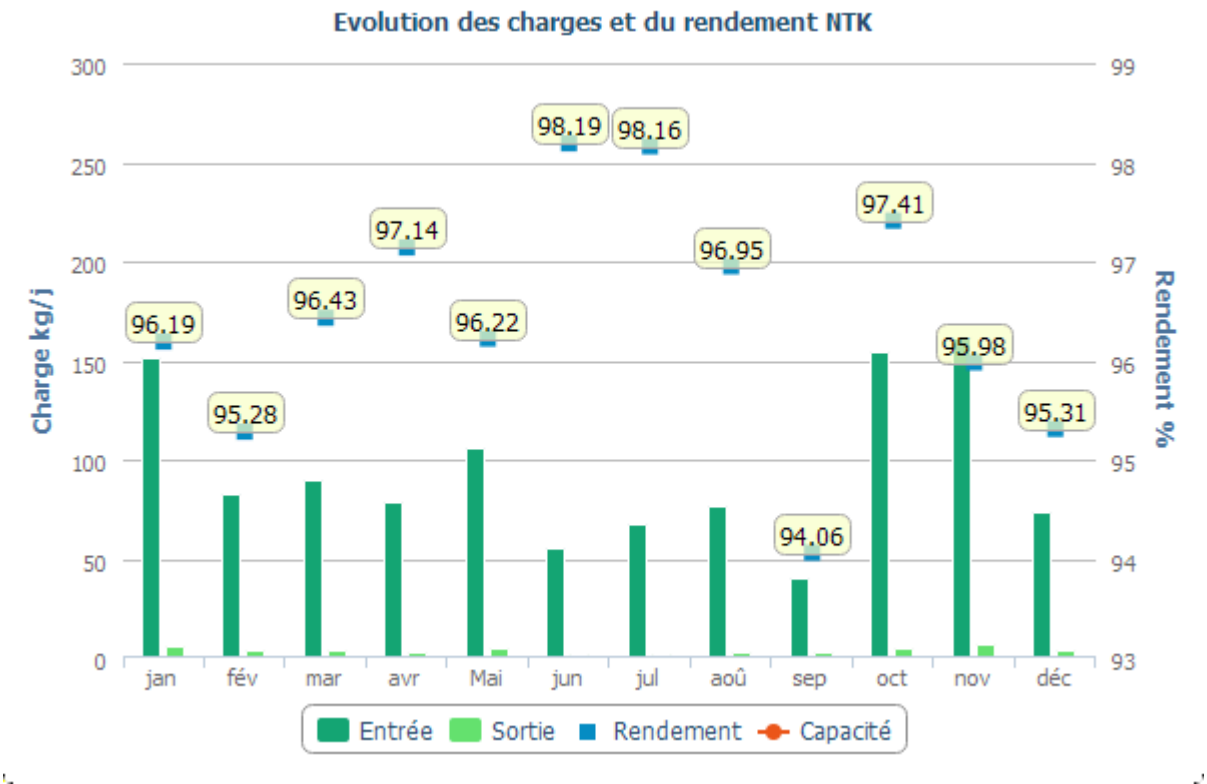
Evolution des charges et du rendement NTK
Charge kg/j
Rendement %
300
250
200
150
100
50
0
99
98
97
96
95
94
93
98.19
98.16
97.41
97.14
96.95
96.43
96.22
96.19
95.98
95.31
95.28
94.06
jan
fév
mar
avr
Mai
jun
jul
aoû
sep
oct
nov
déc
Entrée
Sortie
Rendement
Capacité

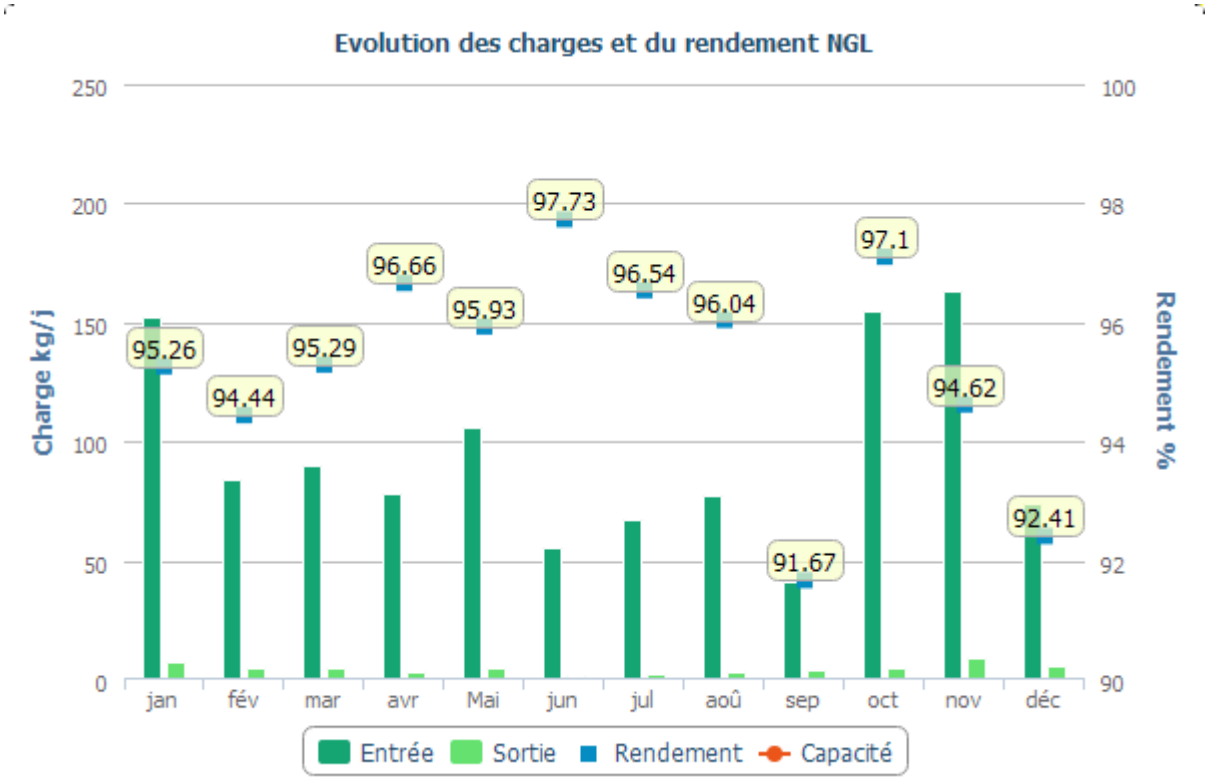

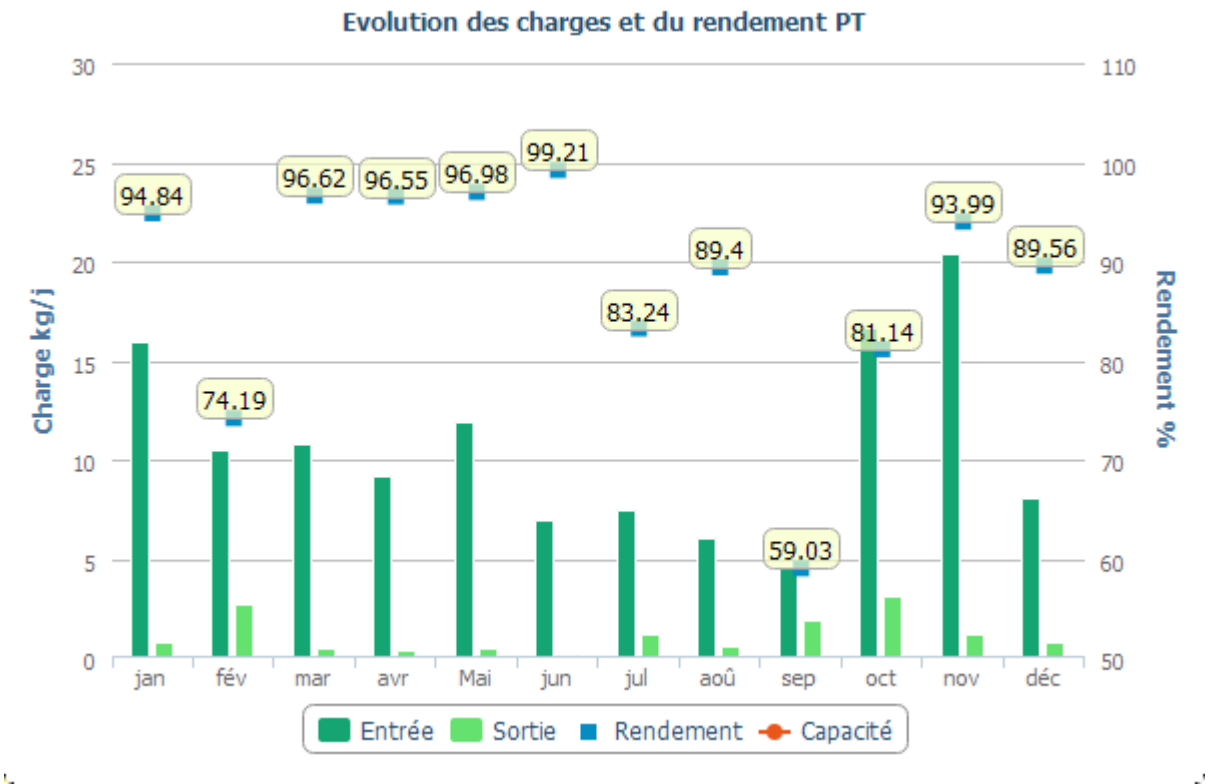

Boues évacuées par mois

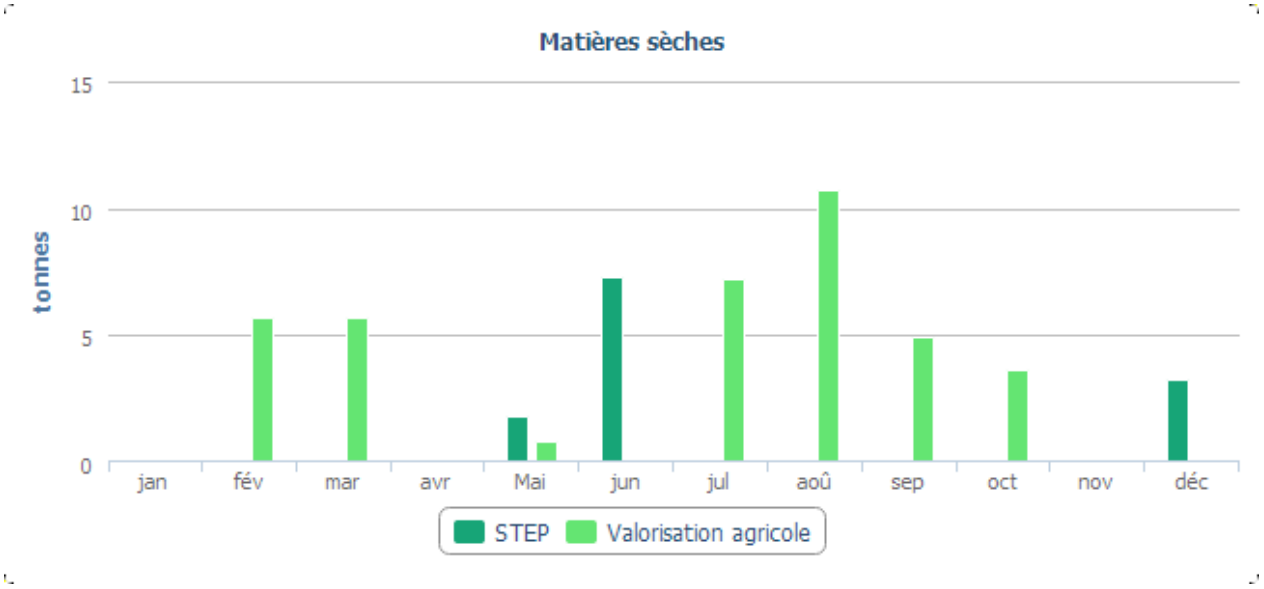

STEP ROCHES BLAMONT RIZOSPHÈRE

Charges entrant sur le système de traitement :

Charges entrantes et dépassement de capacité	Bilan HCNF*	Volume	MES	DCO	DBO5	NTK	NGL	Pt
		Charge (m3/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)

* Hors conditions Normales de Fonctionnement selon le volume reçu en entrée de station

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :

Charges en sortie et rendement	MES		DCO		DBO5		NTK		NGL		Pt	
	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%

STEP ROCHES LES BLAMONT

Charges entrant sur le système de traitement :


Charges entrantes et dépassement de capacité	Bilan HCNF*	Volume	MES	DCO	DBO5	NTK	NGL	Pt
		Charge (m3/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)
15/04/2025	Non	161,44	22,6	35,03	11,79	4,29	4,5	0,58
25/06/2025	Non	130,86	45,8	102,73	30,1	10,02	10,04	1,39
28/10/2025	Non	119	6,19	19,64	8,21	4,51	4,72	0,36

* Hors conditions Normales de Fonctionnement selon le volume reçu en entrée de station

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :

Charges en sortie et rendement	MES		DCO		DBO5		NTK		NGL		Pt	
	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%
15/04/2025	1,78	92,1	6,17	82,4	0,65	94,5	1,82	57,5	2	55,4	0,26	55,6
25/06/2025	0,39	99,1	2,29	97,8	0,38	98,7	0,3	97,0	1,04	89,6	0,16	88,7
28/10/2025	0,24	96,2	1,17	94,1	0,18	97,8	0,18	96,0	1,94	58,8	0,09	75,7

Boues évacuées par mois

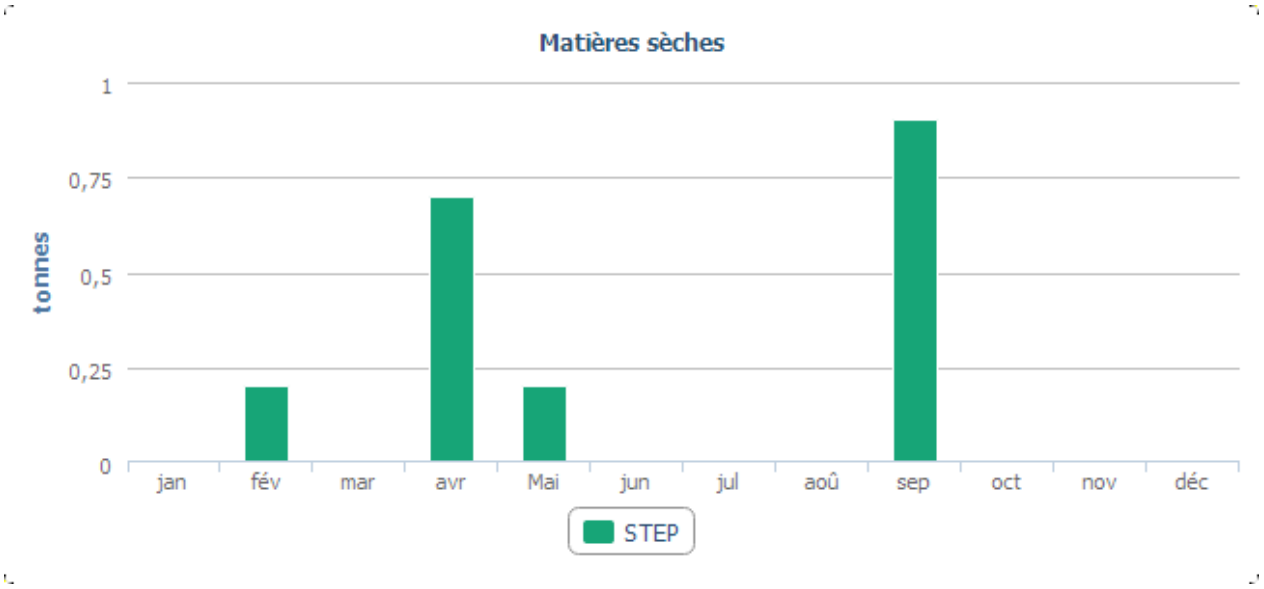

STEP SAINT MAURICE COLOMBIER

Charges entrant sur le système de traitement :

Charges entrantes et dépassement de capacité	Bilan HCNF*	Volume	MES	DCO	DBO5	NTK	NGL	Pt
		Charge (m3/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)
10/02/2025	Non	200,88	68,3	91,2	44,19	11,51	11,56	1,83
10/09/2025	Non	94,73	17,05	37,42	16,1	6,17	6,18	0,63


* Hors conditions Normales de Fonctionnement selon le volume reçu en entrée de station

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :

Charges en sortie et rendement	MES		DCO		DBO5		NTK		NGL		Pt	
	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%
10/02/2025	0,6	99,1	6,49	92,9	0,6	98,6	0,4	96,5	2,22	80,8	0,48	73,6

10/09/2025	0,19	98,9	1,57	95,8	0,17	98,9	0,21	96,6	0,41	93,3	0,45	28,8

Boues évacuées par mois

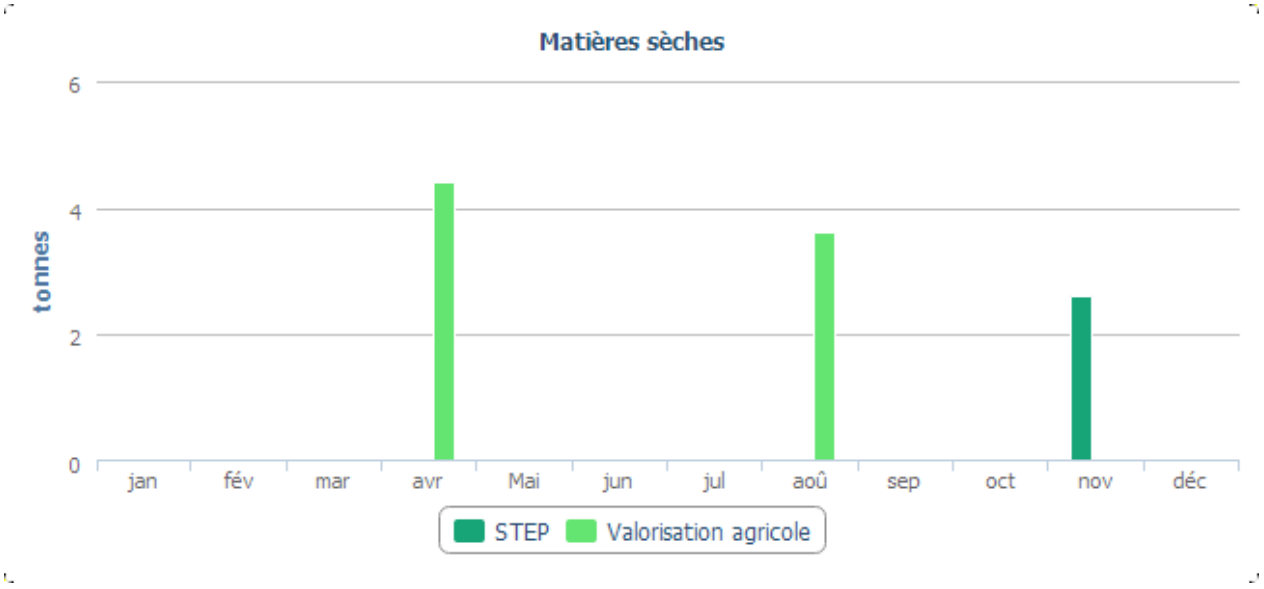

STEP SAINT MAURICE ECHELOTTE

Charges entrant sur le système de traitement :

Charges entrantes et dépassement de capacité	Bilan HCNF*	Volume	MES	DCO	DBO5	NTK	NGL	Pt
		Charge (m3/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)

* Hors conditions Normales de Fonctionnement selon le volume reçu en entrée de station

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :

Charges en sortie et rendement	MES		DCO		DBO5		NTK		NGL		Pt	
	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%

STEP SAINTE MARIE

Charges entrant sur le système de traitement :

Charges entrantes et dépassement de capacité	Bilan HCNF*	Volume	MES	DCO	DBO5	NTK	NGL	Pt
		Charge (m3/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)
13/03/2025	Non	110	27,5	77,33	19,8	6,15	6,29	0,56


07/10/2025	Non	115	12,65	52,9	24,15	9,73	9,76	1,06

* Hors conditions Normales de Fonctionnement selon le volume reçu en entrée de station

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :

Charges en sortie et rendement	MES		DCO		DBO5		NTK		NGL		Pt	
	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%
13/03/2025	0,22	99,2	1,65	97,9	0,24	98,8	0,29	95,4	0,42	93,3	0,32	43,1
07/10/2025	0,46	96,4	1,9	96,4	0,41	98,3	0,33	96,6	0,51	94,8	0,39	63,0

Boues évacuées par mois

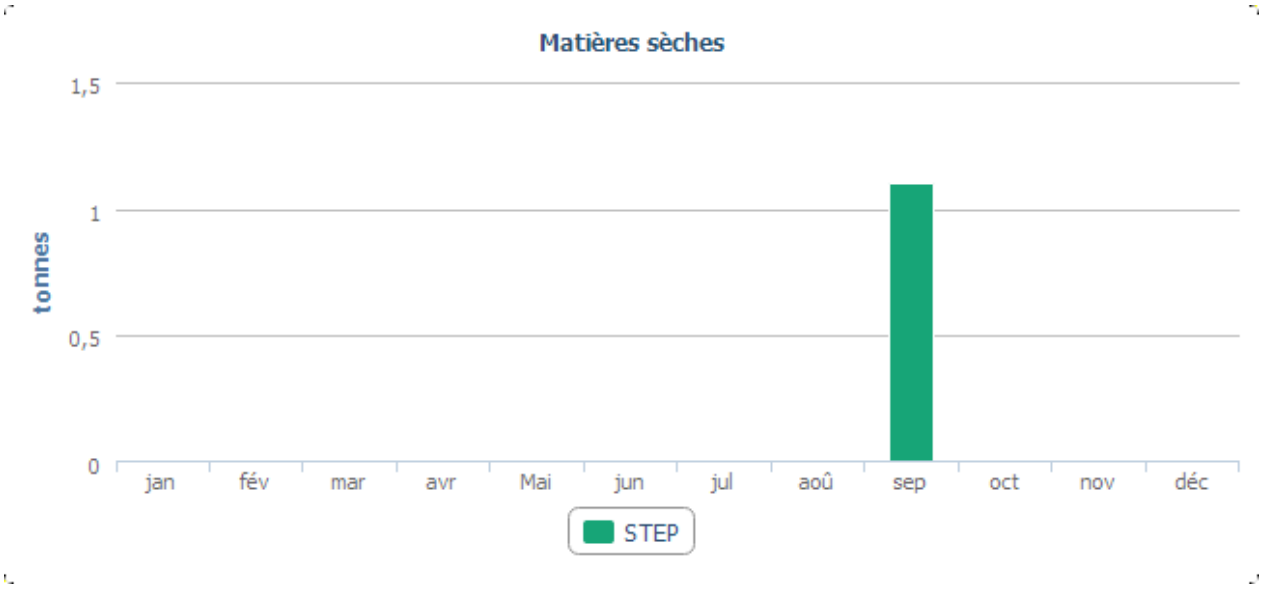

STEP VILLARS LES BLAMONT Rhizo

Charges entrant sur le système de traitement :

Charges entrantes et dépassement de capacité	Bilan HCNF*	Volume	MES	DCO	DBO5	NTK	NGL	Pt
		Charge (m3/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)	Charge (kg/j)
25/07/2025	Non	68	12,92	36,24	10,2	4,45	4,54	0,48

* Hors conditions Normales de Fonctionnement selon le volume reçu en entrée de station

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :


Charges en sortie et rendement	MES		DCO		DBO5		NTK		NGL		Pt	
	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%
25/07/2025	0,2	98,4	2,27	93,7	0,24	97,7	0,1	97,7	4,73	-4,1	0,61	-26,8

UDEP ARBOUANS

Bilans HCNF / Bilans :


Charges entrantes et dépassement de capacité	Volume		MES	DCO	DBO5	NTK	NGL	Pt
	(m3/j)	Nbr Bilan HcNF* / nbr de bilans	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j
janvier	18 137	2 / 9	2 406	4 260	1 815	432,1	432,1	51,2
février	12 054	0 / 9	2 612	4 581	1 988	429,8	429,8	50,1
mars	10 192	0 / 10	2 955	5 239	2 551	582,0	582,0	72,2
avril	7 968	0 / 8	2 891	5 232	2 498	539,4	539,4	72,8
mai	7 451	0 / 5	2 976	6 300	2 005	409,3	409,3	63,7
juin	9 289	0 / 10	2 779	4 966	1 894	595,0	595,0	62,1
juillet	6 805	0 / 9	2 693	4 778	1 552	426,1	426,1	53,9
août	7 667	0 / 9	2 425	3 872	1 702	523,9	523,9	64,2
septembre	9 966	0 / 10	2 308	4 124	1 641	420,9	420,9	47,0
octobre	13 412	1 / 9	1 742	3 828	1 667	509,1	509,1	67,3
novembre	18 654	3 / 8	1 775	3 443	1 520	257,9	257,9	33,5
décembre	11 785	0 / 9	1 700	3 328	1 399	368,0	368,0	41,8

(*) Hors conditions normales de fonctionnement selon le volume reçu en entrée de station

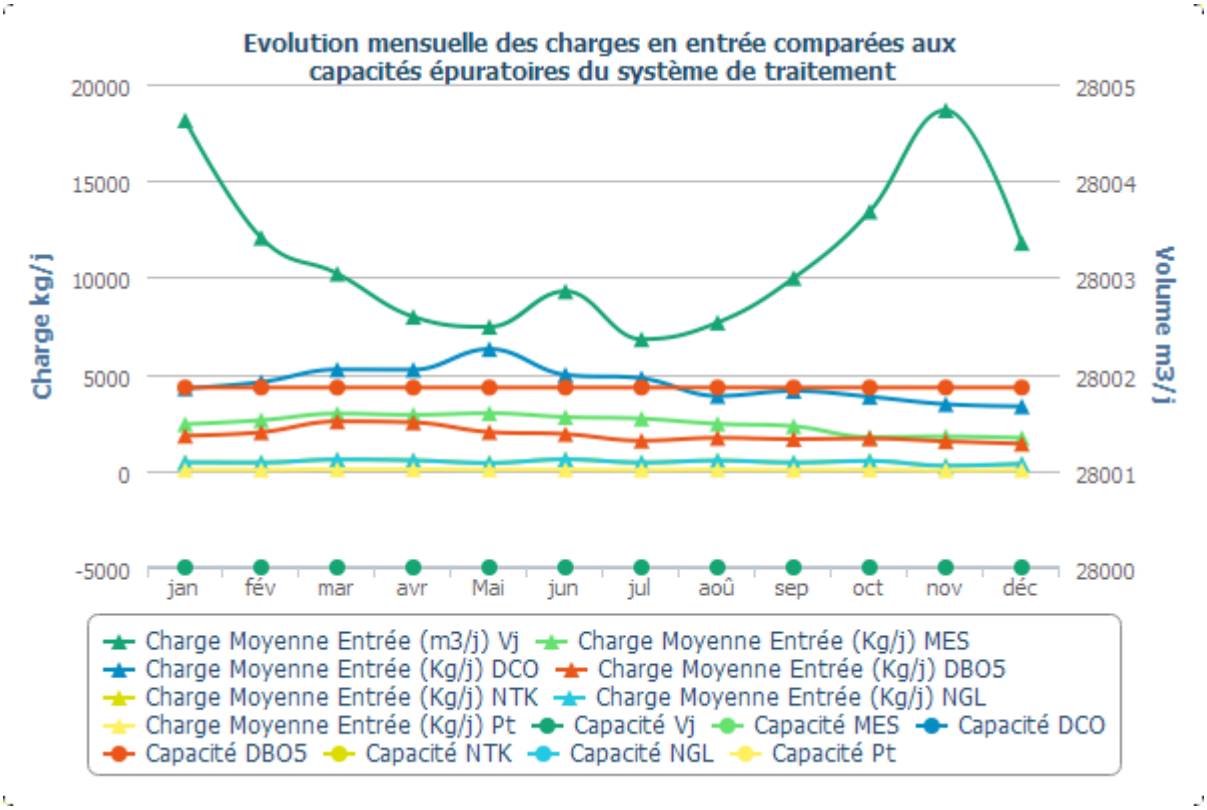



Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :


Charges en sortie et rendement	MES		DCO		DBO5		NTK		NGL		Pt	
	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%
janvier	83,90	96,51	284,40	93,32	60,10	96,69	76,80	82,22	103,70	76,01	5,10	90,00
février	44,20	98,31	255,90	94,41	32,36	98,37	32,80	92,37	55,90	87,00	7,50	85,13
mars	35,40	98,80	234,50	95,52	29,36	98,85	29,00	95,01	41,90	92,80	5,30	92,73
avril	52,10	98,20	248,90	95,24	34,85	98,61	38,80	92,81	42,70	92,09	8,60	88,19
mai	65,10	97,81	236,70	96,24	36,18	98,20	40,60	90,09	43,20	89,44	5,80	90,85
juin	71,00	97,45	281,00	94,34	39,93	97,89	32,00	94,61	34,70	94,17	6,40	89,73
juillet	52,10	98,07	212,20	95,56	26,18	98,31	34,40	91,94	36,60	91,42	3,70	93,10
août	47,60	98,04	209,50	94,59	29,90	98,24	51,70	90,13	59,90	88,58	5,50	91,37
septembre	35,40	98,46	218,80	94,70	24,86	98,49	41,30	90,18	67,10	84,05	9,10	80,67
octobre	53,80	96,91	302,60	92,09	45,99	97,24	59,50	88,32	100,60	80,24	5,40	92,04
novembre	93,70	94,72	310,40	90,98	62,04	95,92	44,90	82,60	79,10	69,33	11,10	66,97
décembre	53,90	96,83	218,30	93,44	33,87	97,58	67,40	81,68	92,40	74,89	5,00	88,05

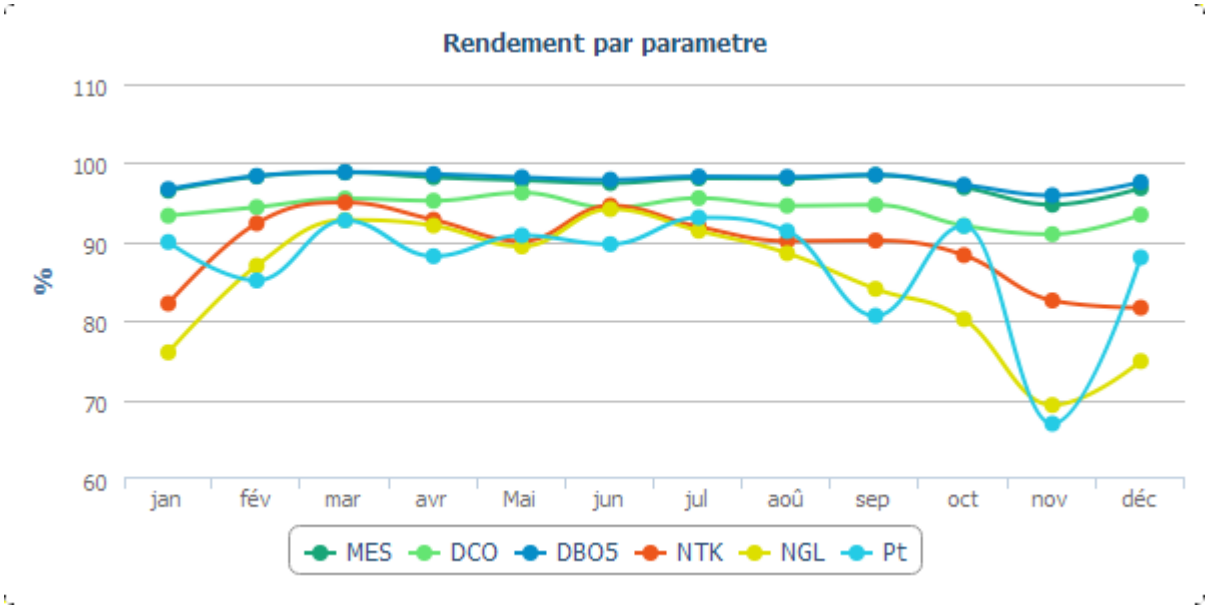



Evolution des charges et du rendement par paramètre

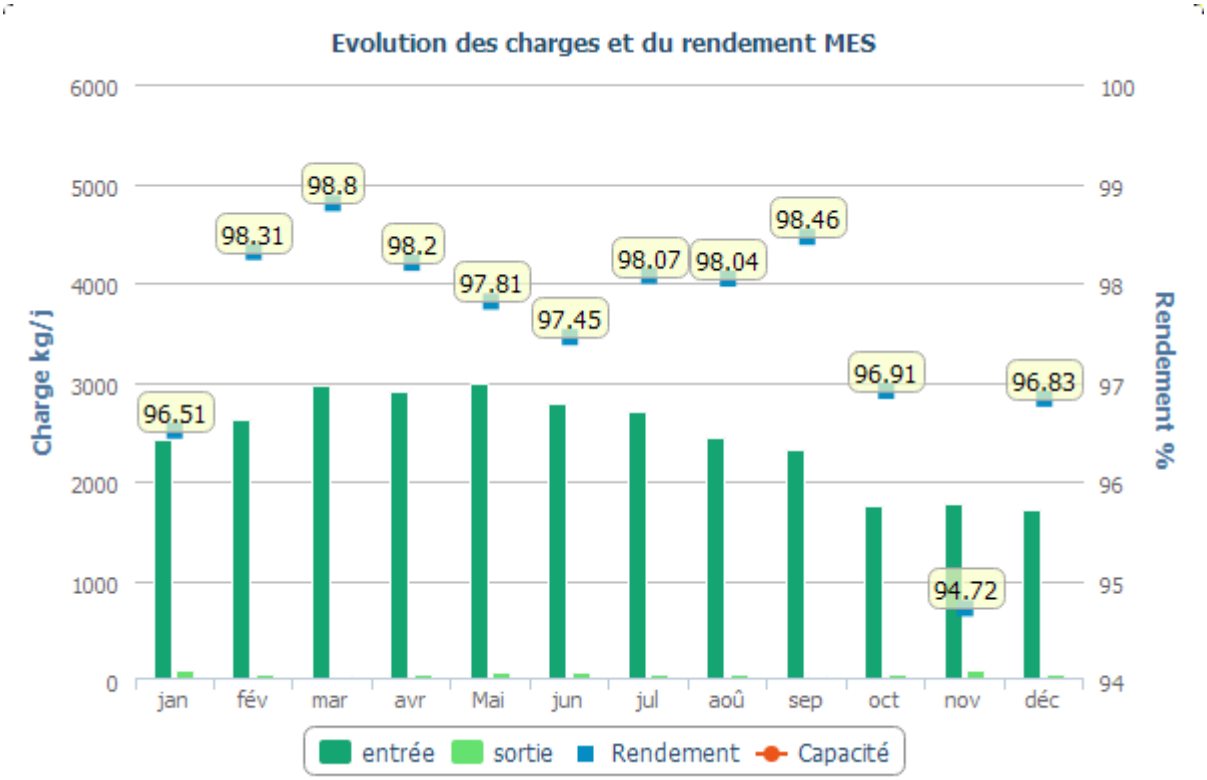

Evolution des charges et du rendement MES
Charge kg/j
Rendement %
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
100
99
98
97
96
95
94
98,31
98,8
98,2
97,81
97,45
98,07
98,04
98,46
96,51
96,91
96,83
94,72
jan
fév
mar
avr
Mai
jun
jul
aoû
sep
oct
nov
déc
entrée
sortie
Rendement
Capacité

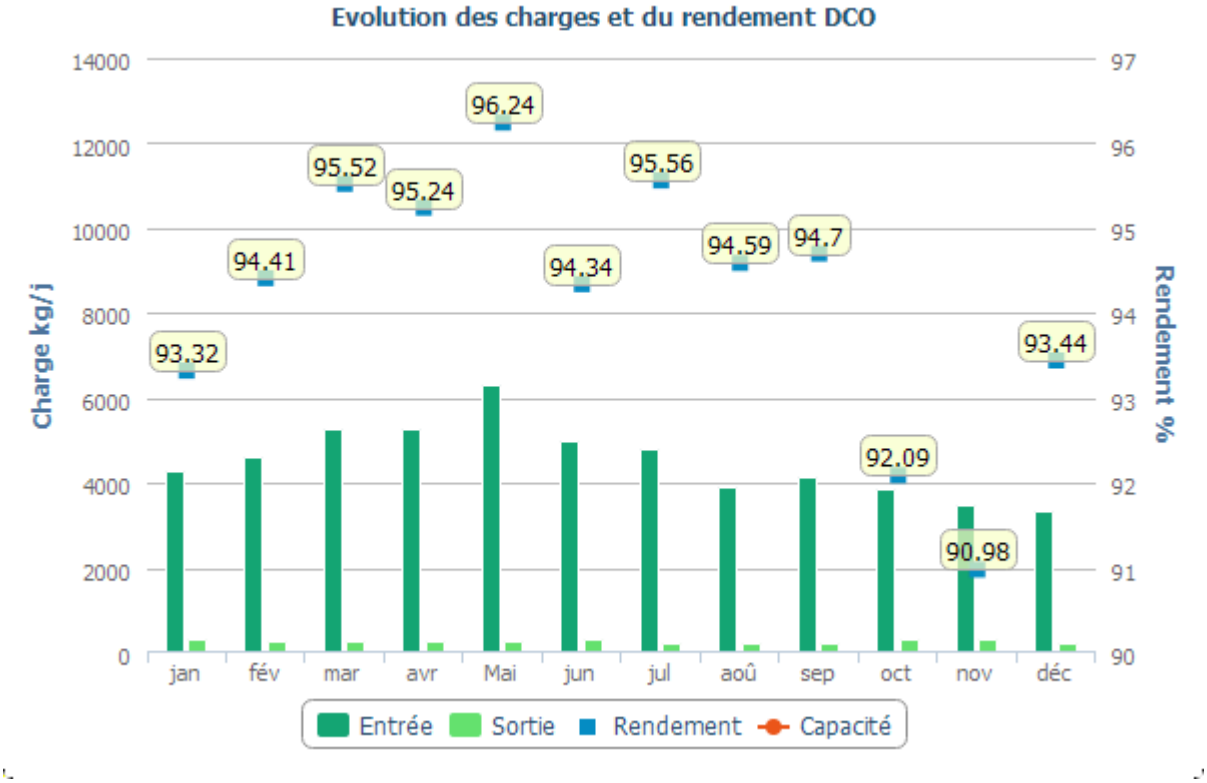
Evolution des charges et du rendement DCO
Charge kg/j
Rendement %
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
97
96
95
94
93
92
91
90
96,24
95,52
95,24
95,56
94,41
94,34
94,59
94,7
93,32
93,44
92,09
90,98
jan
fév
mar
avr
Mai
jun
jul
aoû
sep
oct
nov
déc
Entrée
Sortie
Rendement
Capacité

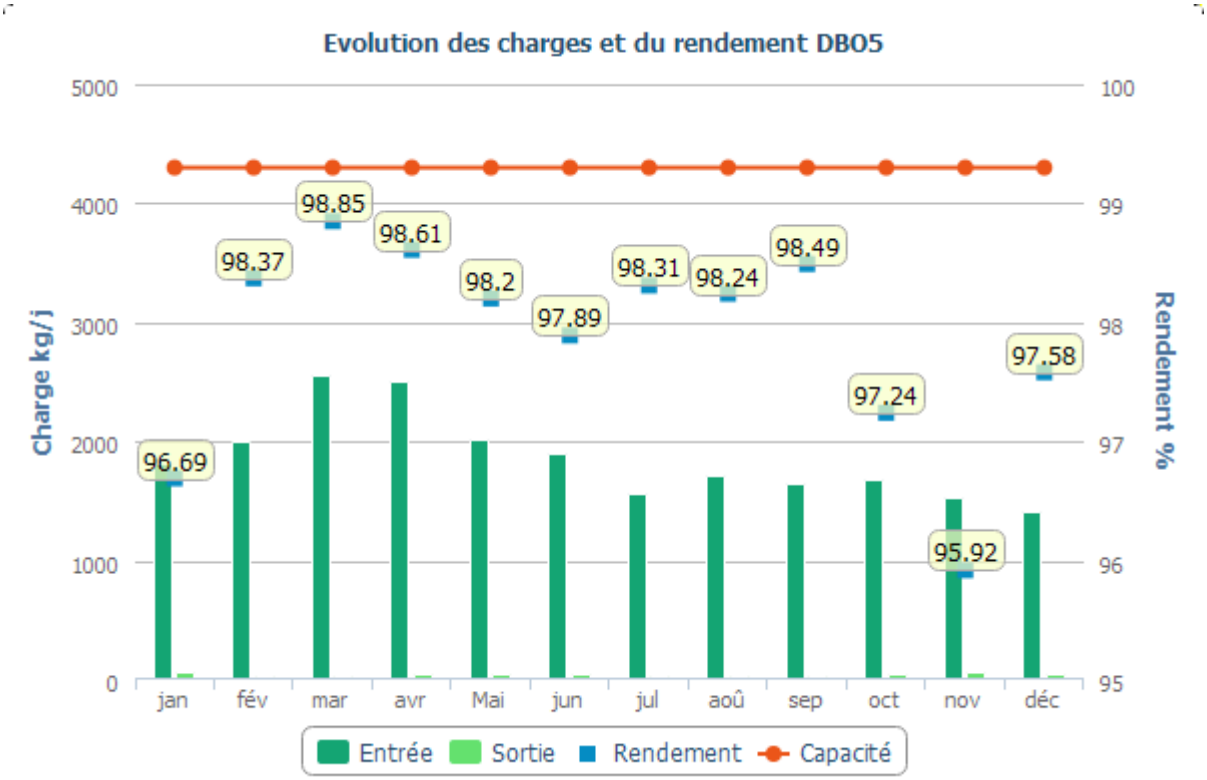

Evolution des charges et du rendement DBO5
Charge kg/j
Rendement %
5000
4000
3000
2000
1000
0
100
99
98
97
96
95
98,37
98,85
98,61
98,2
97,89
98,31
98,24
98,49
97,24
97,58
96,69
95,92
jan
fév
mar
avr
Mai
jun
jul
aoû
sep
oct
nov
déc
Entrée
Sortie
Rendement
Capacité

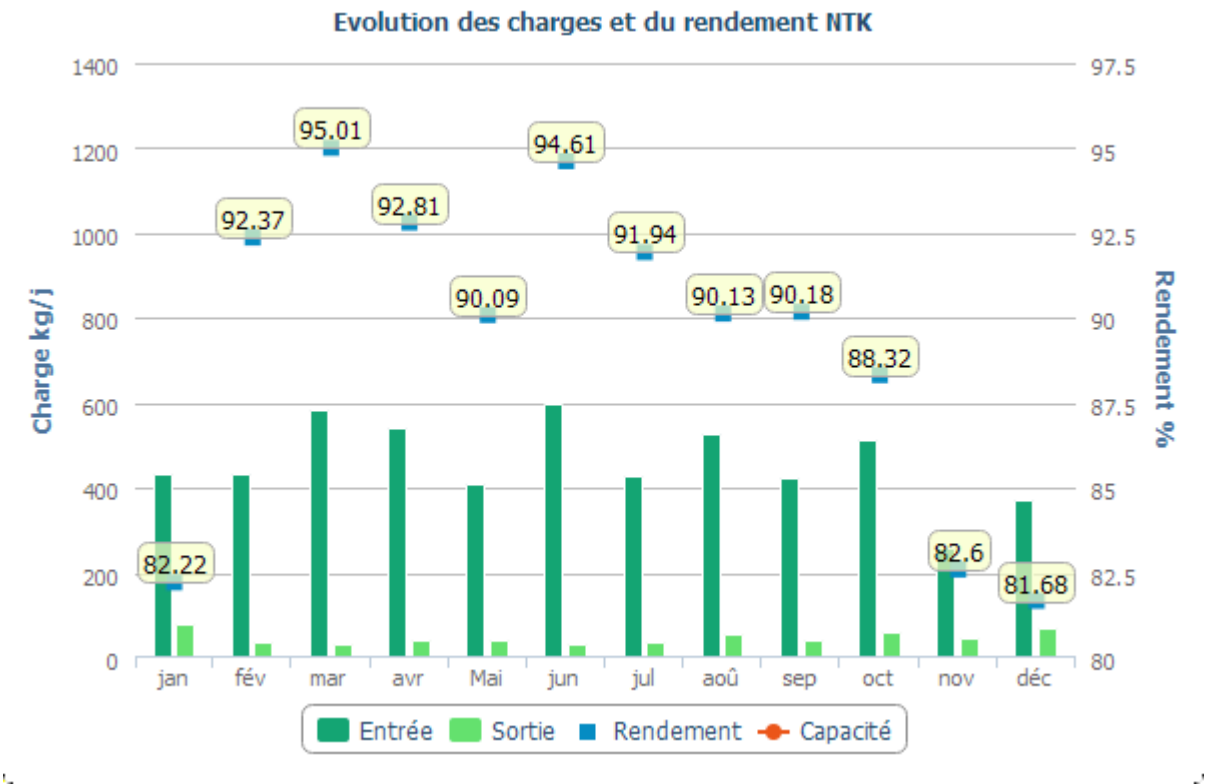
Evolution des charges et du rendement NTK
Charge kg/j
Rendement %
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
97.5
95
92.5
90
87.5
85
82.5
80
92.37
95.01
92.81
90.09
94.61
91.94
90.13
90.18
88.32
82.22
82.6
81.68
jan
fév
mar
avr
Mai
jun
jul
aoû
sep
oct
nov
déc
Entrée
Sortie
Rendement
Capacité

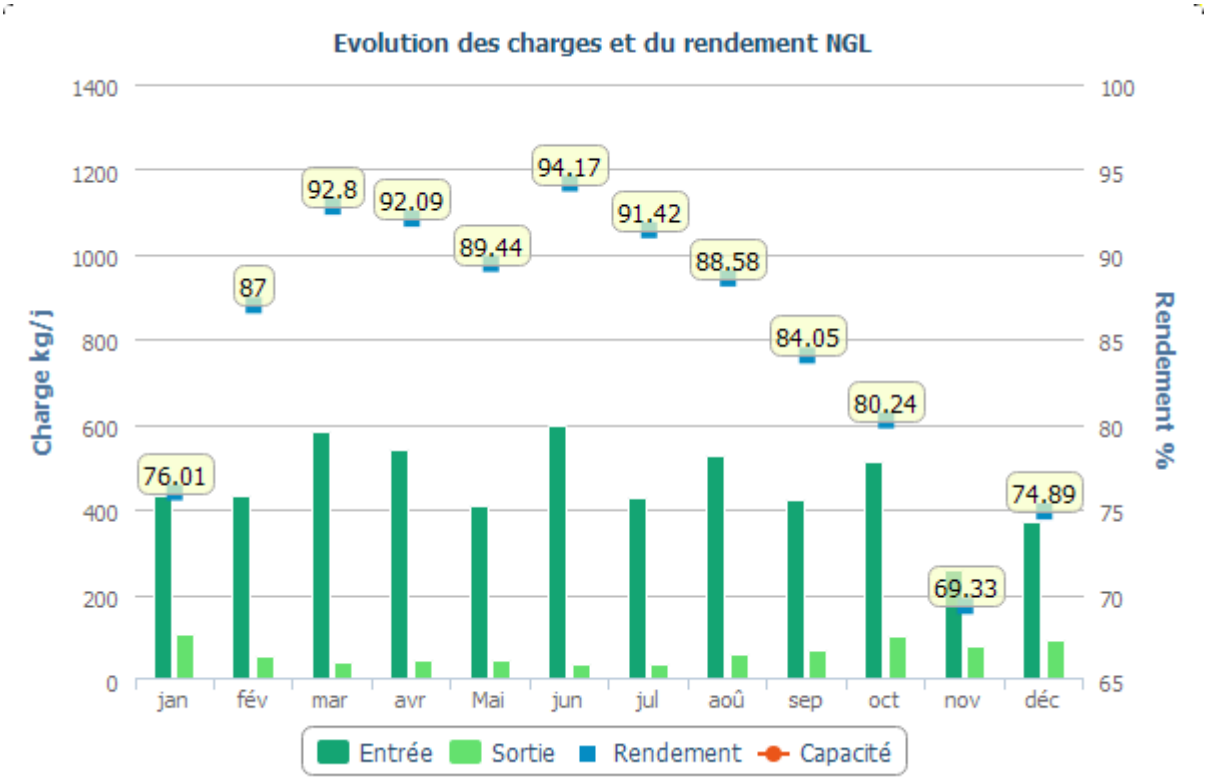

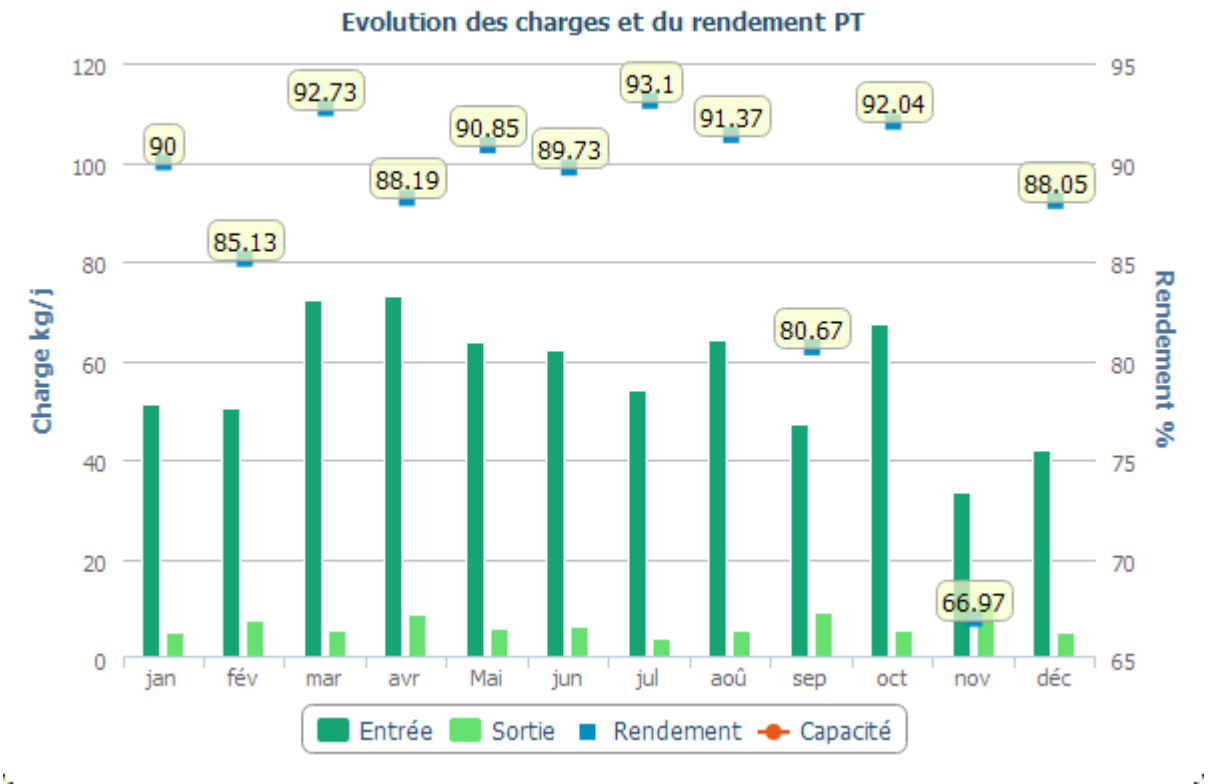

Boues évacuées par mois

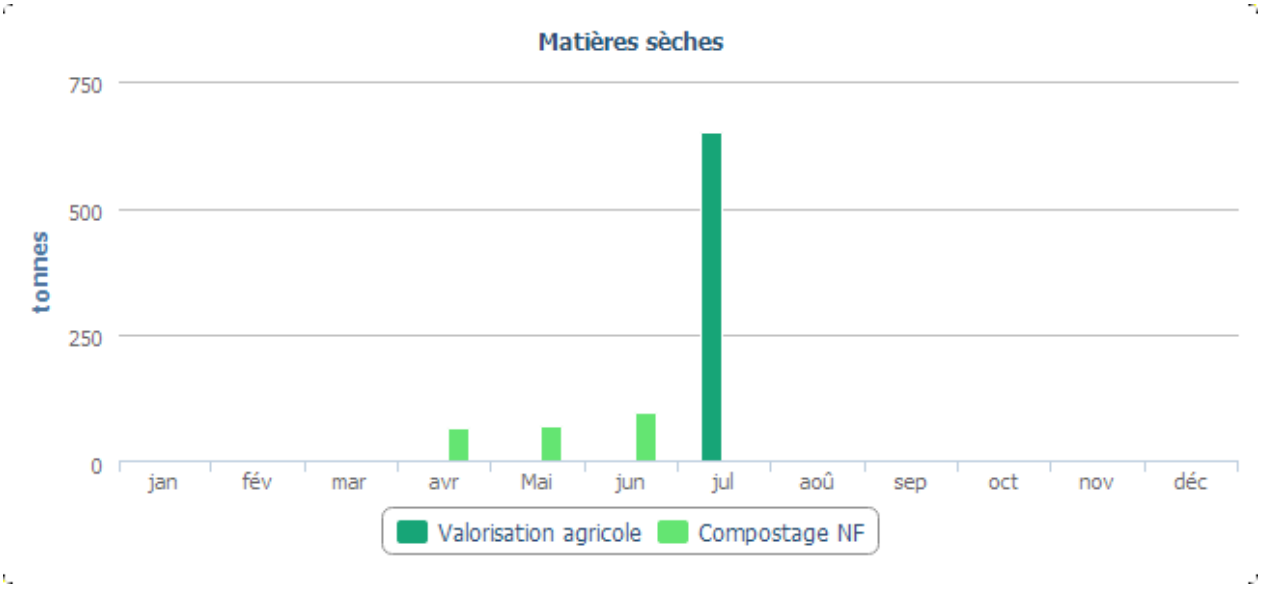


UDEP BAVANS

Bilans HCNF / Bilans :


Charges entrantes et dépassement de capacité	Volume		MES	DCO	DBO5	NTK	NGL	Pt
	(m3/j)	Nbr Bilan HcNF* / nbr de bilans	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j
janvier	7 878	0 / 2	630	1 094	410	126,9	126,9	15,9
février	4 573	0 / 2	931	1 341	611	129,0	129,0	19,8
mars	3 616	0 / 2	424	744	395	160,6	160,6	11,8
avril	2 392	0 / 2	474	740	311	83,8	83,8	12,2
mai	2 130	0 / 2	401	719	281	86,2	86,2	10,0
juin	2 810	0 / 2	658	1 063	438	122,6	122,6	16,2
juillet	1 905	0 / 2	418	818	493	96,2	96,2	11,5
août	2 276	0 / 2	234	443	170	61,7	61,7	6,7
septembre	3 207	0 / 2	678	1 089	449	84,3	84,3	11,3
octobre	4 667	0 / 2	865	2 046	804	205,3	205,3	23,2
novembre	7 204	0 / 2	238	597	206	84,5	84,5	9,0
décembre	4 519	0 / 2	272	400	151	66,0	66,0	7,9

(*) Hors conditions normales de fonctionnement selon le volume reçu en entrée de station

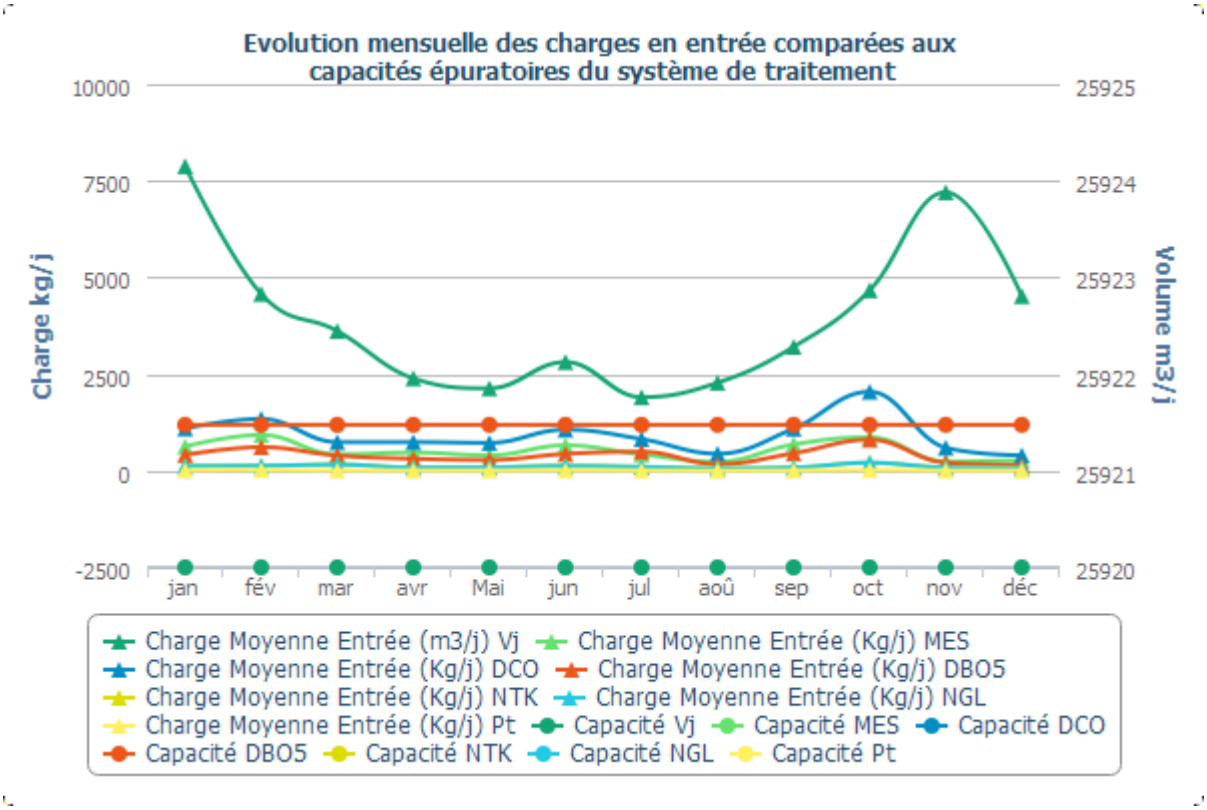



Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :


Charges en sortie et rendement	MES		DCO		DBO5		NTK		NGL		Pt	
	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%
janvier	23,20	96,31	84,80	92,25	24,01	94,15	28,70	77,40	35,50	71,99	1,30	91,95
février	12,20	98,69	59,30	95,58	17,04	97,21	10,20	92,12	12,70	90,13	1,50	92,23
mars	10,90	97,44	46,30	93,78	12,37	96,87	16,40	89,76	30,90	80,79	1,70	85,29
avril	6,20	98,69	34,00	95,41	6,68	97,85	5,30	93,67	6,60	92,16	1,60	87,25
mai	6,50	98,39	37,30	94,81	5,68	97,97	6,50	92,51	8,30	90,42	1,20	87,95
juin	8,30	98,75	44,20	95,84	7,16	98,37	4,30	96,49	4,70	96,15	1,80	89,10
juillet	5,80	98,61	33,10	95,95	5,36	98,91	2,70	97,18	3,00	96,93	1,20	89,86
août	8,60	96,35	33,80	92,38	8,53	94,99	2,30	96,32	1,60	97,48	1,20	82,30
septembre	12,40	98,17	48,60	95,54	8,87	98,03	5,60	93,37	6,90	91,84	2,50	78,37
octobre	9,30	98,93	65,70	96,79	8,36	98,96	6,40	96,91	7,60	96,28	5,10	77,98
novembre	36,60	84,60	103,30	82,69	30,09	85,38	16,20	80,81	19,00	77,52	2,30	74,43
décembre	9,20	96,62	31,70	92,08	11,47	92,42	7,20	89,16	12,50	81,04	2,60	66,79

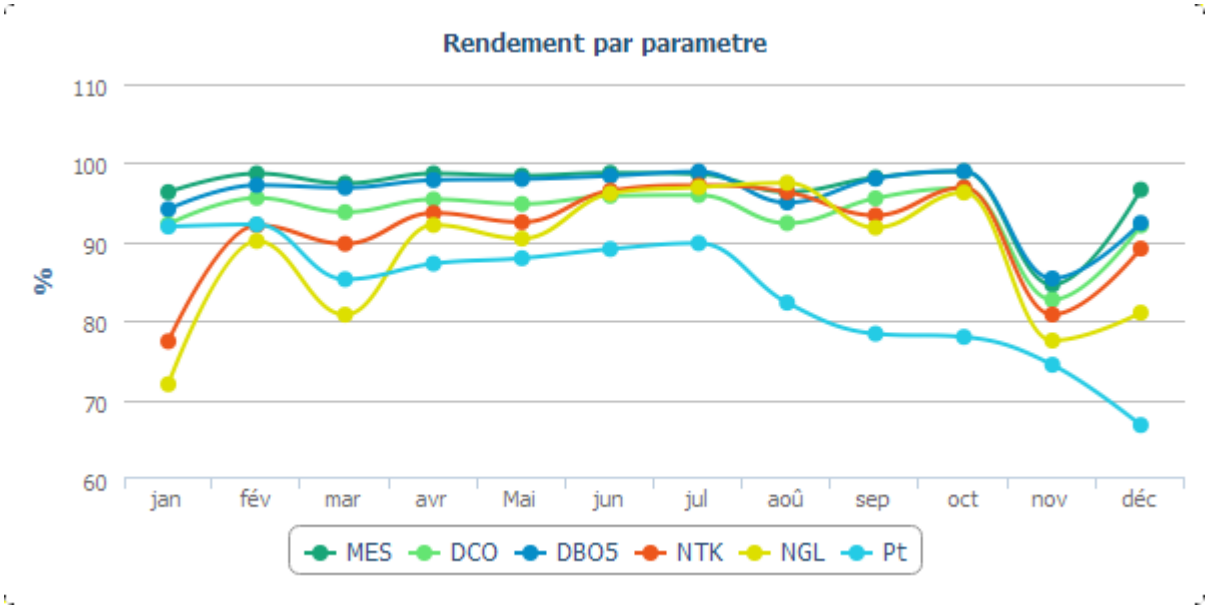



Evolution des charges et du rendement par paramètre

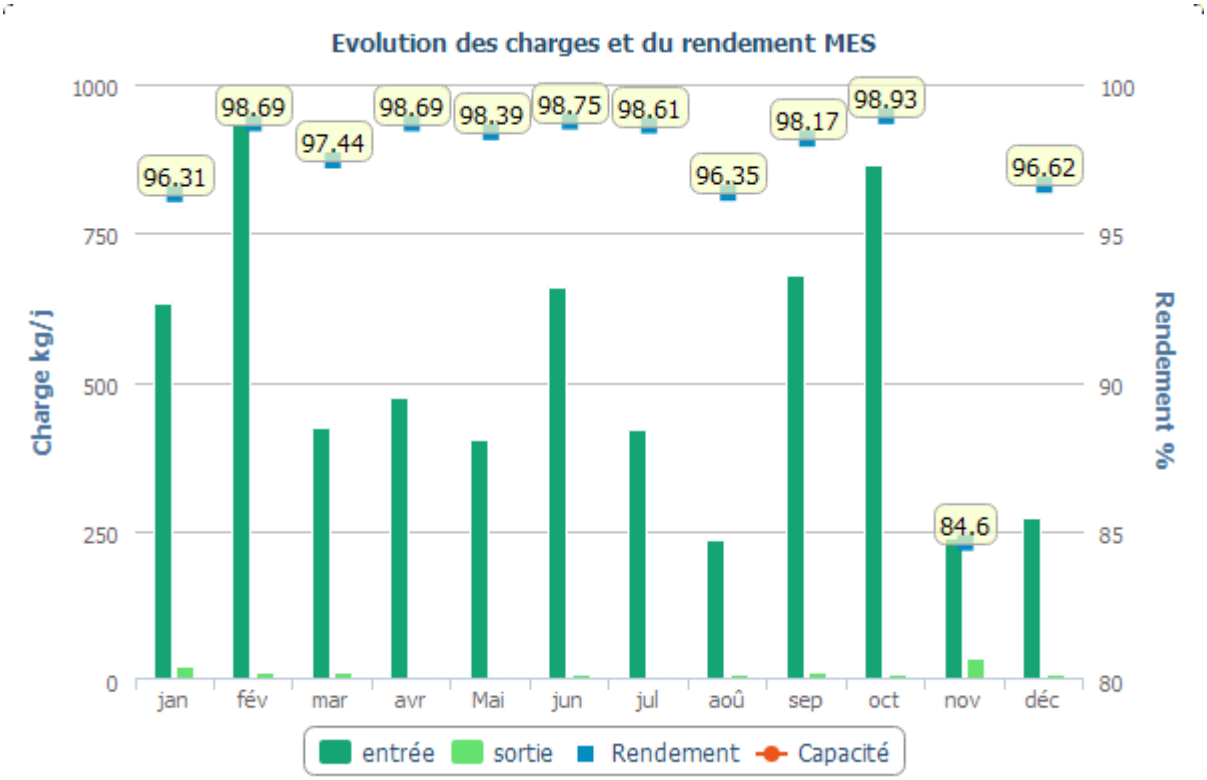

Evolution des charges et du rendement MES
Charge kg/j
Rendement %
1000
750
500
250
0
100
95
90
85
80
96,31
98,69
97,44
98,69
98,39
98,75
98,61
96,35
98,17
98,93
96,62
84,6
jan
fév
mar
avr
Mai
jun
jul
aoû
sep
oct
nov
déc
entrée
sortie
Rendement
Capacité

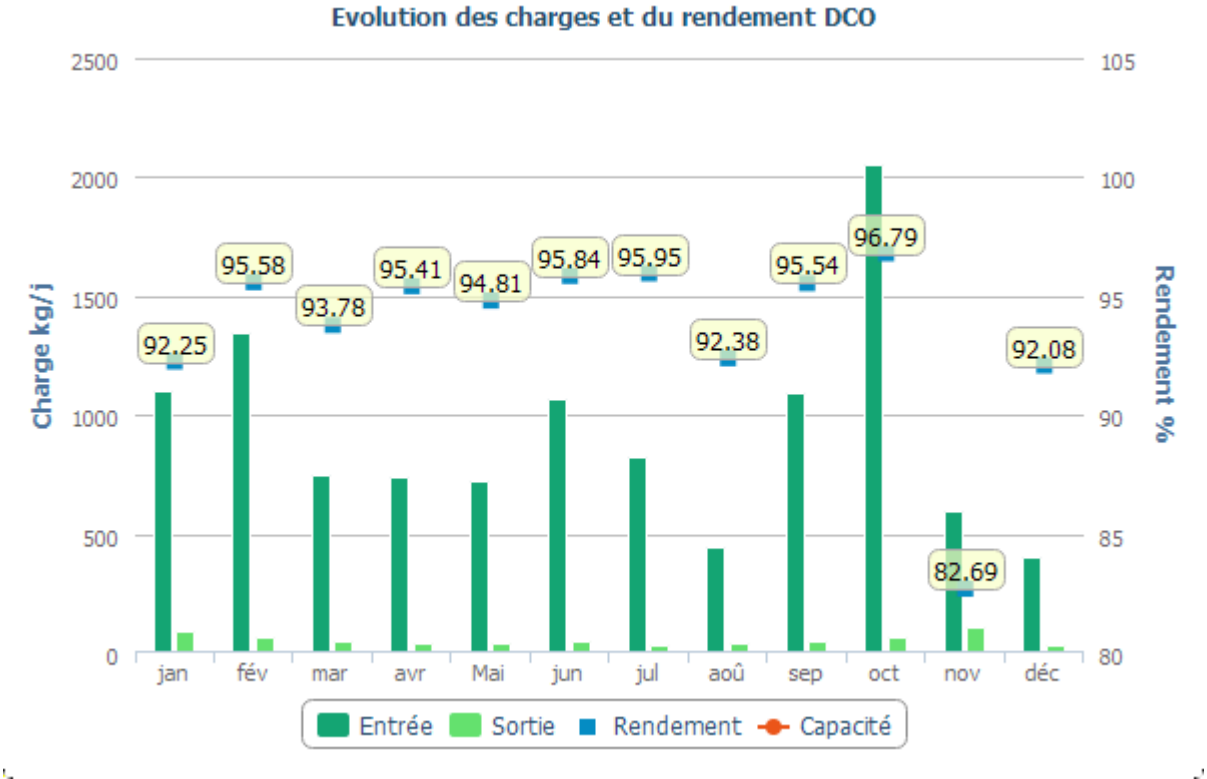
Evolution des charges et du rendement DCO
Charge kg/j
Rendement %
2500
2000
1500
1000
500
0
105
100
95
90
85
80
92,25
95,58
93,78
95,41
94,81
95,84
95,95
92,38
95,54
96,79
92,08
82,69
jan
fév
mar
avr
Mai
jun
jul
aoû
sep
oct
nov
déc
Entrée
Sortie
Rendement
Capacité

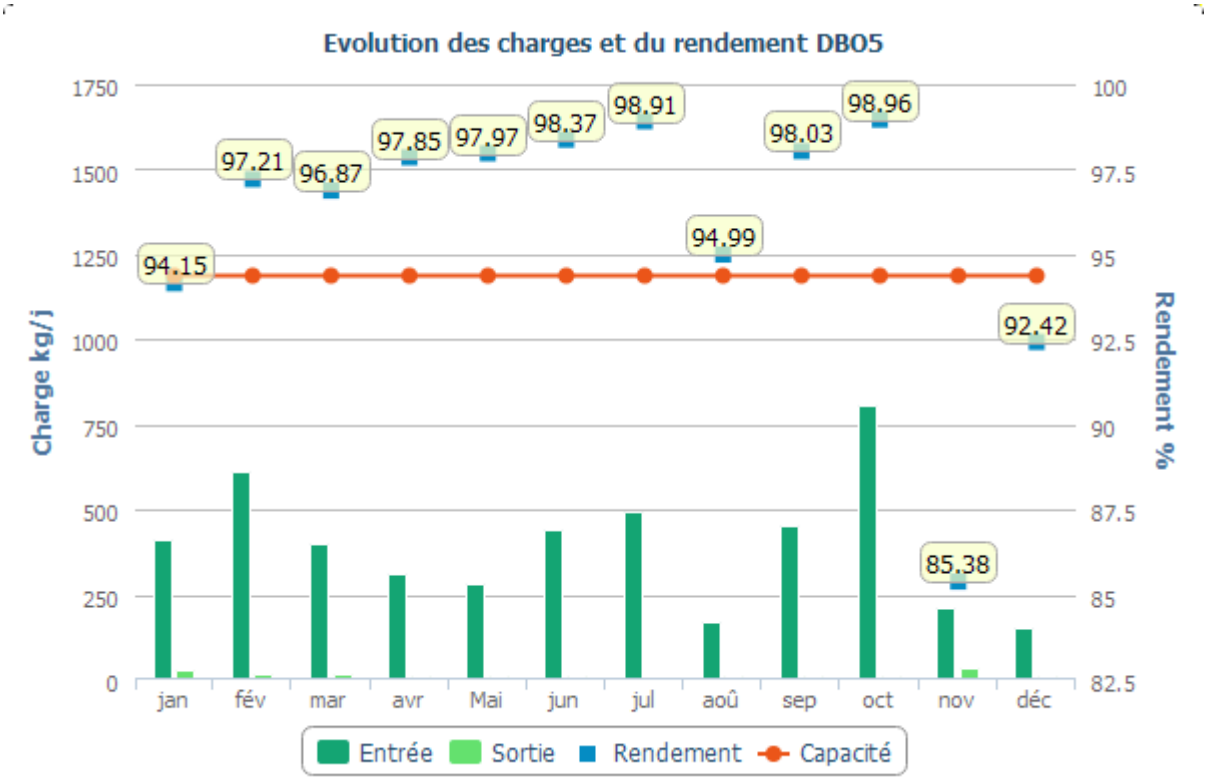

Evolution des charges et du rendement DBO5
Charge kg/j
Rendement %
1750
1500
1250
1000
750
500
250
0
100
97.5
95
92.5
90
87.5
85
82.5
97.21
96.87
97.85
97.97
98.37
98.91
98.03
98.96
94.15
94.99
92.42
85.38
jan
fév
mar
avr
Mai
jun
jul
aoû
sep
oct
nov
déc
Entrée
Sortie
Rendement
Capacité

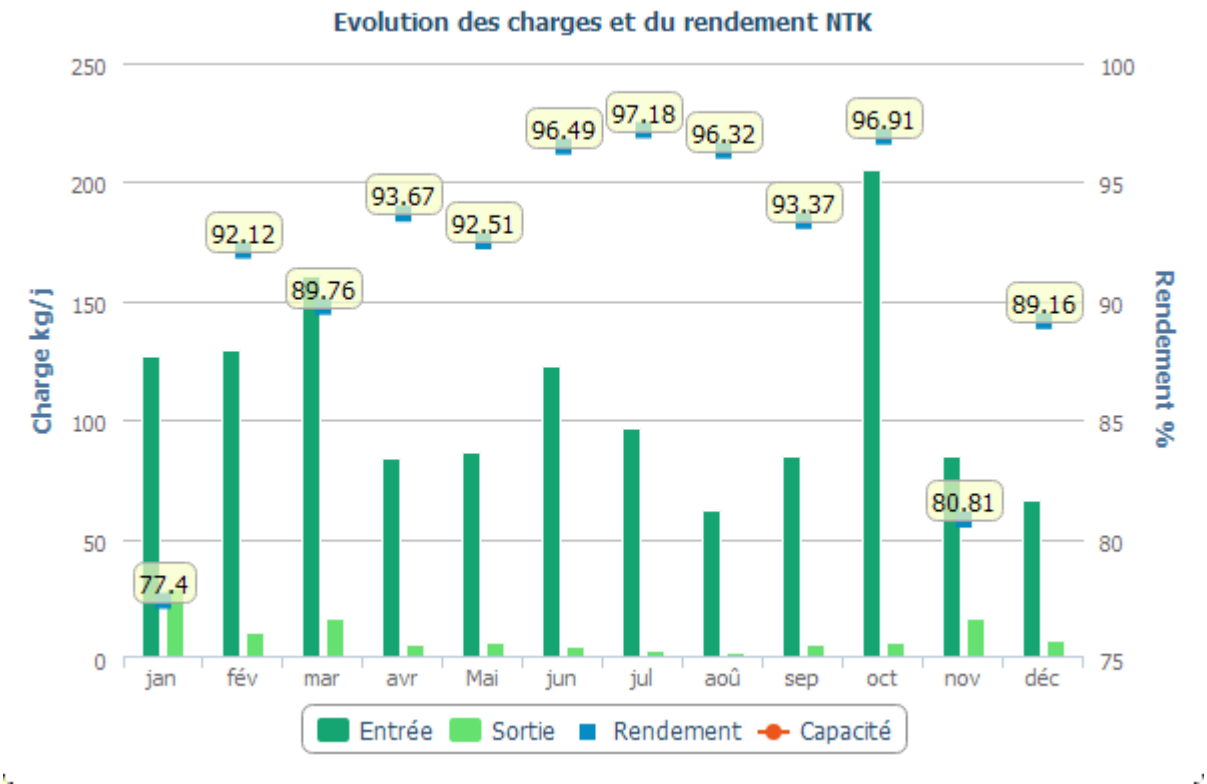
Evolution des charges et du rendement NTK
Charge kg/j
Rendement %
250
200
150
100
50
0
100
95
90
85
80
75
92.12
89.76
93.67
92.51
96.49
97.18
96.32
93.37
96.91
89.16
80.81
77.4
jan
fév
mar
avr
Mai
jun
jul
aoû
sep
oct
nov
déc
Entrée
Sortie
Rendement
Capacité

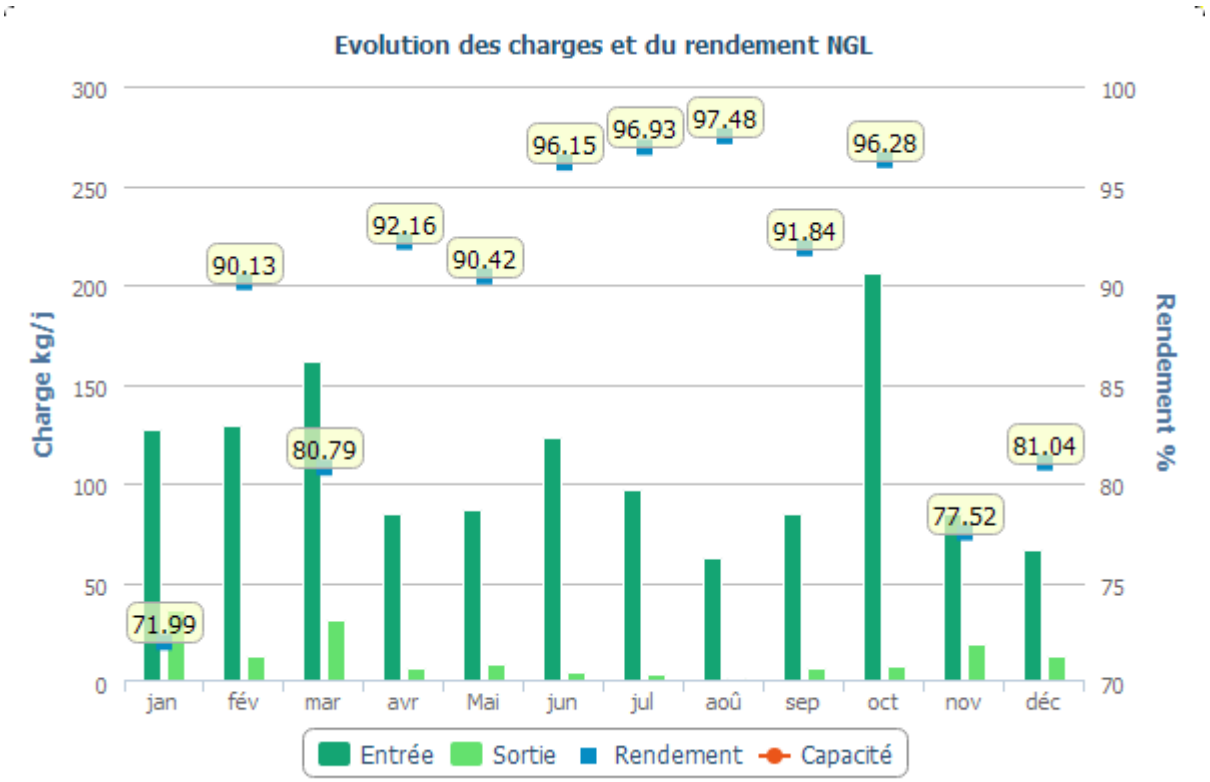

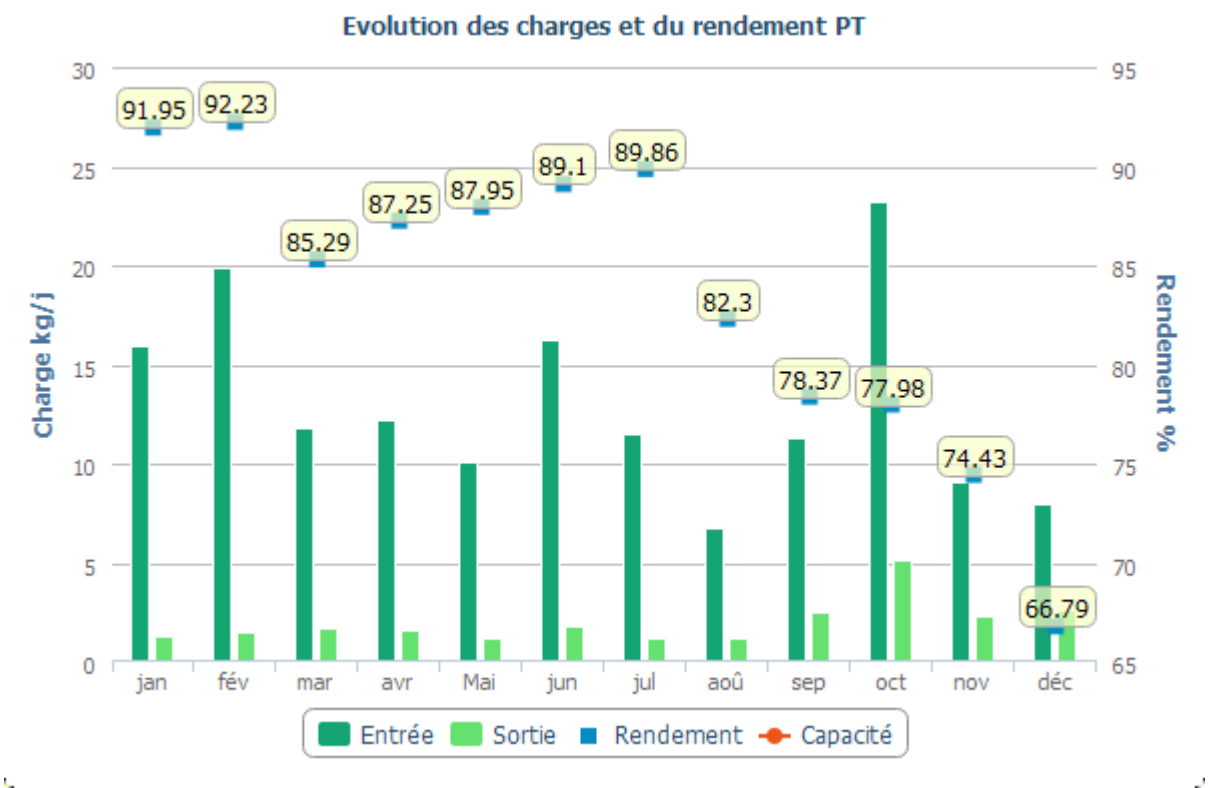

Boues évacuées par mois

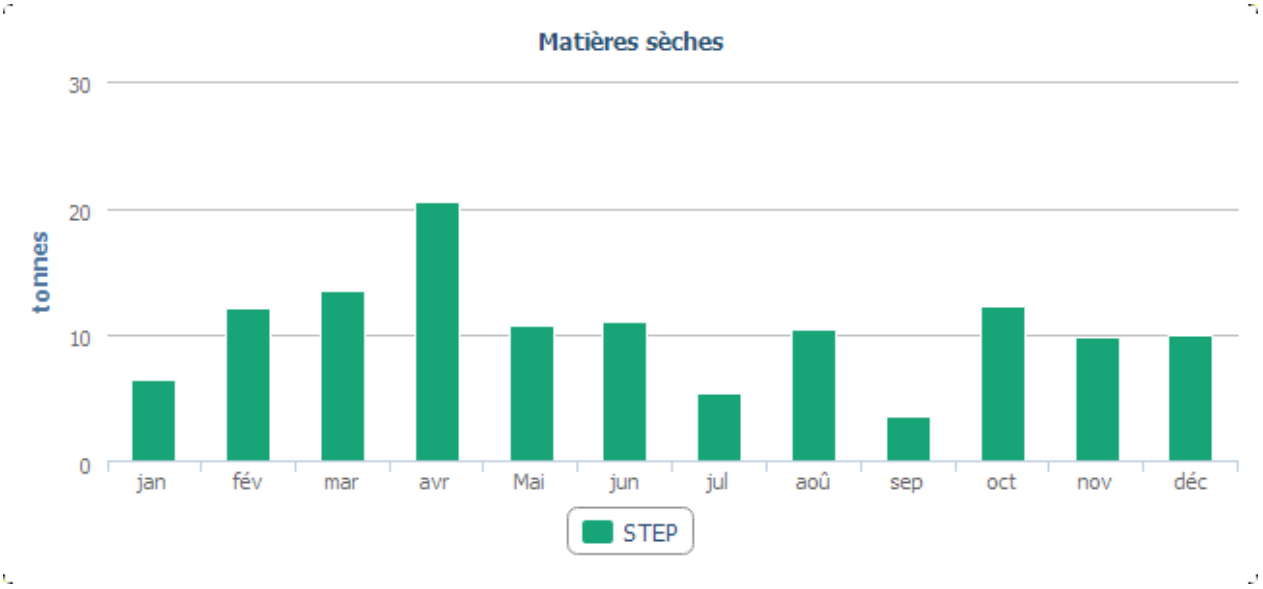


UDEP SAINTE SUZANNE

Bilans HCNF / Bilans :

Charges entrantes et dépassement de capacité	Volume		MES	DCO	DBO5	NTK	NGL	Pt
	(m3/j)	Nbr Bilan HcNF* / nbr de bilans	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j
janvier	22 692	0 / 9	1 162	2 898	1 281	458,4	468,9	49,6
février	16 164	0 / 9	1 966	4 856	2 034	528,9	533,0	63,3
mars	13 535	0 / 9	2 532	4 713	2 001	527,0	529,9	74,7
avril	10 211	0 / 8	1 654	3 885	1 735	537,5	538,6	65,8
mai	10 021	0 / 6	2 949	5 385	2 193	522,8	524,0	60,5
juin	11 569	0 / 9	3 386	6 255	1 883	488,0	491,5	79,1
juillet	8 316	0 / 10	2 831	5 081	1 814	501,4	502,3	66,4
août	10 098	0 / 9	1 678	3 546	1 404	427,3	430,2	50,9
septembre	14 161	0 / 9	1 926	3 644	1 555	429,8	439,4	51,6
octobre	16 018	0 / 9	2 235	4 090	1 927	463,7	478,5	60,5
novembre	20 038	1 / 9	1 901	4 013	1 922	479,4	510,0	61,0


décembre	15 669	0 / 9	1 989	4 093	2 089	528,5	541,2	61,5

(*) Hors conditions normales de fonctionnement selon le volume reçu en entrée de station

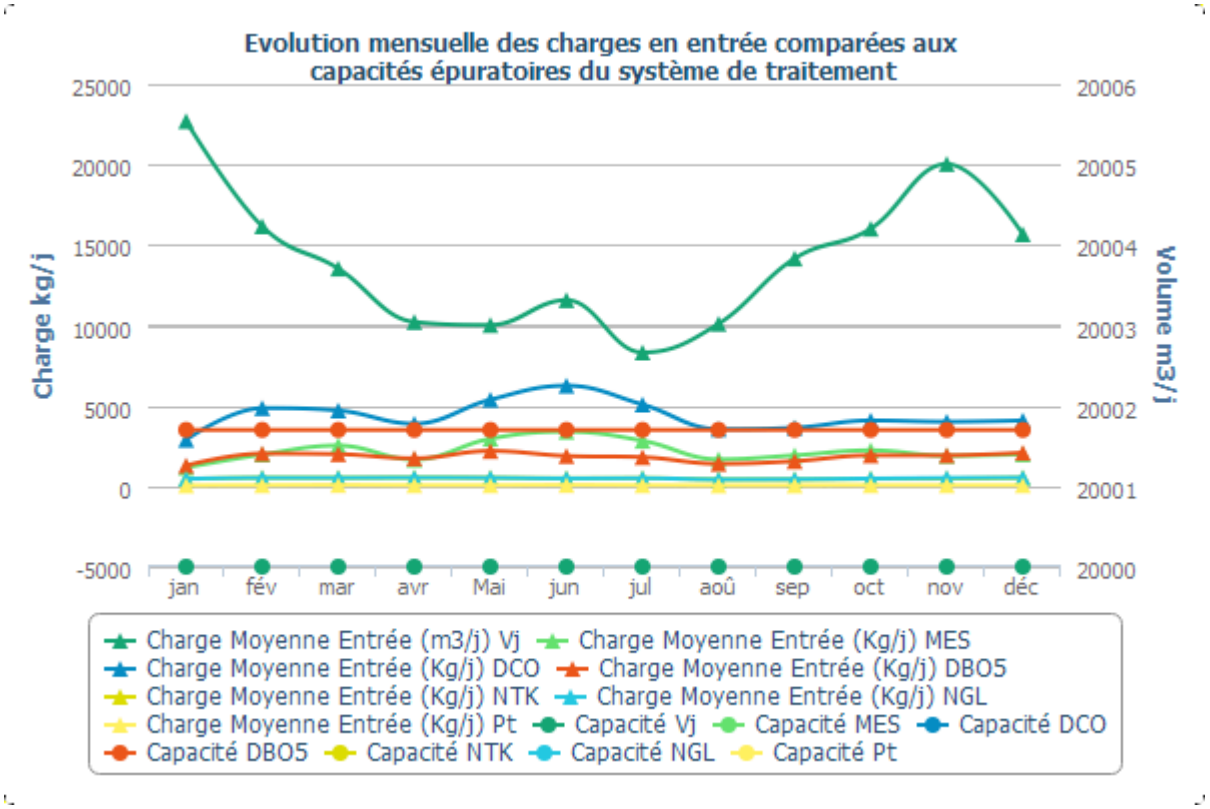



Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :


Charges en sortie et rendement	MES		DCO		DBO5		NTK		NGL		Pt	
	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%
janvier	204,90	82,37	613,50	78,83	201,70	84,26	105,50	76,98	151,20	67,75	9,50	80,78
février	65,30	96,68	260,60	94,63	47,33	97,67	43,80	91,71	54,80	89,72	6,60	89,60
mars	40,50	98,40	257,70	94,53	32,57	98,37	36,10	93,15	58,40	88,98	5,00	93,32
avril	35,70	97,84	243,90	93,72	29,09	98,32	40,30	92,51	62,00	88,49	2,10	96,82
mai	39,10	98,67	226,70	95,79	27,84	98,73	23,20	95,57	56,60	89,20	2,60	95,66
juin	32,00	99,05	212,60	96,60	25,73	98,63	32,00	93,44	33,60	93,17	7,40	90,68
juillet	31,60	98,88	201,10	96,04	18,15	99,00	30,30	93,97	39,90	92,06	2,10	96,85
août	26,30	98,43	184,50	94,80	20,54	98,54	37,90	91,12	68,10	84,18	2,60	94,88
septembre	30,60	98,41	223,60	93,86	28,33	98,18	39,20	90,87	62,70	85,74	2,40	95,37
octobre	32,70	98,54	259,30	93,66	28,54	98,52	25,50	94,51	50,60	89,44	3,40	94,37
novembre	87,20	95,41	291,80	92,73	59,83	96,89	44,80	90,66	67,10	86,85	4,20	93,09
décembre	72,50	96,35	285,40	93,03	48,71	97,67	54,60	89,66	91,00	83,19	4,20	93,14

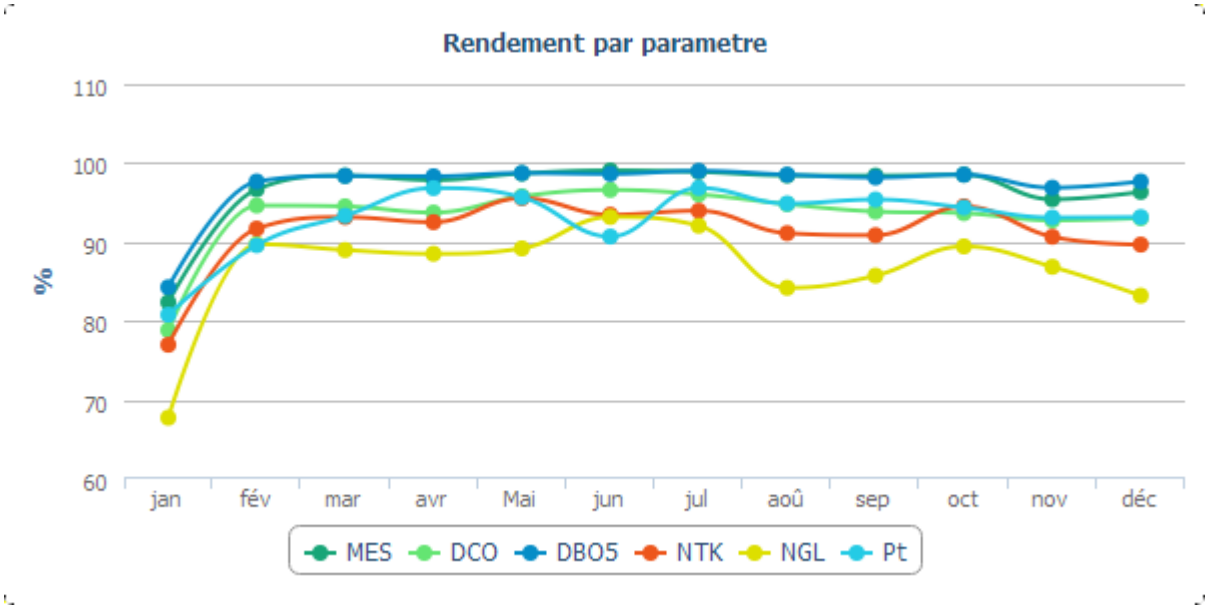



Evolution des charges et du rendement par paramètre

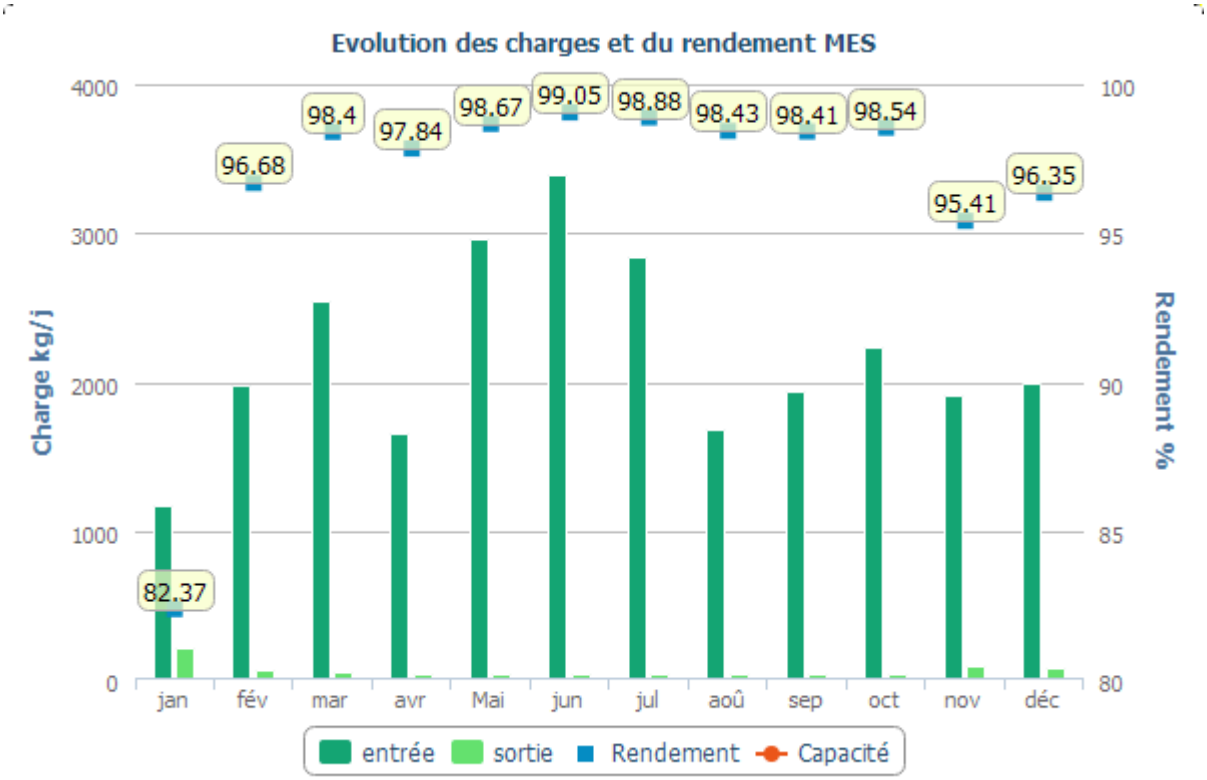

Evolution des charges et du rendement MES
Charge kg/j
Rendement %
4000
3000
2000
1000
0
100
95
90
85
80
82.37
96.68
98.4
97.84
98.67
99.05
98.88
98.43
98.41
98.54
95.41
96.35
jan
fév
mar
avr
Mai
jun
jul
aoû
sep
oct
nov
déc
entrée
sortie
Rendement
Capacité

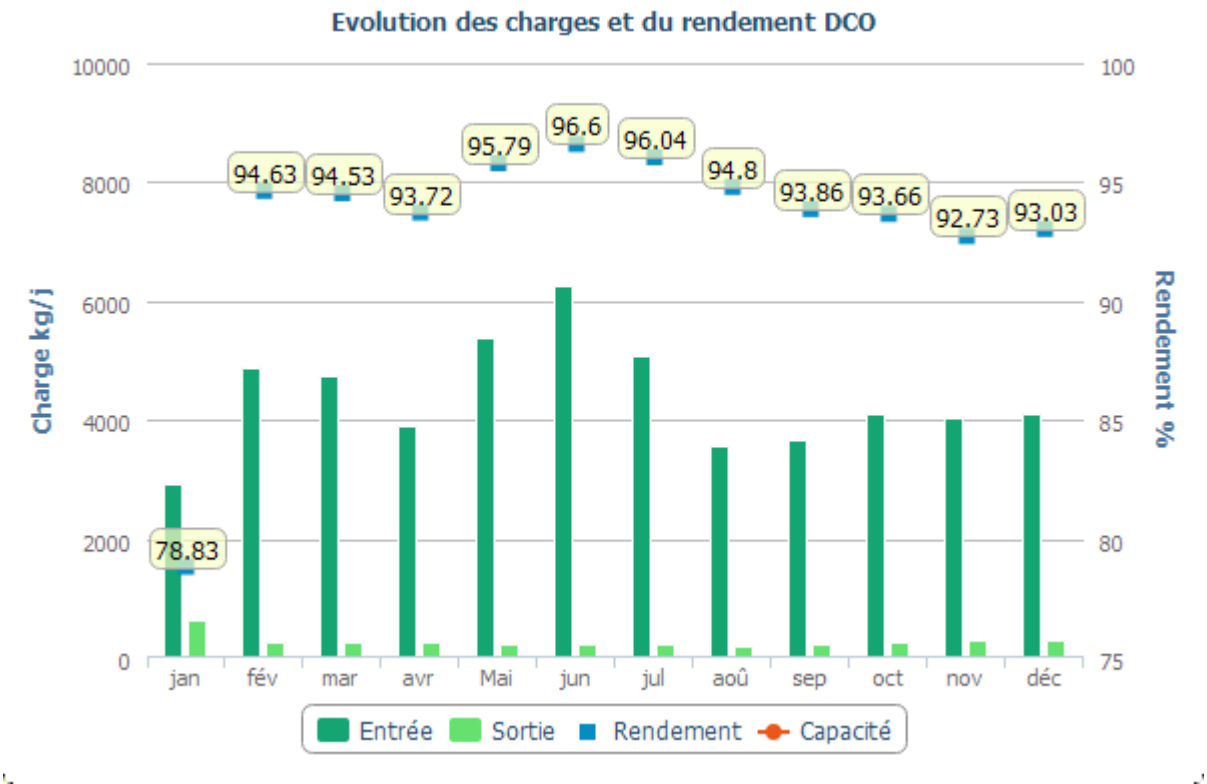
Evolution des charges et du rendement DCO
Charge kg/j
Rendement %
10000
8000
6000
4000
2000
0
100
95
90
85
80
75
78.83
94.63
94.53
93.72
95.79
96.6
96.04
94.8
93.86
93.66
92.73
93.03
jan
fév
mar
avr
Mai
jun
jul
aoû
sep
oct
nov
déc
Entrée
Sortie
Rendement
Capacité

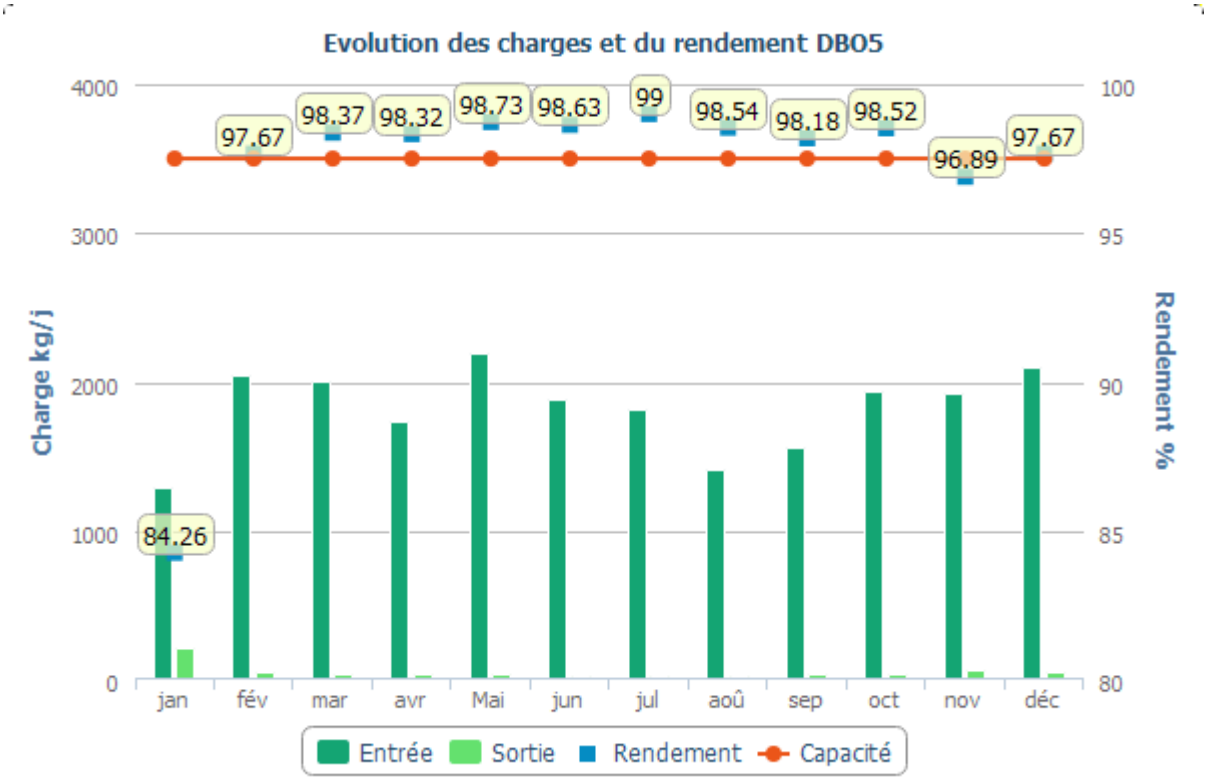

Evolution des charges et du rendement DBO5
Charge kg/j
Rendement %
4000
3000
2000
1000
0
100
95
90
85
80
97.67
98.37
98.32
98.73
98.63
99
98.54
98.18
98.52
96.89
97.67
84.26
jan
fév
mar
avr
Mai
jun
jul
aoû
sep
oct
nov
déc
Entrée
Sortie
Rendement
Capacité

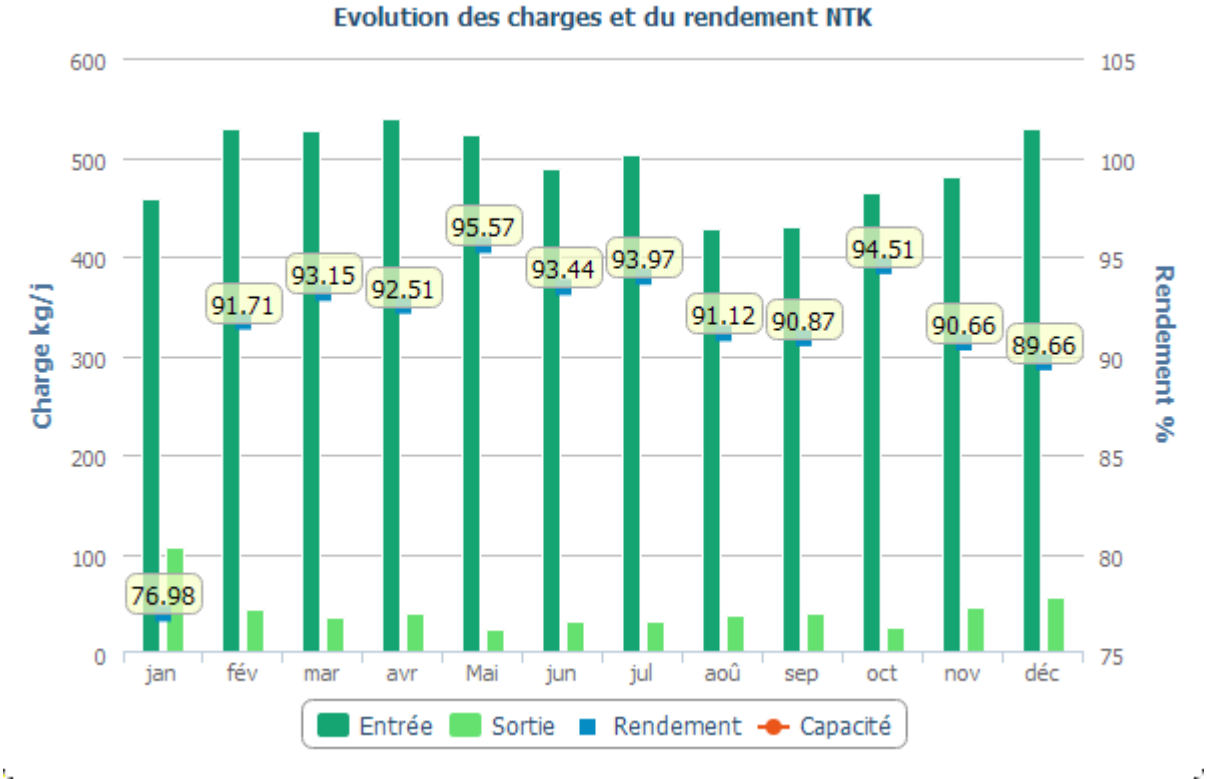
Evolution des charges et du rendement NTK
Charge kg/j
Rendement %
600
500
400
300
200
100
0
105
100
95
90
85
80
75
76.98
91.71
93.15
92.51
95.57
93.44
93.97
91.12
90.87
94.51
90.66
89.66
jan
fév
mar
avr
Mai
jun
jul
aoû
sep
oct
nov
déc
Entrée
Sortie
Rendement
Capacité

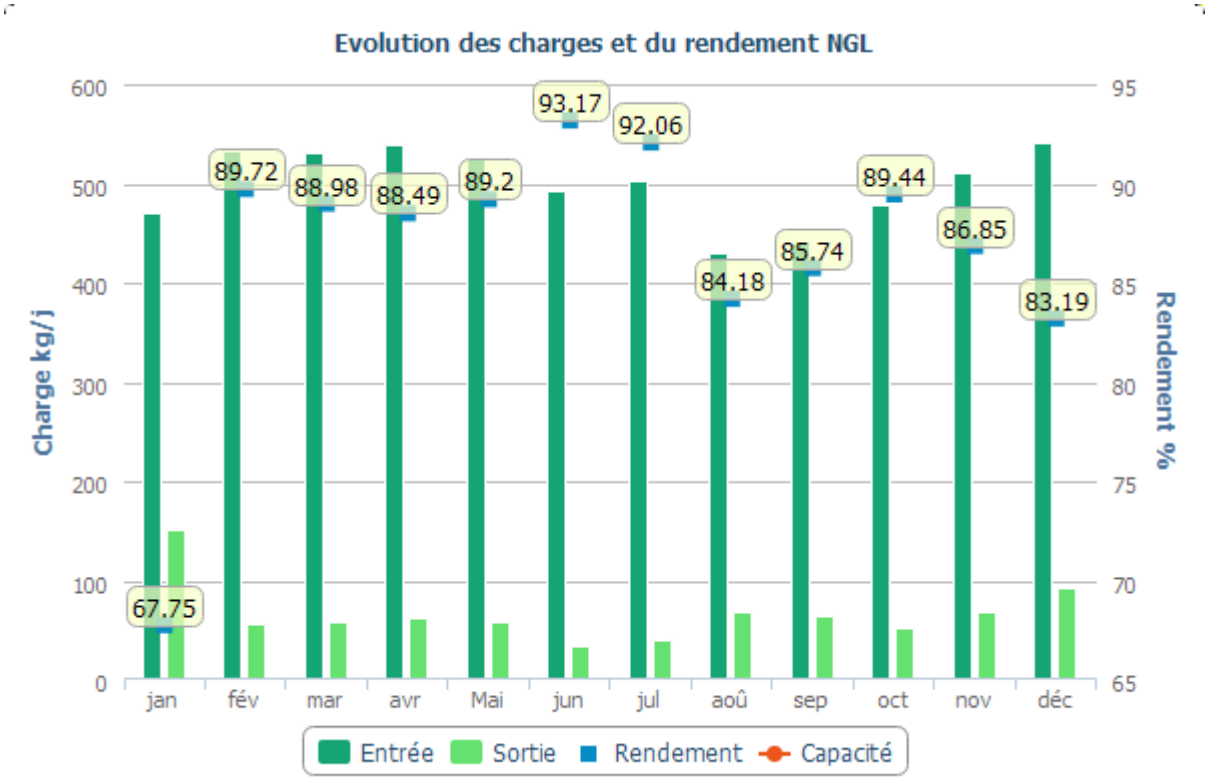

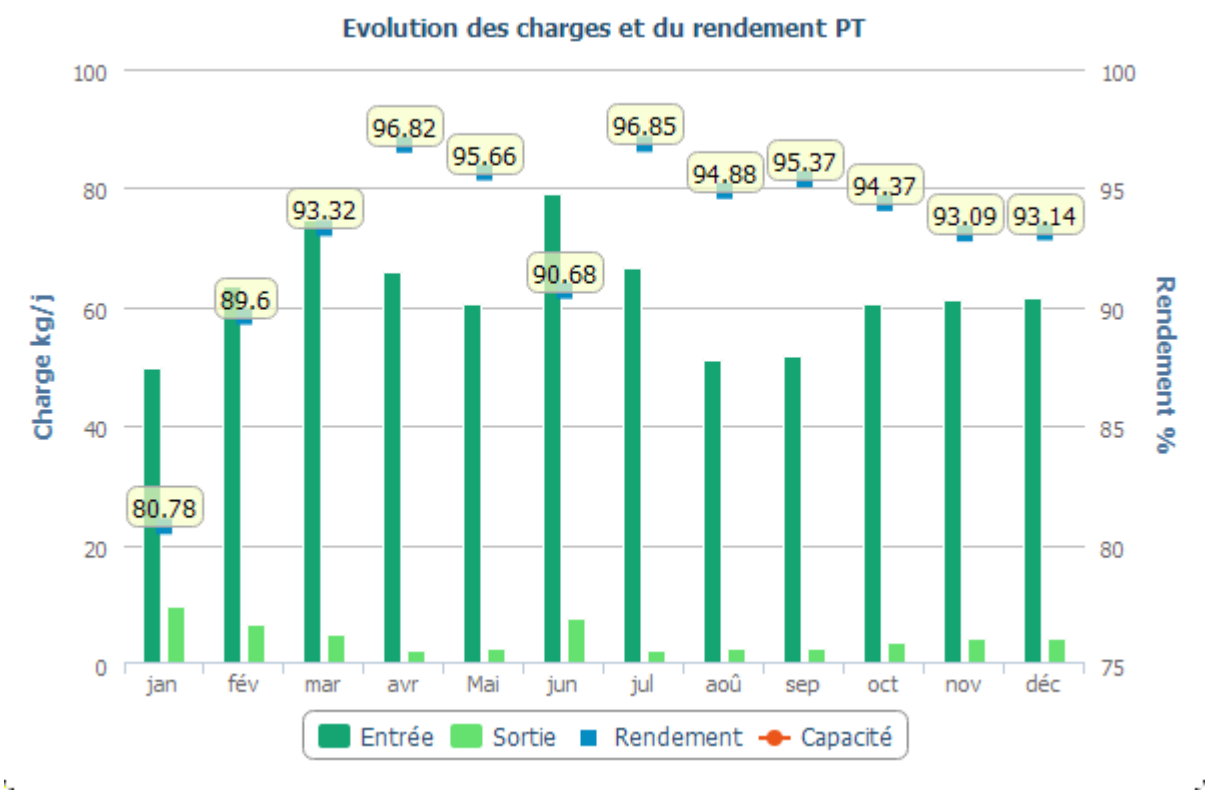

Boues évacuées par mois

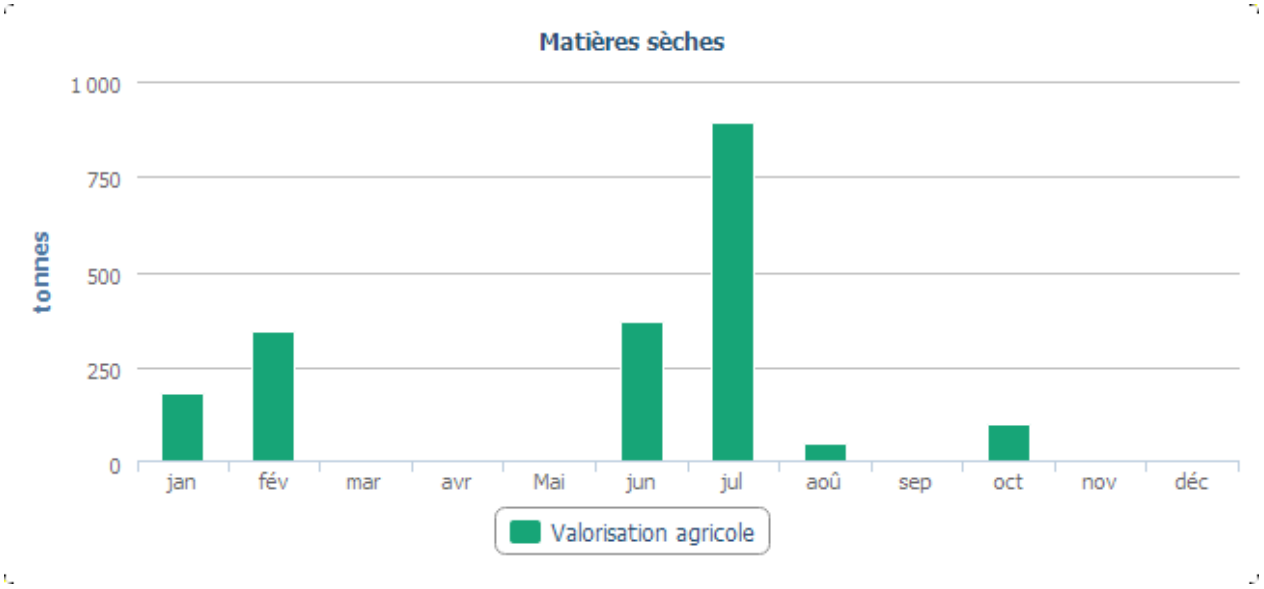
Matières sèches
1 000
750
500
250
0
tonnes
jan
fév
mar
avr
Mai
jun
jul
aoû
sep
oct
nov
déc
Valorisation agricole

5.4. Energie et réactifs

Consommation d'énergie par installation

Usine de dépollution

	2021	2022	2023	2024	2025	N/N-1
LAGUNE PRESENTVILLERS						
Energie relevée consommée (kWh)		6 478	6 387	6 422	3 692	-42,5%
Energie facturée consommée (kWh)				6 623	3 751	-43,4%
Consommation spécifique (Wh/m3)		203	46	36	46	27,8%
Volume pompé (m3)		31 834	139 320	179 480	80 019	-55,4%
Temps de fonctionnement (h)		1 060	4 085	4 735	2 275	-52,0%
LAGUNE SOLEMONT						
Energie relevée consommée (kWh)				7 476	4 415	-40,9%
Energie facturée consommée (kWh)	5 122	2 868	4 420	5 338	4 560	-14,6%
Volume pompé (m3)		10 950				
Temps de fonctionnement (h)	856	730			347	
STEP ABBEVILLERS						
Energie relevée consommée (kWh)			5 217	54 659	55 704	1,9%
Energie facturée consommée (kWh)	59 185	54 112	61 980	62 898	58 393	-7,2%
Volume pompé (m3)		444 220				
Temps de fonctionnement (h)	15 600	22 211				
STEP BLAMONT						
Energie relevée consommée (kWh)				69 689	80 147	15,0%
Energie facturée consommée (kWh)	40 832	35 234	70 188	74 358	84 838	14,1%
Temps de fonctionnement (h)	24 948					
STEP COLOMBIER FONTAINE						
Energie relevée consommée (kWh)	65 629	177 607	56 952	192 933	184 465	-4,4%
Energie facturée consommée (kWh)	167 258	205 487	177 310	192 051	167 062	-13,0%
Consommation spécifique (Wh/m3)	215		339	1 004	863	-14,0%
Volume pompé (m3)	305 774		167 853	192 245	213 695	11,2%
Temps de fonctionnement (h)	7 405		1 065	1 134	920	-18,9%
STEP DAMBELIN						
Energie relevée consommée (kWh)				58 061	56 414	-2,8%
Energie facturée consommée (kWh)	51 783	42 497	59 456	60 653	59 204	-2,4%
Consommation spécifique (Wh/m3)				1 040	1 168	12,3%
Volume pompé (m3)		7 604 511	94 509	55 830	48 315	-13,5%
Temps de fonctionnement (h)	9 272	500	801	900	801	-11,0%
STEP DUNG						
Energie relevée consommée (kWh)		57 766	70 515	70 846	77 616	9,6%
Energie facturée consommée (kWh)			72 232	72 830	81 533	11,9%

Consommation spécifique (Wh/m3)		285	342	218	304	39,4%
Volume pompé (m3)		202 733	206 110	324 687	255 524	-21,3%
Temps de fonctionnement (h)			3 640	4 697	3 051	-35,0%
STEP ECHENANS						
Energie relevée consommée (kWh)		129 778	124 019	121 190	127 921	5,6%
Energie facturée consommée (kWh)			122 908	123 191	114 327	-7,2%
Consommation spécifique (Wh/m3)		949	596	439	622	41,7%
Volume pompé (m3)		136 808	207 944	275 894	205 584	-25,5%
Temps de fonctionnement (h)		5 271	5 820	6 131	5 548	-9,5%
STEP ECOT						
Energie relevée consommée (kWh)		20 175	20 383	18 172	6 828	-62,4%
Energie facturée consommée (kWh)	15 332	15 259	20 865	17 805	13 256	-25,5%
STEP MONTENOIS						
Energie relevée consommée (kWh)		61 516	43 204	67 653	62 591	-7,5%
Energie facturée consommée (kWh)	67 693	74 579	70 275	63 576	60 011	-5,6%
Consommation spécifique (Wh/m3)		795	1 657	950	1 114	17,3%
Volume pompé (m3)		77 360	26 071	71 182	56 172	-21,1%
Temps de fonctionnement (h)	7 369	1 933	1 517	2 323	1 996	-14,1%
STEP PONT DE ROIDE VERMONDANS						
Energie relevée consommée (kWh)			262 942	466 175	515 195	10,5%
Energie facturée consommée (kWh)	356 638	312 941	274 649	311 111	287 034	-7,7%
Consommation spécifique (Wh/m3)			682	1 006	1 236	22,9%
Volume pompé (m3)	447 847	381 285	385 732	463 265	416 685	-10,1%
Temps de fonctionnement (h)	45 180		3 509	4 027	3 629	-9,9%
STEP ROCHES BLAMONT RIZOSPHÈRE						
Energie relevée consommée (kWh)					2 780	
STEP ROCHES LES BLAMONT						
Energie relevée consommée (kWh)				0	11 361	100%
Energie facturée consommée (kWh)	20 135	18 962	28 896	28 795	3 126	-89,1%
Consommation spécifique (Wh/m3)				0		
Volume pompé (m3)		70 692	43 336	33 819		
Temps de fonctionnement (h)	13 178	1 120	2 497	2 977		
STEP SAINT MAURICE COLOMBIER						
Energie relevée consommée (kWh)		72 060	53 589	56 725	40 620	-28,4%
Energie facturée consommée (kWh)	42 637	56 837	59 749	57 928	46 867	-19,1%
Consommation spécifique (Wh/m3)		917		756	731	-3,3%
Volume pompé (m3)		78 602		75 045	55 598	-25,9%
Temps de fonctionnement (h)	23 730	3 930		23 365		
STEP SAINTE MARIE						
Energie relevée consommée (kWh)		29 595	59 537	32 436	29 895	-7,8%
Energie facturée consommée (kWh)			57 492	34 521	31 110	-9,9%
STEP VILLARS LES BLAMONT Rhizo						

Energie relevée consommée (kWh)				0		
Energie facturée consommée (kWh)	7 499	6 556		8 703	8 076	-7,2%
Consommation spécifique (Wh/m3)				0		
Volume pompé (m3)	25 223	42 676	0	0		
Temps de fonctionnement (h)	4 204		1 720	2 718	5 199	91,3%
UDEP ARBOUANS						
Energie relevée consommée (kWh)		0	2 188 409	2 046 853	2 053 478	0,3%
Energie facturée consommée (kWh)			2 033 962	1 953 094	2 128 962	9,0%
Consommation spécifique (Wh/m3)			539	420	507	20,7%
Volume pompé (m3)			4 063 620	4 878 816	4 052 730	-16,9%
UDEP BAVANS						
Energie relevée consommée (kWh)		0	679 172	709 593	587 962	-17,1%
Energie facturée consommée (kWh)			679 312	711 905	628 415	-11,7%
Consommation spécifique (Wh/m3)			394	359	412	14,8%
Volume pompé (m3)			1 725 946	1 979 283	1 425 467	-28,0%
UDEP SAINTE SUZANNE						
Energie relevée consommée (kWh)		0	2 892 530	2 942 340	2 839 399	-3,5%
Energie facturée consommée (kWh)		0	2 939 601	2 950 882	2 839 398	-3,8%
Consommation spécifique (Wh/m3)			552	477	572	19,9%
Volume pompé (m3)			5 244 570	6 163 372	4 967 360	-19,4%

Poste de relèvement

	2021	2022	2023	2024	2025	N/N-1
BO DAMPIERRE BOIS Dégrilleur						
Energie facturée consommée (kWh)		0	347	335	353	5,4%
DEGRILLEUR MONTBELIARD Canal						
Energie facturée consommée (kWh)		0	701	489	272	-44,4%
PR ABBEVILLERS rue de la Doue						
Energie relevée consommée (kWh)				0	894	100%
Energie facturée consommée (kWh)	730	564	697	680	894	31,5%
Consommation spécifique (Wh/m3)				0	62	100%
Volume pompé (m3)		5 492	5 720	11 473	14 390	25,4%
Temps de fonctionnement (h)	105	215	307	289	361	24,9%
PR ALLENJOIE Ateliers						
Energie relevée consommée (kWh)			933	1 107	877	-20,8%
Energie facturée consommée (kWh)			929	1 078	927	-14,0%
Consommation spécifique (Wh/m3)			27	37	44	18,9%
Volume pompé (m3)			34 816	30 000	20 100	-33,0%
Temps de fonctionnement (h)			736	1 000	670	-33,0%
PR ALLENJOIE Breuil						
Energie relevée consommée (kWh)				10 183	6 817	-33,1%
Energie facturée consommée (kWh)			7 434	9 810	7 444	-24,1%

Consommation spécifique (Wh/m3)				51	59	15,7%
Volume pompé (m3)			225 262	199 710	116 130	-41,9%
Temps de fonctionnement (h)			2 192	2 748	1 659	-39,6%
PR ALLENJOIE Route de Brognard						
Energie relevée consommée (kWh)			5 259	9 980	6 319	-36,7%
Energie facturée consommée (kWh)			4 678	10 548	5 977	-43,3%
Consommation spécifique (Wh/m3)			259	242	310	28,1%
Volume pompé (m3)			20 290	41 190	20 366	-50,6%
Temps de fonctionnement (h)			2 029	4 119	2 263	-45,1%
PR ARBOUANS Keller						
Energie relevée consommée (kWh)			682	512	543	6,1%
Energie facturée consommée (kWh)			684	520	508	-2,3%
Consommation spécifique (Wh/m3)			102	139	406	192,1%
Volume pompé (m3)			6 693	3 680	1 337	-63,7%
Temps de fonctionnement (h)			291	163	151	-7,4%
PR ARBOUANS Stade						
Energie relevée consommée (kWh)				10 312	11 090	7,5%
Energie facturée consommée (kWh)			10 637	10 294	10 522	2,2%
Consommation spécifique (Wh/m3)				50	85	70,0%
Volume pompé (m3)			292 587	204 390	131 220	-35,8%
Temps de fonctionnement (h)			1 663	2 271	2 562	12,8%
PR AUDINCOURT Combottes						
Energie relevée consommée (kWh)				5 132	1 820	-64,5%
Energie facturée consommée (kWh)			1 720	2 296	1 748	-23,9%
Consommation spécifique (Wh/m3)				273	273	0,0%
Volume pompé (m3)			32 360	18 785	6 661	-64,5%
Temps de fonctionnement (h)			1 005	1 445	512	-64,6%
PR AUDINCOURT Foch						
Energie relevée consommée (kWh)			4 181	4 145	3 808	-8,1%
Energie facturée consommée (kWh)			4 180	4 075	3 676	-9,8%
Consommation spécifique (Wh/m3)			26	56	54	-3,6%
Volume pompé (m3)			158 081	74 565	70 185	-5,9%
Temps de fonctionnement (h)			1 666	1 657	1 467	-11,5%
PR AUDINCOURT Gare						
Energie relevée consommée (kWh)				5 159	7 050	36,7%
Energie facturée consommée (kWh)			3 877	5 185	6 551	26,3%
Consommation spécifique (Wh/m3)				53	31	-41,5%
Volume pompé (m3)			321 178	98 022	230 141	134,8%
Temps de fonctionnement (h)			2 194	2 895	3 622	25,1%
PR AUDINCOURT Japy						
Energie relevée consommée (kWh)			640	461	342	-25,8%
Energie facturée consommée (kWh)			645	457	312	-31,7%

Consommation spécifique (Wh/m3)			234	234	160	-31,6%
Volume pompé (m3)			2 736	1 970	2 140	8,6%
Temps de fonctionnement (h)			144	104	97	-6,7%
PR AUDINCOURT Jaurès						
Energie relevée consommée (kWh)			5 213	6 639	6 686	0,7%
Energie facturée consommée (kWh)			5 252	6 534	6 402	-2,0%
Consommation spécifique (Wh/m3)			15	37	30	-18,9%
Volume pompé (m3)			344 538	179 000	224 140	25,2%
Temps de fonctionnement (h)			2 916	3 713	3 481	-6,2%
PR AUDINCOURT La Naille						
Energie relevée consommée (kWh)			960	983	995	1,2%
Energie facturée consommée (kWh)			974	949	955	0,6%
Consommation spécifique (Wh/m3)			66	122	151	23,8%
Volume pompé (m3)			14 482	8 037	6 589	-18,0%
Temps de fonctionnement (h)			418	423	394	-6,9%
PR AUDINCOURT Mairie						
Energie relevée consommée (kWh)			17 584	22 466	18 305	-18,5%
Energie facturée consommée (kWh)			17 712	22 193	17 652	-20,5%
Consommation spécifique (Wh/m3)			20	17	16	-5,9%
Volume pompé (m3)			896 042	1 319 890	1 110 590	-15,9%
Temps de fonctionnement (h)			7 998	10 153	8 543	-15,9%
PR AUDINCOURT Montanot						
Energie relevée consommée (kWh)			1 419	1 111	1 104	-0,6%
Energie facturée consommée (kWh)			1 426	1 091	1 054	-3,4%
Consommation spécifique (Wh/m3)			62	98	153	56,1%
Volume pompé (m3)			22 925	11 362	7 196	-36,7%
Temps de fonctionnement (h)			769	494	466	-5,7%
PR AUDINCOURT Parrot						
Energie relevée consommée (kWh)			3 373	7 052	9 399	33,3%
Energie facturée consommée (kWh)			3 393	6 832	9 144	33,8%
Consommation spécifique (Wh/m3)			47	54	76	40,7%
Volume pompé (m3)			72 543	129 700	123 957	-4,4%
Temps de fonctionnement (h)			3 050	6 485	8 482	30,8%
PR AUDINCOURT Pommeronde						
Energie relevée consommée (kWh)				17 603	3 836	-78,2%
Energie facturée consommée (kWh)			3 792	4 891	3 468	-29,1%
Consommation spécifique (Wh/m3)				321	139	-56,7%
Volume pompé (m3)			82 762	54 820	27 560	-49,7%
Temps de fonctionnement (h)			2 006	2 741	1 378	-49,7%
PR AUDINCOURT Pont de Gland						
Energie relevée consommée (kWh)			2 594	3 027	2 270	-25,0%
Energie facturée consommée (kWh)			2 610	2 841	2 342	-17,6%

Consommation spécifique (Wh/m3)			24	68	50	-26,5%
Volume pompé (m3)			108 721	44 333	45 794	3,3%
Temps de fonctionnement (h)			1 019	1 031	884	-14,3%
PR AUDINCOURT Temple						
Energie relevée consommée (kWh)			71 414	91 199	80 169	-12,1%
Energie facturée consommée (kWh)			72 680	88 351	77 377	-12,4%
Consommation spécifique (Wh/m3)			19	53	53	0,0%
Volume pompé (m3)			3 837 297	1 736 619	1 526 588	-12,1%
Temps de fonctionnement (h)			5 738	7 280	5 667	-22,2%
PR AUDINCOURT Viette						
Energie relevée consommée (kWh)				8 008	6 167	-23,0%
Energie facturée consommée (kWh)			6 706	7 645	6 137	-19,7%
Consommation spécifique (Wh/m3)				35	104	197,1%
Volume pompé (m3)			139 385	229 772	59 120	-74,3%
Temps de fonctionnement (h)			2 773	3 379	2 511	-25,7%
PR AUTECHAUX ROIDE Allée de Bl						
Energie relevée consommée (kWh)				283	593	109,5%
Energie facturée consommée (kWh)	80	689	272	375	565	50,7%
PR BADEVEL BO Rue du Stade						
Energie relevée consommée (kWh)			10 480	21 094	16 903	-19,9%
Energie facturée consommée (kWh)		0	20 530	22 323	17 574	-21,3%
Consommation spécifique (Wh/m3)			32	152	116	-23,7%
Volume pompé (m3)			322 930	138 510	146 054	5,4%
Temps de fonctionnement (h)			4 234	4 617	3 944	-14,6%
PR BADEVEL Fontaine						
Energie relevée consommée (kWh)			3 494	2 750	2 116	-23,1%
Energie facturée consommée (kWh)			3 409	2 908	2 204	-24,2%
Consommation spécifique (Wh/m3)			14	56	48	-14,3%
Volume pompé (m3)			252 599	48 840	44 340	-9,2%
Temps de fonctionnement (h)			2 036	1 628	1 478	-9,2%
PR BART Allan						
Energie relevée consommée (kWh)			14 869	13 754	8 693	-36,8%
Energie facturée consommée (kWh)			14 738	14 034	9 040	-35,6%
Consommation spécifique (Wh/m3)			42	73	68	-6,8%
Volume pompé (m3)			354 596	188 963	128 190	-32,2%
Temps de fonctionnement (h)			2 371	2 609	2 137	-18,1%
PR BART Eaux pluviales						
Temps de fonctionnement (h)				196	83	-57,7%
PR BART La Roche EP						
Energie relevée consommée (kWh)			1 033	1 013	600	-40,8%
Energie facturée consommée (kWh)			1 025	992	641	-35,4%
Consommation spécifique (Wh/m3)			14	31	39	25,8%

Volume pompé (m3)			74 118	33 000	15 575	-52,8%
Temps de fonctionnement (h)			232	220	97	-55,9%
PR BART La Roche EU						
Energie relevée consommée (kWh)			598	579	601	3,8%
Energie facturée consommée (kWh)			589	586	601	2,6%
Consommation spécifique (Wh/m3)			245	210	210	0,0%
Volume pompé (m3)			2 440	2 760	2 860	3,6%
Temps de fonctionnement (h)			61	68	67	-1,5%
PR BART Rupt						
Energie relevée consommée (kWh)				12 979	11 185	-13,8%
Energie facturée consommée (kWh)			9 876	11 962	10 026	-16,2%
Consommation spécifique (Wh/m3)				2 557	2 476	-3,2%
Volume pompé (m3)				5 076	4 518	-11,0%
Temps de fonctionnement (h)				7 517	6 691	-11,0%
PR BAVANS Faurecia						
Energie relevée consommée (kWh)				0	0	0%
Consommation spécifique (Wh/m3)				0	0	0%
Volume pompé (m3)			8 753	11 550	3 080	-73,3%
Temps de fonctionnement (h)			153	345	135	-60,9%
PR BAVANS Gendarmerie						
Energie relevée consommée (kWh)			12 514	12 813	9 522	-25,7%
Energie facturée consommée (kWh)			12 611	12 729	9 755	-23,4%
Consommation spécifique (Wh/m3)			26	47	56	19,1%
Volume pompé (m3)			476 814	271 405	168 705	-37,8%
Temps de fonctionnement (h)			2 078	1 751	1 392	-20,5%
PR BAVANS Sous Roche						
Energie relevée consommée (kWh)			29 749	27 555	18 763	-31,9%
Energie facturée consommée (kWh)			29 236	28 446	19 136	-32,7%
Consommation spécifique (Wh/m3)			52	28	59	110,7%
Volume pompé (m3)			568 925	991 620	316 509	-68,1%
Temps de fonctionnement (h)			8 937	11 018	9 603	-12,8%
PR BERCHE Square						
Energie relevée consommée (kWh)				1 295	1 357	4,8%
Energie facturée consommée (kWh)	1 165	1 250	1 252	1 507	1 368	-9,2%
Consommation spécifique (Wh/m3)				103	-9 556	-9 377,7%
Volume pompé (m3)	28 119	17 520	24 345	12 550	-142	-101,1%
Temps de fonctionnement (h)	492	584	486	594	575	-3,2%
PR BERCHE Vernois						
Energie relevée consommée (kWh)				447	659	47,4%
Energie facturée consommée (kWh)	459	387	572	714	666	-6,7%
Consommation spécifique (Wh/m3)				177	136	-23,2%
Volume pompé (m3)	1 836	1 750	4 822	2 528	4 861	92,3%

Temps de fonctionnement (h)	39	130	256	251	243	-3,2%
PR BERCHE ZI ZB						
Energie relevée consommée (kWh)			16 695	16 547	11 662	-29,5%
Energie facturée consommée (kWh)			16 485	16 704	12 086	-27,6%
Consommation spécifique (Wh/m3)			34	39	143	266,7%
Volume pompé (m3)			484 964	422 730	81 434	-80,7%
Temps de fonctionnement (h)			4 094	3 843	1 145	-70,2%
PR BETHONCOURT Ecole						
Energie relevée consommée (kWh)			14 457	14 651	10 504	-28,3%
Energie facturée consommée (kWh)			13 318	15 208	10 676	-29,8%
Consommation spécifique (Wh/m3)			52	53	52	-1,9%
Volume pompé (m3)			279 400	276 800	200 184	-27,7%
Temps de fonctionnement (h)			1 397	1 384	1 112	-19,7%
PR BETHONCOURT La Prusse						
Energie relevée consommée (kWh)			1 605	1 386	912	-34,2%
Energie facturée consommée (kWh)			1 524	1 414	971	-31,3%
Consommation spécifique (Wh/m3)			55	52	61	17,3%
Volume pompé (m3)			29 316	26 404	14 896	-43,6%
Temps de fonctionnement (h)			1 047	943	532	-43,6%
PR BETHONCOURT Mittan						
Energie relevée consommée (kWh)			13 022	15 662	12 434	-20,6%
Energie facturée consommée (kWh)			12 780	15 426	13 161	-14,7%
Consommation spécifique (Wh/m3)			59	60	53	-11,7%
Volume pompé (m3)			221 970	262 395	235 690	-10,2%
Temps de fonctionnement (h)			906	1 071	962	-10,2%
PR BETHONCOURT Ruderop						
Energie relevée consommée (kWh)			828	764	833	9,0%
Energie facturée consommée (kWh)			806	797	828	3,9%
Consommation spécifique (Wh/m3)			149	557	227	-59,2%
Volume pompé (m3)			5 574	1 372	3 663	167,0%
Temps de fonctionnement (h)			181	98	268	173,5%
PR BLAMONT Orée du Bois						
Energie relevée consommée (kWh)				0	852	100%
Energie facturée consommée (kWh)	211	365	481	520	795	52,9%
Consommation spécifique (Wh/m3)				0		
Volume pompé (m3)		0	0	0		
Temps de fonctionnement (h)	772	299	380	325	29	-91,1%
PR BLAMONT Scotton						
Energie relevée consommée (kWh)				0	259	100%
Energie facturée consommée (kWh)	208	209	247	236	242	2,5%
Consommation spécifique (Wh/m3)				0		
Volume pompé (m3)	8 964	0	0	0		

Temps de fonctionnement (h)	50	57	89	73	77	5,5%
PR BONDEVAL rue de Thulay						
Energie relevée consommée (kWh)				0	837	100%
Energie facturée consommée (kWh)	775	718				
Consommation spécifique (Wh/m3)				0		
Volume pompé (m3)	12 702	72 152	15 660	0		
Temps de fonctionnement (h)	212	3 023	261	287	242	-15,7%
PR BOURGUIGNON Champagne						
Energie relevée consommée (kWh)			634	713	745	4,5%
Energie facturée consommée (kWh)	794	675	776	793	714	-10,0%
Consommation spécifique (Wh/m3)			148	123	141	14,6%
Volume pompé (m3)		6 480	4 284	5 796	5 302	-8,5%
Temps de fonctionnement (h)	312	216	240	276	250	-9,4%
PR BOURGUIGNON Chassagne						
Energie relevée consommée (kWh)			570	481	559	16,2%
Energie facturée consommée (kWh)		93	567	545	531	-2,6%
Consommation spécifique (Wh/m3)			75	83		
Volume pompé (m3)		5 310	7 590	5 820		
Temps de fonctionnement (h)	204	177	253	194	88	-54,6%
PR BOURGUIGNON Forges						
Energie relevée consommée (kWh)			8 484	6 441	5 914	-8,2%
Energie facturée consommée (kWh)	10 359	8 574	7 725	9 863	5 523	-44,0%
Consommation spécifique (Wh/m3)			367	242	153	-36,8%
Volume pompé (m3)		32 850	23 115	26 641	38 693	45,2%
Temps de fonctionnement (h)	2 884	2 190	2 009	2 315	1 173	-49,3%
PR BOURGUIGNON Le Pont						
Energie relevée consommée (kWh)			1 647	1 091	1 932	77,1%
Energie facturée consommée (kWh)	1 941	1 241	1 620	1 929	1 828	-5,2%
Consommation spécifique (Wh/m3)			25	13	73	461,5%
Volume pompé (m3)			67 120	82 080	26 541	-67,7%
Temps de fonctionnement (h)	1 045		839	900	868	-3,6%
PR BROGNARD Les Esserts						
Energie relevée consommée (kWh)			514	550	572	4,0%
Energie facturée consommée (kWh)			530	540	579	7,2%
Consommation spécifique (Wh/m3)			134	424	425	0,2%
Volume pompé (m3)			3 827	1 296	1 347	3,9%
Temps de fonctionnement (h)			69	36	64	77,8%
PR BROGNARD Vervel						
Energie relevée consommée (kWh)				21 908	17 490	-20,2%
Energie facturée consommée (kWh)			16 630	20 959	18 819	-10,2%
Consommation spécifique (Wh/m3)				81	110	35,8%
Volume pompé (m3)			310 653	270 970	159 275	-41,2%

Temps de fonctionnement (h)			3 551	4 400	3 902	-11,3%
PR COLOMBIER La Raydans						
Energie relevée consommée (kWh)				16 076	11 849	-26,3%
Energie facturée consommée (kWh)	10 897	6 214	12 060	17 922	11 950	-33,3%
Consommation spécifique (Wh/m3)				6	425	6 983,3%
Volume pompé (m3)	58 617	48 718	57 506	2 915 879	27 889	-99,0%
Temps de fonctionnement (h)	3 696	2 436	3 019	4 297	2 241	-47,8%
PR COLOMBIER Les Cités						
Energie relevée consommée (kWh)				2 535	4 387	73,1%
Energie facturée consommée (kWh)	4 986	2 044	3 143	3 220	3 176	-1,4%
Consommation spécifique (Wh/m3)				915	109	-88,1%
Volume pompé (m3)	50 848	31 703	49 906	2 769	40 269	1 354,3%
Temps de fonctionnement (h)	2 915	1 584	2 393	3 297	2 012	-39,0%
PR COLOMBIER rue du Doubs						
Energie relevée consommée (kWh)				16 076	1 970	-87,7%
Energie facturée consommée (kWh)	17 279	13 211	18 800	19 385	16 754	-13,6%
Consommation spécifique (Wh/m3)				7 222	17	-99,8%
Volume pompé (m3)	133 371	6 310	125 713	2 226	112 651	4 960,7%
Temps de fonctionnement (h)	1 834	535	2 176	2 435	1 905	-21,8%
PR COURCELLES						
Energie relevée consommée (kWh)			3 066	4 002	3 424	-14,4%
Energie facturée consommée (kWh)			3 024	3 407	3 255	-4,5%
Consommation spécifique (Wh/m3)			14	14	28	100,0%
Volume pompé (m3)			224 349	292 832	123 945	-57,7%
Temps de fonctionnement (h)			1 009	1 317	1 127	-14,4%
PR COURCELLES Aérodrome						
Energie relevée consommée (kWh)			1 115	1 356	918	-32,3%
Energie facturée consommée (kWh)			1 296	1 200	900	-25,0%
Consommation spécifique (Wh/m3)			154	109	159	45,9%
Volume pompé (m3)			7 246	12 450	5 775	-53,6%
Temps de fonctionnement (h)			496	830	385	-53,6%
PR COURCELLES Bis						
Energie relevée consommée (kWh)			6 327	8 719	9 661	10,8%
Energie facturée consommée (kWh)			6 256	8 816	5 261	-40,3%
Consommation spécifique (Wh/m3)			74	148	185	25,0%
Volume pompé (m3)			85 797	58 755	52 215	-11,1%
Temps de fonctionnement (h)			2 569	1 951	2 162	10,8%
PR COURCELLES EP amont						
Energie relevée consommée (kWh)				22 522	946	-95,8%
Energie facturée consommée (kWh)			1 486	1 481	1 443	-2,6%
PR DAMBENOIS Oichottes						
Energie relevée consommée (kWh)			711	4 138	2 163	-47,7%

Energie facturée consommée (kWh)			2 947	4 044	2 333	-42,3%
Consommation spécifique (Wh/m3)			20	77	104	35,1%
Volume pompé (m3)			36 371	53 465	20 850	-61,0%
Temps de fonctionnement (h)			983	1 445	619	-57,2%
PR DAMBENOIS Sillons						
Energie relevée consommée (kWh)				5 676	3 804	-33,0%
Energie facturée consommée (kWh)			4 527	5 384	4 150	-22,9%
Consommation spécifique (Wh/m3)				65	61	-6,2%
Volume pompé (m3)			137 906	86 839	62 880	-27,6%
Temps de fonctionnement (h)			1 503	2 347	1 441	-38,6%
PR DAMPIERRE Breuil						
Energie relevée consommée (kWh)				1 039	6 817	556,1%
Energie facturée consommée (kWh)	850	1 208	1 124	1 212	1 068	-11,9%
Consommation spécifique (Wh/m3)				105		
Volume pompé (m3)	5 256	10 840	8 670	9 900		
Temps de fonctionnement (h)	526	1 084	867	990	762	-23,0%
PR DAMPIERRE L'Orée du Bois						
Energie relevée consommée (kWh)				113	128	13,3%
Energie facturée consommée (kWh)	326	155	135	131	128	-2,3%
Consommation spécifique (Wh/m3)				169		
Volume pompé (m3)	15 440	2 160	0	670		
Temps de fonctionnement (h)	772	216	0	67	64	-4,5%
PR DAMPIERRE SUR DOUBS Canal						
Energie relevée consommée (kWh)			17 057	19 920		
Energie facturée consommée (kWh)			16 740	20 217	15 709	-22,3%
Consommation spécifique (Wh/m3)			22	22		
Volume pompé (m3)			765 410	893 796	353 904	-60,4%
Temps de fonctionnement (h)			4 054	4 734	4 181	-11,7%
PR DAMPIERRE SUR DOUBS Eglise						
Energie relevée consommée (kWh)			14 983	16 389		
Energie facturée consommée (kWh)			14 615	16 772	15 157	-9,6%
Consommation spécifique (Wh/m3)			26	39		
Volume pompé (m3)			572 187	421 830		
Temps de fonctionnement (h)			4 277	4 905		
PR ECHENANS Route de Semondans						
Energie relevée consommée (kWh)				8 895	7 152	-19,6%
Energie facturée consommée (kWh)			11 698	10 277	6 303	-38,7%
Volume pompé (m3)		220 520				
Temps de fonctionnement (h)		11 026		4 925	2 859	-41,9%
PR ETOUVANS Commandant Joly						
Energie relevée consommée (kWh)				2 496	1 479	-40,7%
Energie facturée consommée (kWh)	2 106	2 764	6 351	3 174	1 479	-53,4%

Consommation spécifique (Wh/m3)				107		
Volume pompé (m3)	25 747	24 820	50 770	23 360		
Temps de fonctionnement (h)	1 430	2 482	5 077	2 336	579	-75,2%
PR ETUPES Canal						
Energie relevée consommée (kWh)			16 962	20 708	15 359	-25,8%
Energie facturée consommée (kWh)			17 028	20 757	16 520	-20,4%
Consommation spécifique (Wh/m3)			25	40	45	12,5%
Volume pompé (m3)			669 735	514 440	343 325	-33,3%
Temps de fonctionnement (h)			3 535	4 287	3 326	-22,4%
PR ETUPES Technoland						
Energie relevée consommée (kWh)				1 035	1 213	17,2%
Energie facturée consommée (kWh)				1 025	1 220	19,0%
Consommation spécifique (Wh/m3)				37	37	0,0%
Volume pompé (m3)			31 926	27 790	32 569	17,2%
Temps de fonctionnement (h)			406	397	465	17,1%
PR ETUPES ZI						
Energie relevée consommée (kWh)			55 364	58 634	46 571	-20,6%
Energie facturée consommée (kWh)			46 913	58 622	47 382	-19,2%
Consommation spécifique (Wh/m3)			39	62	62	0,0%
Volume pompé (m3)			1 429 653	949 284	753 984	-20,6%
Temps de fonctionnement (h)			2 978	3 767	2 992	-20,6%
PR EXINCOURT Mines						
Energie relevée consommée (kWh)			5 815	8 226	6 707	-18,5%
Energie facturée consommée (kWh)			6 102	7 707	6 349	-17,6%
Consommation spécifique (Wh/m3)			18	34	45	32,4%
Volume pompé (m3)			326 840	241 338	148 494	-38,5%
Temps de fonctionnement (h)			2 306	2 774	2 034	-26,7%
PR EXINCOURT Nord						
Energie relevée consommée (kWh)			89 973	107 289	60 617	-43,5%
Energie facturée consommée (kWh)			91 738	107 249	86 370	-19,5%
Consommation spécifique (Wh/m3)			29	82	40	-51,2%
Volume pompé (m3)			3 069 150	1 313 130	1 532 535	16,7%
Temps de fonctionnement (h)			8 243	10 101	5 707	-43,5%
PR FESCHES LE CHATEL Casserie						
Energie relevée consommée (kWh)				7 189	5 492	-23,6%
Energie facturée consommée (kWh)			6 113	7 200	5 792	-19,6%
Consommation spécifique (Wh/m3)				44	34	-22,7%
Volume pompé (m3)			354 819	164 354	162 860	-0,9%
Temps de fonctionnement (h)			3 694	4 435	3 590	-19,1%
PR FESCHES LE CHATEL Dormoy						
Energie relevée consommée (kWh)			25 267	35 197	32 768	-6,9%
Energie facturée consommée (kWh)			25 210	34 523	33 933	-1,7%

Consommation spécifique (Wh/m3)			28	88	86	-2,3%
Volume pompé (m3)			889 730	398 090	381 755	-4,1%
Temps de fonctionnement (h)			5 072	7 238	6 941	-4,1%
PR FESCHES LE CHATEL Ecluse						
Energie relevée consommée (kWh)			16 626	19 789	16 544	-16,4%
Energie facturée consommée (kWh)			16 641	19 891	16 801	-15,5%
Consommation spécifique (Wh/m3)			27	39	39	0,0%
Volume pompé (m3)			615 704	502 512	420 110	-16,4%
Temps de fonctionnement (h)			4 705	5 776	4 828	-16,4%
PR FESCHES LE CHATEL Paquis						
Energie relevée consommée (kWh)			832	1 008	815	-19,1%
Energie facturée consommée (kWh)			832	949	875	-7,8%
Consommation spécifique (Wh/m3)			50	47	55	17,0%
Volume pompé (m3)			16 760	21 500	14 800	-31,2%
Temps de fonctionnement (h)			838	1 075	741	-31,1%
PR FESCHES LE CHATEL Rondelot						
Energie relevée consommée (kWh)			444	426	475	11,5%
Energie facturée consommée (kWh)			439	430	472	9,8%
Consommation spécifique (Wh/m3)			113	670	259	-61,3%
Volume pompé (m3)			3 923	636	1 831	187,9%
Temps de fonctionnement (h)			73	60	85	41,7%
PR FESCHES LE CHATEL Verdun						
Energie relevée consommée (kWh)			2 391	2 884	2 000	-30,7%
Energie facturée consommée (kWh)			2 390	2 799	2 133	-23,8%
Consommation spécifique (Wh/m3)			26	50	55	10,0%
Volume pompé (m3)			90 387	57 155	36 260	-36,6%
Temps de fonctionnement (h)			1 297	1 663	1 036	-37,7%
PR FEULE Secteur Pommerey						
Energie relevée consommée (kWh)				418	581	39,0%
Energie facturée consommée (kWh)	486	499	630	507	581	14,6%
Consommation spécifique (Wh/m3)				128		
Volume pompé (m3)		10 950		3 263		
Temps de fonctionnement (h)	2 572	365		47	399	748,9%
PR GOUX rue des Champs Moireys						
Energie relevée consommée (kWh)				0	313	100%
Energie facturée consommée (kWh)	387	344	355	338	311	-8,0%
Consommation spécifique (Wh/m3)				0		
Volume pompé (m3)	2 850	2 920	2 300	3 560		
Temps de fonctionnement (h)	150	146	115	178	178	0,0%
PR GOUX rue sous Miecourt						
Energie relevée consommée (kWh)				0	7 616	100%
Energie facturée consommée (kWh)	15 710	6 876	10 387	9 257	7 343	-20,7%

Consommation spécifique (Wh/m3)				0		
Volume pompé (m3)	14 660	14 600	19 560	17 420		
Temps de fonctionnement (h)	1 466	730	978	870	726	-16,6%
PR GRAND CHARMONT Mairie						
Energie facturée consommée (kWh)					683	
PR GRAND-CHARMONT Pergaud						
Energie relevée consommée (kWh)			1 210	741	842	13,6%
Consommation spécifique (Wh/m3)			66	79	110	39,2%
Volume pompé (m3)			18 252	9 380	7 682	-18,1%
Temps de fonctionnement (h)			686	469	559	19,2%
PR HERIMONCOURT Berne						
Energie relevée consommée (kWh)			646	662	634	-4,2%
Energie facturée consommée (kWh)			629	678	647	-4,6%
Consommation spécifique (Wh/m3)			185	256	337	31,6%
Volume pompé (m3)			3 489	2 584	1 881	-27,2%
Temps de fonctionnement (h)			53	68	60	-11,8%
PR HERIMONCOURT La Lanne						
Energie relevée consommée (kWh)			1 247	1 397		
Energie facturée consommée (kWh)			1 174	1 391	1 087	-21,9%
Consommation spécifique (Wh/m3)			41	91		
Volume pompé (m3)			30 228	15 340	13 457	-12,3%
Temps de fonctionnement (h)			465	590	402	-31,9%
PR LONGEVELLE Auto Ecole						
Energie relevée consommée (kWh)				2 211	1 984	-10,3%
Energie facturée consommée (kWh)	1 401	779	1 702	2 522	1 843	-26,9%
Consommation spécifique (Wh/m3)				38		
Volume pompé (m3)	14 949	6 570	34 260	58 560		
Temps de fonctionnement (h)	996	394	1 142	1 688	1 210	-28,3%
PR LONGEVELLE Bar						
Energie relevée consommée (kWh)				16 060	16 042	-0,1%
Energie facturée consommée (kWh)	20 457	13 545	13 505	18 043	12 024	-33,4%
Consommation spécifique (Wh/m3)				10	530	5 200,0%
Volume pompé (m3)	38 322	42 168	30 705	1 560 935	30 253	-98,1%
Temps de fonctionnement (h)	2 345	2 480	1 896	2 787	1 744	-37,4%
PR LONGEVELLE Les Beussières						
Energie relevée consommée (kWh)				1 562	1 656	6,0%
Energie facturée consommée (kWh)	1 330	733	1 360	1 746	1 592	-8,8%
Consommation spécifique (Wh/m3)				37		
Volume pompé (m3)	14 288	10 950	27 000	41 700		
Temps de fonctionnement (h)	893	566	900	1 390	1 304	-6,2%
PR LONGEVELLE Passerelle						
Energie relevée consommée (kWh)				8 265	8 478	2,6%

Energie facturée consommée (kWh)	7 805	7 366	7 253	8 898	8 398	-5,6%
Consommation spécifique (Wh/m3)				111	50	-55,0%
Volume pompé (m3)	141 672	90	137	74 580	168 320	125,7%
Temps de fonctionnement (h)	2 156	6 367	7 821	4 972	8 346	67,9%
PR LOUGRES Ecole						
Energie relevée consommée (kWh)				6 146	8 985	46,2%
Energie facturée consommée (kWh)	5 016	2 390	3 562	6 968	5 518	-20,8%
Consommation spécifique (Wh/m3)				87		
Volume pompé (m3)	13 187	21 900	48 900	70 580		
Temps de fonctionnement (h)	3 283	1 657	2 445	3 146	2 796	-11,1%
PR LOUGRES Rue de Verdez						
Energie relevée consommée (kWh)				12 731	18 467	45,1%
Energie facturée consommée (kWh)	13 734	8 633	14 353	15 437	17 344	12,4%
Consommation spécifique (Wh/m3)				161	202	25,5%
Volume pompé (m3)	57 397	51 893	62 436	79 086	91 392	15,6%
Temps de fonctionnement (h)	3 276	2 471	2 963	31 006	4 332	-86,0%
PR LOUGRES Stade						
Energie relevée consommée (kWh)				1 161	1 798	54,9%
Energie facturée consommée (kWh)		7	553	1 340	1 698	26,7%
Consommation spécifique (Wh/m3)				83		
Volume pompé (m3)	3 862	7 300	6 000	14 040		
Temps de fonctionnement (h)	1 103	775	300	602	739	22,8%
PR LOUGRES 3 Cantons						
Energie relevée consommée (kWh)				36 290	6 533	-82,0%
Energie facturée consommée (kWh)	15 491	5 571	7 242	7 195	6 563	-8,8%
Consommation spécifique (Wh/m3)				16	66	312,5%
Volume pompé (m3)	140 249	14 600	95 224	2 211 033	98 906	-95,5%
Temps de fonctionnement (h)	4 667	1 391	2 555	3 032	2 518	-17,0%
PR MANDEURE Anglots						
Energie relevée consommée (kWh)				2 133	1 922	-9,9%
Energie facturée consommée (kWh)			1 574	2 185	2 075	-5,0%
Consommation spécifique (Wh/m3)				114	112	-1,8%
Volume pompé (m3)			15 150	18 650	17 200	-7,8%
Temps de fonctionnement (h)			606	746	688	-7,8%
PR MANDEURE Courcelotte						
Energie relevée consommée (kWh)				522	502	-3,8%
Energie facturée consommée (kWh)			566	548	509	-7,1%
Consommation spécifique (Wh/m3)				8 700	10 681	22,8%
Volume pompé (m3)			121	60	47	-21,7%
Temps de fonctionnement (h)			7	6	5	-16,7%
PR MANDEURE Eglantiers						
Energie relevée consommée (kWh)			758	561	555	-1,1%

Energie facturée consommée (kWh)			732	587	561	-4,4%
Consommation spécifique (Wh/m3)			102	147	163	10,9%
Volume pompé (m3)			7 400	3 820	3 400	-11,0%
Temps de fonctionnement (h)			370	191	170	-11,0%
PR MANDEURE Les Chênes						
Energie relevée consommée (kWh)			766	686	699	1,9%
Energie facturée consommée (kWh)			738	713	706	-1,0%
Consommation spécifique (Wh/m3)			52	191	196	2,6%
Volume pompé (m3)			14 840	3 600	3 560	-1,1%
Temps de fonctionnement (h)			208	180	178	-1,1%
PR MANDEURE Papeterie						
Energie relevée consommée (kWh)				10 615	1 902	-82,1%
Energie facturée consommée (kWh)			9 662	10 861	11 051	1,7%
Consommation spécifique (Wh/m3)				246	77	-68,7%
Volume pompé (m3)			44 400	43 120	24 720	-42,7%
Temps de fonctionnement (h)			1 110	1 078	618	-42,7%
PR MANDEURE Poste						
Energie relevée consommée (kWh)			550	492	438	-11,0%
Energie facturée consommée (kWh)			520	519	449	-13,5%
Consommation spécifique (Wh/m3)			170	324	267	-17,6%
Volume pompé (m3)			3 241	1 517	1 640	8,1%
Temps de fonctionnement (h)			44	37	40	8,1%
PR MANDEURE Romaine						
Energie relevée consommée (kWh)			19 199	17 063	19 153	12,2%
Energie facturée consommée (kWh)			18 603	18 095	12 854	-29,0%
Consommation spécifique (Wh/m3)			57	55	86	56,4%
Volume pompé (m3)			336 050	308 050	221 700	-28,0%
Temps de fonctionnement (h)			6 721	6 161	4 434	-28,0%
PR MATHAY Acacias						
Energie relevée consommée (kWh)			540	550	613	11,5%
Energie facturée consommée (kWh)			527	553	603	9,0%
Consommation spécifique (Wh/m3)			5	527	527	0,0%
Volume pompé (m3)			101 196	1 044	1 163	11,4%
Temps de fonctionnement (h)			167	87	97	11,5%
PR MATHAY AVIATEUR						
Energie facturée consommée (kWh)				589	611	3,7%
PR MATHAY Cèdres						
Energie relevée consommée (kWh)			397	379	367	-3,2%
Energie facturée consommée (kWh)			387	384	375	-2,3%
Consommation spécifique (Wh/m3)			167	233	239	2,6%
Volume pompé (m3)			2 382	1 629	1 537	-5,6%
Temps de fonctionnement (h)			397	379	93	-75,5%

PR MATHAY Champ de l'Epine						
Energie relevée consommée (kWh)			614	608	773	27,1%
Energie facturée consommée (kWh)			593	615	609	-1,0%
Consommation spécifique (Wh/m3)			68	60	107	78,3%
Volume pompé (m3)			9 030	10 150	7 244	-28,6%
Temps de fonctionnement (h)			129	145	131	-9,7%
PR MATHAY Europe						
Energie relevée consommée (kWh)			1 320	1 331	1 598	20,1%
Energie facturée consommée (kWh)			1 280	1 353	1 628	20,3%
Consommation spécifique (Wh/m3)			16	16	26	62,5%
Volume pompé (m3)			84 702	81 510	61 636	-24,4%
Temps de fonctionnement (h)			2 229	2 145	1 622	-24,4%
PR MATHAY Gaiffe						
Energie relevée consommée (kWh)			3 113	3 122	3 247	4,0%
Energie facturée consommée (kWh)			2 906	3 295	3 306	0,3%
Consommation spécifique (Wh/m3)			53	51	29	-43,1%
Volume pompé (m3)			58 996	61 292	113 068	84,5%
Temps de fonctionnement (h)			2 107	2 189	2 375	8,5%
PR MATHAY Le Pont						
Energie relevée consommée (kWh)			8 501	11 159	8 105	-27,4%
Energie facturée consommée (kWh)			8 230	11 316	8 323	-26,4%
Consommation spécifique (Wh/m3)			49	43	43	0,0%
Volume pompé (m3)			173 228	261 502	189 934	-27,4%
Temps de fonctionnement (h)			3 799	4 934	3 583	-27,4%
PR MATHAY Longueraies						
Energie relevée consommée (kWh)			769	803	711	-11,5%
Energie facturée consommée (kWh)			943	959	942	-1,8%
Consommation spécifique (Wh/m3)			150	86	254	195,3%
Volume pompé (m3)			5 130	9 285	2 802	-69,8%
Temps de fonctionnement (h)			342	310	339	9,4%
PR MATHAY Salle des Fêtes						
Energie relevée consommée (kWh)			959	949	444	-53,2%
Energie facturée consommée (kWh)			756	808	729	-9,8%
Consommation spécifique (Wh/m3)			90	204	97	-52,5%
Volume pompé (m3)			10 687	4 650	4 594	-1,2%
Temps de fonctionnement (h)			351	312	293	-6,1%
PR MATHAY Vallères						
Energie relevée consommée (kWh)			558	678	563	-17,0%
Energie facturée consommée (kWh)			534	698	568	-18,6%
Consommation spécifique (Wh/m3)			304	208	365	75,5%
Volume pompé (m3)			1 837	3 267	1 543	-52,8%
Temps de fonctionnement (h)			167	297	185	-37,7%

PR MONTBELIARD Alliés						
Energie relevée consommée (kWh)			1 311	1 238	1 504	21,5%
Energie facturée consommée (kWh)			1 285	1 311	1 381	5,3%
Consommation spécifique (Wh/m3)			75	75	78	4,0%
Volume pompé (m3)			17 450	16 475	19 363	17,5%
Temps de fonctionnement (h)			698	659	801	21,5%
PR MONTBELIARD BO Hollande						
Energie relevée consommée (kWh)			139 716	146 507	116 126	-20,7%
Energie facturée consommée (kWh)			137 351	145 970	109 359	-25,1%
Consommation spécifique (Wh/m3)			44	44	44	0,0%
Volume pompé (m3)			3 154 362	3 307 682	2 621 771	-20,7%
Temps de fonctionnement (h)			8 197	8 595	6 812	-20,7%
PR MONTBELIARD Bonal EP						
Energie relevée consommée (kWh)			405	438	430	-1,8%
Energie facturée consommée (kWh)			403	438	437	-0,2%
Consommation spécifique (Wh/m3)			122	113	281	148,7%
Volume pompé (m3)			3 331	3 886	1 532	-60,6%
Temps de fonctionnement (h)			18	21	14	-33,3%
PR MONTBELIARD Bonal EU						
Energie relevée consommée (kWh)			2 362	2 403	1 710	-28,8%
Energie facturée consommée (kWh)			2 352	2 420	2 080	-14,0%
Consommation spécifique (Wh/m3)			18	26	61	134,6%
Volume pompé (m3)			128 130	93 060	28 017	-69,9%
Temps de fonctionnement (h)			875	846	748	-11,6%
PR MONTBELIARD Cuvier						
Energie relevée consommée (kWh)			4 153	2 534	2 443	-3,6%
Energie facturée consommée (kWh)			2 135	2 440	2 349	-3,7%
Consommation spécifique (Wh/m3)			52	25	25	0,0%
Volume pompé (m3)			80 492	100 520	99 540	-1,0%
Temps de fonctionnement (h)			1 206	1 433	1 422	-0,8%
PR MONTBELIARD Emmanüs						
Energie relevée consommée (kWh)				7 372	3 845	-47,8%
Energie facturée consommée (kWh)			6 824	7 384	4 165	-43,6%
Consommation spécifique (Wh/m3)				1 002	1 127	12,5%
Volume pompé (m3)			7 616	7 360	3 411	-53,7%
Temps de fonctionnement (h)			476	460	327	-28,9%
PR MONTBELIARD Gare						
Energie relevée consommée (kWh)			2 378	3 165	2 920	-7,7%
Energie facturée consommée (kWh)			2 338	3 251	2 743	-15,6%
Consommation spécifique (Wh/m3)			41	160	78	-51,3%
Volume pompé (m3)			57 986	19 721	37 342	89,4%
Temps de fonctionnement (h)			1 063	1 521	1 314	-13,6%

PR MONTBELIARD Helvétie						
Energie relevée consommée (kWh)			2 342	2 433	1 101	-54,7%
Energie facturée consommée (kWh)			2 293	1 771	1 045	-41,0%
Consommation spécifique (Wh/m3)			1 188	999	1 460	46,1%
Volume pompé (m3)			1 972	2 436	754	-69,0%
Temps de fonctionnement (h)			34	42	13	-69,0%
PR MONTBELIARD Mont Chevis						
Energie relevée consommée (kWh)			18 795	14 732	10 539	-28,5%
Energie facturée consommée (kWh)			18 082	15 520	10 622	-31,6%
Consommation spécifique (Wh/m3)			245	377	572	51,7%
Volume pompé (m3)			76 833	39 060	18 432	-52,8%
Temps de fonctionnement (h)			4 626	3 255	1 536	-52,8%
PR MONTBELIARD Neuf Moulins						
Energie relevée consommée (kWh)			3 879	4 499	3 628	-19,4%
Energie facturée consommée (kWh)			3 838	4 637	3 382	-27,1%
Consommation spécifique (Wh/m3)			39	61	69	13,1%
Volume pompé (m3)			98 783	73 632	52 879	-28,2%
Temps de fonctionnement (h)			1 321	1 534	1 063	-30,7%
PR MONTBELIARD Parietti						
Energie relevée consommée (kWh)			30 206	36 595	14 829	-59,5%
Energie facturée consommée (kWh)			29 559	30 984	21 809	-29,6%
Consommation spécifique (Wh/m3)			18	36	23	-36,1%
Volume pompé (m3)			1 710 922	1 021 200	645 664	-36,8%
Temps de fonctionnement (h)			3 200	3 404	2 695	-20,8%
PR MONTBELIARD Pied des Goutes						
Energie relevée consommée (kWh)			2 722	2 392	2 421	1,2%
Energie facturée consommée (kWh)			2 674	2 478	2 422	-2,3%
Consommation spécifique (Wh/m3)			135	84	81	-3,6%
Volume pompé (m3)			20 128	28 443	30 001	5,5%
Temps de fonctionnement (h)			1 517	1 497	1 579	5,5%
PR MONTBELIARD Prairie						
Energie relevée consommée (kWh)			41 486	35 941	30 833	-14,2%
Energie facturée consommée (kWh)			33 819	36 328	32 026	-11,8%
Consommation spécifique (Wh/m3)			139	63	71	12,7%
Volume pompé (m3)			298 623	574 425	435 825	-24,1%
Temps de fonctionnement (h)			6 593	7 659	5 811	-24,1%
PR MONTBELIARD Prison						
Energie relevée consommée (kWh)			55 531	66 924	53 827	-19,6%
Energie facturée consommée (kWh)			63 903	69 857	56 672	-18,9%
Consommation spécifique (Wh/m3)			38	41	53	29,3%
Volume pompé (m3)			1 455 600	1 631 100	1 018 926	-37,5%
Temps de fonctionnement (h)			4 852	5 437	4 373	-19,6%

PR MONTBELIARD Route de Laire						
Energie relevée consommée (kWh)				9 159	7 037	-23,2%
Energie facturée consommée (kWh)			1 520	1 634		
Consommation spécifique (Wh/m3)				1 179	2 098	77,9%
Volume pompé (m3)			7 191	7 770	3 354	-56,8%
Temps de fonctionnement (h)			232	259	199	-23,2%
PR MONTBELIARD Velotte						
Energie relevée consommée (kWh)			1 570	1 614	1 588	-1,6%
Energie facturée consommée (kWh)			1 545	1 639	1 570	-4,2%
Consommation spécifique (Wh/m3)			23	80	43	-46,3%
Volume pompé (m3)			68 254	20 273	36 583	80,5%
Temps de fonctionnement (h)			915	1 067	950	-11,0%
PR MONTBELIARD ZUP Bis						
Energie relevée consommée (kWh)			4 145	4 273	2 485	-41,8%
Energie facturée consommée (kWh)			3 641	4 673	2 949	-36,9%
Consommation spécifique (Wh/m3)			63	126	100	-20,6%
Volume pompé (m3)			65 964	33 900	24 909	-26,5%
Temps de fonctionnement (h)			918	1 130	723	-36,0%
PR NOIREFONTAINE 1 Grande Font						
Volume pompé (m3)		553				
PR NOIREFONTAINE 11 - Mairie						
Volume pompé (m3)		3 206				
PR NOIREFONTAINE 3 - Piste cycl						
Volume pompé (m3)		30 403				
PR NOMMAY Coteau						
Energie relevée consommée (kWh)			1 327	1 406	11 353	707,5%
Energie facturée consommée (kWh)			1 292	1 387	1 218	-12,2%
Consommation spécifique (Wh/m3)			33	63	633	904,8%
Volume pompé (m3)			40 451	22 358	17 940	-19,8%
Temps de fonctionnement (h)			711	801	595	-25,7%
PR NOMMAY Savoureuse						
Energie relevée consommée (kWh)				455	408	-10,3%
Energie facturée consommée (kWh)			473	433	447	3,2%
Consommation spécifique (Wh/m3)				316	316	0,0%
Volume pompé (m3)				1 440	1 291	-10,3%
Temps de fonctionnement (h)			89	120	107	-10,8%
PR PONT DE ROIDE Cuchot						
Energie relevée consommée (kWh)			376	440	394	-10,5%
Energie facturée consommée (kWh)	365	335	401	451	381	-15,5%
Consommation spécifique (Wh/m3)			206	164	30	-81,7%
Volume pompé (m3)	9 596	10 950	1 826	2 684	13 098	388,0%
Temps de fonctionnement (h)	192	183	166	244	234	-4,1%

PR PONT DE ROIDE En Presle						
Energie relevée consommée (kWh)			3 600	4 467	4 449	-0,4%
Energie facturée consommée (kWh)	6 232	3 877	4 926	4 892	4 266	-12,8%
Consommation spécifique (Wh/m3)			19	22		
Volume pompé (m3)	107 400	21 900	191 100	205 200		
Temps de fonctionnement (h)	2 148	270	2 548	2 736	2 187	-20,1%
PR PONT DE ROIDE Moulin						
Energie relevée consommée (kWh)			202	208	61	-70,7%
Energie facturée consommée (kWh)	357	235	681	256	161	-37,1%
Consommation spécifique (Wh/m3)			17	30		
Volume pompé (m3)	3 310	3 300	11 680	6 880		
Temps de fonctionnement (h)	66	60	146	86		
PR PONT DE ROIDE Passerelle						
Energie relevée consommée (kWh)			13 858	18 334	17 625	-3,9%
Energie facturée consommée (kWh)	17 578	11 409	13 136	18 329		
Consommation spécifique (Wh/m3)			63	63	32	-49,2%
Volume pompé (m3)	281 931	178 007	219 600	292 980	558 078	90,5%
Temps de fonctionnement (h)	5 639	2 594	4 060	4 883	4 299	-12,0%
PR PONT DE ROIDE Perception						
Energie relevée consommée (kWh)			202	1 162	933	-19,7%
Energie facturée consommée (kWh)		1 656	1 594	1 295	1 018	-21,4%
Consommation spécifique (Wh/m3)			3	28		
Volume pompé (m3)	29 469	22 330	73 440	42 000		
Temps de fonctionnement (h)	589	306	918	525	475	-9,5%
PR PONT DE ROIDE Services tech						
Volume pompé (m3)	26 906	14 400	19 140	32 460	16 359	-49,6%
Temps de fonctionnement (h)	538	480	638	1 082	1 143	5,6%
PR PONT DE ROIDE Zac						
Energie relevée consommée (kWh)			6 903	9 445	9 881	4,6%
Consommation spécifique (Wh/m3)			42	240	118	-50,8%
Volume pompé (m3)	244 940	199 100	163 240	39 411	83 414	111,7%
Temps de fonctionnement (h)	4 899	3 620	4 081	4 912	4 615	-6,0%
PR ROCHES LES BLAMONT Alouette						
Energie relevée consommée (kWh)				0	382	100%
Energie facturée consommée (kWh)	362	332	430	461	362	-21,5%
Consommation spécifique (Wh/m3)				0	34	100%
Volume pompé (m3)	9 840	10 061	13 037	15 594	11 135	-28,6%
Temps de fonctionnement (h)	164	168	3 327	260	185	-28,8%
PR SAINT JULIEN Route d'Echena						
Energie relevée consommée (kWh)			4 786	5 659	5 317	-6,0%
Energie facturée consommée (kWh)		1 972	2 852	4 149	6 524	57,2%
Consommation spécifique (Wh/m3)			80	56	101	80,4%

Volume pompé (m3)			59 680	100 440	52 719	-47,5%
Temps de fonctionnement (h)		3 355	2 996	5 022	2 636	-47,5%
PR SAINT MAURICE COLOMBIER Ecl						
Energie relevée consommée (kWh)				7 158	7 038	-1,7%
Energie facturée consommée (kWh)	8 923	4 855	6 911	9 316	6 520	-30,0%
Consommation spécifique (Wh/m3)				95	127	33,7%
Volume pompé (m3)	74 592	78 602	202 248	75 045	55 525	-26,0%
Temps de fonctionnement (h)	3 730	1 093	2 809	4 147	2 774	-33,1%
PR SAINTE MARIE Salle des Fête						
Energie relevée consommée (kWh)			1 098	4 074	1 121	-72,5%
Energie facturée consommée (kWh)		616	1 120	1 117	1 154	3,3%
Consommation spécifique (Wh/m3)			0	198		
Volume pompé (m3)		12 870	0	20 580		
Temps de fonctionnement (h)		3 449	1 997	1 029	1 288	25,2%
PR SAINTE MARIE ZAC						
Energie relevée consommée (kWh)			166	148	311	110,1%
Energie facturée consommée (kWh)		81	170	176	170	-3,4%
PR SAINTE SUZANNE Eaux pluvial						
Energie facturée consommée (kWh)			398	525	457	-13,0%
PR SAINTE SUZANNE Terrasses						
Energie facturée consommée (kWh)		0	3 278	3 248	3 179	-2,1%
Volume pompé (m3)			27 958	13 381	13 965	4,4%
Temps de fonctionnement (h)			928	925	951	2,8%
PR SELONCOURT Déchetterie						
Energie relevée consommée (kWh)			960	1 085	1 126	3,8%
Energie facturée consommée (kWh)		0	917	1 116	1 140	2,2%
Consommation spécifique (Wh/m3)			159	121	261	115,7%
Volume pompé (m3)			6 052	8 944	4 318	-51,7%
Temps de fonctionnement (h)			249	244	355	45,5%
PR SELONCOURT Haut des Roches						
Energie relevée consommée (kWh)			8 984	8 381	6 403	-23,6%
Energie facturée consommée (kWh)		0	8 667	8 737	6 462	-26,0%
Consommation spécifique (Wh/m3)			43	368	599	62,8%
Volume pompé (m3)			208 018	22 802	10 686	-53,1%
Temps de fonctionnement (h)			2 309	1 754	822	-53,1%
PR SOCHAUX Brunner						
Energie relevée consommée (kWh)			4 748	6 113	3 534	-42,2%
Energie facturée consommée (kWh)		0	4 409	6 384	3 664	-42,6%
Consommation spécifique (Wh/m3)			66	63	49	-22,2%
Volume pompé (m3)			72 440	97 540	72 430	-25,7%
Temps de fonctionnement (h)			3 622	4 877	2 313	-52,6%
PR SOCHAUX Eglise						

Energie relevée consommée (kWh)			107 277	138 657	35 111	-74,7%
Energie facturée consommée (kWh)		0	105 791	138 819	88 946	-35,9%
Consommation spécifique (Wh/m3)			44	93	29	-68,8%
Volume pompé (m3)			2 415 025	1 484 280	1 193 662	-19,6%
Temps de fonctionnement (h)			3 340	4 340	3 368	-22,4%
PR SOCHAUX Graviers						
Energie relevée consommée (kWh)				13 131	7 734	-41,1%
Energie facturée consommée (kWh)		0	11 913	14 132	7 870	-44,3%
Consommation spécifique (Wh/m3)				36	79	119,4%
Volume pompé (m3)			331 221	365 085	97 882	-73,2%
Temps de fonctionnement (h)			1 386	1 527	1 222	-20,0%
PR SOCHAUX Jacquet						
Energie relevée consommée (kWh)			745	687	751	9,3%
Energie facturée consommée (kWh)			645	470	742	57,9%
Consommation spécifique (Wh/m3)			65	65	126	93,8%
Volume pompé (m3)			11 399	10 584	5 963	-43,7%
Temps de fonctionnement (h)			168	156	178	14,1%
PR SOCHAUX Piscine						
Energie relevée consommée (kWh)				13 736	12 869	-6,3%
Energie facturée consommée (kWh)		0	9 893	14 171	13 162	-7,1%
Consommation spécifique (Wh/m3)				90	157	74,4%
Volume pompé (m3)			152 773	152 427	81 970	-46,2%
Temps de fonctionnement (h)			4 429	4 619	5 248	13,6%
PR SOCHAUX République						
Energie relevée consommée (kWh)			7 857	8 035	6 496	-19,2%
Energie facturée consommée (kWh)		0	7 426	8 361	6 644	-20,5%
Consommation spécifique (Wh/m3)			40	57	70	22,8%
Volume pompé (m3)			196 965	141 100	92 173	-34,7%
Temps de fonctionnement (h)			1 399	1 411	1 136	-19,5%
PR SOCHAUX ZIF PSA Nord						
Energie relevée consommée (kWh)				2 796	677	-75,8%
Energie facturée consommée (kWh)			738	671	671	0,0%
Temps de fonctionnement (h)				563		
PR TAILLECOURT Le Parc						
Energie relevée consommée (kWh)				900	946	5,1%
Energie facturée consommée (kWh)		0	897	949	890	-6,2%
Consommation spécifique (Wh/m3)				76	76	0,0%
Volume pompé (m3)			21 317	11 771	12 376	5,1%
Temps de fonctionnement (h)			393	1 099	371	-66,2%
PR TAILLECOURT Plein Coeur						
Energie relevée consommée (kWh)			1 094	1 129	1 028	-8,9%
Energie facturée consommée (kWh)		0	1 045	1 181	984	-16,7%

Consommation spécifique (Wh/m3)			47	81	127	56,8%
Volume pompé (m3)			23 415	13 920	8 118	-41,7%
Temps de fonctionnement (h)			691	348	378	8,6%
PR TAILLECOURT Sous Bois						
Energie relevée consommée (kWh)				8 268	8 182	-1,0%
Energie facturée consommée (kWh)		0	7 566	8 770	7 744	-11,7%
Consommation spécifique (Wh/m3)				341	282	-17,3%
Volume pompé (m3)			58 389	24 246	29 016	19,7%
Temps de fonctionnement (h)			1 511	1 347	1 508	12,0%
PR VALENTIGNEY Bataille						
Energie relevée consommée (kWh)			2 658	1 933	2 187	13,1%
Energie facturée consommée (kWh)		0	2 560	2 082	2 134	2,5%
Consommation spécifique (Wh/m3)			31	76	33	-56,6%
Volume pompé (m3)			85 356	25 490	65 300	156,2%
Temps de fonctionnement (h)			872	681	1 735	154,8%
PR VALENTIGNEY Cycles						
Energie relevée consommée (kWh)			18 603	18 152	13 432	-26,0%
Energie facturée consommée (kWh)		0	18 060	18 441	15 371	-16,6%
Consommation spécifique (Wh/m3)			40	45	45	0,0%
Volume pompé (m3)			462 747	403 375	298 486	-26,0%
Temps de fonctionnement (h)			3 216	3 227	2 387	-26,0%
PR VALENTIGNEY Libération						
Energie relevée consommée (kWh)			1 014	801	730	-8,9%
Energie facturée consommée (kWh)		0	856	914	745	-18,5%
Consommation spécifique (Wh/m3)			209	278	222	-20,1%
Volume pompé (m3)			4 860	2 880	3 293	14,3%
Temps de fonctionnement (h)			324	192	145	-24,5%
PR VALENTIGNEY Lorraine						
Energie relevée consommée (kWh)			489	531	548	3,2%
Energie facturée consommée (kWh)		0	476	536	531	-0,9%
Consommation spécifique (Wh/m3)			3 056	492	3 425	596,1%
Volume pompé (m3)			160	1 080	160	-85,2%
Temps de fonctionnement (h)			4	27	4	-85,2%
PR VIEUX CHARMONT Moulin						
Energie relevée consommée (kWh)			26 235	31 725	27 583	-13,1%
Energie facturée consommée (kWh)		0	26 424	30 964	25 063	-19,1%
Consommation spécifique (Wh/m3)			50	71	71	0,0%
Volume pompé (m3)			529 435	448 000	389 520	-13,1%
Temps de fonctionnement (h)			4 411	5 600	4 869	-13,1%
PR VIEUX CHARMONT Moulin bis						
Energie relevée consommée (kWh)				0	0	0%
Consommation spécifique (Wh/m3)				0	0	0%

Volume pompé (m3)			36 783	31 860	20 651	-35,2%
Temps de fonctionnement (h)			2 912	1 770	2 849	61,0%
PR VILLARS LES BLAMONT Vaugond						
Energie facturée consommée (kWh)	1 123	545	844	807	728	-9,8%
Temps de fonctionnement (h)	446				143	
PR VILLARS SS DAMJOUX 10 Repris						
Volume pompé (m3)		25 820				
PR VILLARS SS DAMJOUX 7 Champ						
Volume pompé (m3)	186	168				
PR VILLARS SS DAMPJOUX 6 La Cou						
Volume pompé (m3)		722				
PR VILLARS SS DAMPJOUX 8 Gougey						
Energie facturée consommée (kWh)	136 170	98 821	57 607			
Volume pompé (m3)	93 982	80 710				
Temps de fonctionnement (h)				5 691		
PR VILLARS SS DAMPJOUX 9 Hameau						
Volume pompé (m3)	310	340				
PR VOUJEAUCOURT Eaux pluviales						
Energie facturée consommée (kWh)			923	928	1 093	17,8%
Volume pompé (m3)			11 686	7 798	15 036	92,8%
Temps de fonctionnement (h)			165	111	215	93,7%
PR VOUJEAUCOURT GARAGE OM						
Volume pompé (m3)			630			
Temps de fonctionnement (h)			21			
PR VOUJEAUCOURT La Croze						
Energie relevée consommée (kWh)			8 265	6 703	5 175	-22,8%
Energie facturée consommée (kWh)		0	7 963	7 024	5 005	-28,7%
Consommation spécifique (Wh/m3)			59	59	71	20,3%
Volume pompé (m3)			140 650	114 069	72 964	-36,0%
Temps de fonctionnement (h)			2 102	1 705	1 286	-24,6%
PR VOUJEAUCOURT Marché						
Energie relevée consommée (kWh)			4 669	8 864	6 927	-21,9%
Energie facturée consommée (kWh)		0	4 635	8 524	7 880	-7,6%
Consommation spécifique (Wh/m3)			79	442	82	-81,4%
Volume pompé (m3)			59 285	20 050	84 950	323,7%
Temps de fonctionnement (h)			2 186	4 348	3 398	-21,8%
PR VOUJEAUCOURT OM						
Energie relevée consommée (kWh)				0	0	0%
Consommation spécifique (Wh/m3)				0	0	0%
Volume pompé (m3)			805	660	1 320	100,0%
Temps de fonctionnement (h)			18	23	44	91,3%
PR VOUJEAUCOURT Union						

Energie relevée consommée (kWh)			17 934	19 593	14 231	-27,4%
Energie facturée consommée (kWh)		0	17 569	19 729	14 817	-24,9%
Consommation spécifique (Wh/m3)			34	49	66	34,7%
Volume pompé (m3)			526 828	395 995	216 715	-45,3%
Temps de fonctionnement (h)			4 758	4 934	3 704	-24,9%
PR VOUJEAUCOURT Union Bis						
Volume pompé (m3)			2 136	5 352	3 132	-41,5%
Temps de fonctionnement (h)			178	446	261	-41,5%
PR_COURCELLES AP aval						
Energie relevée consommée (kWh)				30 562	2 185	-92,9%
Energie facturée consommée (kWh)			1 098		758	
Consommation spécifique (Wh/m3)				1 213	73	-94,0%
Volume pompé (m3)			27 764	25 201	29 902	18,7%
Temps de fonctionnement (h)			117	119	131	10,1%

Autres installations assainissement

	2021	2022	2023	2024	2025	N/N-1
BO ETUPES Technoland						
Energie relevée consommée (kWh)				1 078	865	-19,8%
Energie facturée consommée (kWh)		0	1 253	1 098	792	-27,9%
BO MONTBELIARD Chiffogne						
Energie relevée consommée (kWh)			16 812	16 082	11 494	-28,5%
Energie facturée consommée (kWh)			15 486	18 166	11 167	-38,5%
Temps de fonctionnement (h)			699	1 575	1 125	-28,6%
BO SOCHAUX-BO et DO SO1						
Energie relevée consommée (kWh)			7 505	19 592	9 272	-52,7%
Energie facturée consommée (kWh)			8 341	18 820	7 830	-58,4%
Temps de fonctionnement (h)			991	1 113	896	-19,5%
DO AUDINCOURT AUD13 Super U						
Energie facturée consommée (kWh)			255	259	260	0,4%
DO AUDINCOURT AUD17 Acacias						
Energie facturée consommée (kWh)			165	164	165	0,6%
DO AUDINCOURT AUD25						
Energie facturée consommée (kWh)			45	33	57	72,7%
DO BAVANS BAV4 Pharmacie						
Energie facturée consommée (kWh)			75	67	81	20,9%
DO VALENTIGNEY VAL10 Mairie						
Energie facturée consommée (kWh)			81	83	127	53,0%
DO VALENTIGNEY VAL3 Abattoirs						
Energie facturée consommée (kWh)			262	273	292	7,0%
DO VALENTIGNEY VAL4 Doubs						
Energie facturée consommée (kWh)			106	79	124	57,0%

DO VOUJEAUCOURT VOU7 Service						
Energie facturée consommée (kWh)			245	238	280	17,6%

CONSOMMATION DE RÉACTIFS

PMA - SECTEUR PERI URBAIN ASS

Usine de dépollution - File Eau

	2021	2022	2023	2024	2025	N/N-1
STEP ABBEVILLERS						
Chlorure ferrique (kg)				4 270		
STEP BLAMONT						
Chlorure ferrique (kg)			2 304	3 456	3 456	0,0%
STEP COLOMBIER FONTAINE						
Chlorure ferrique (kg)			16 197	11 054	7 000	-36,7%
STEP DAMBELIN						
Chlorure ferrique (kg)				288	864	200,0%
STEP ECHENANS						
Chlorure ferrique (kg)			0	2 500	8 200	228,0%
STEP MONTENOIS						
Chlorure ferrique (kg)			8 191	8 064	6 048	-25,0%
STEP PONT DE ROIDE VERMONDANS						
Chlorure ferrique (kg)			20 752	16 137	19 375	20,1%

PMA - SECTEUR PMA29 ASS

Usine de dépollution - File Eau

	2021	2022	2023	2024	2025	N/N-1
UDEP ARBOUANS						
Acide sulfurique (kg)			299	309	590	90,9%
ChloroSulfate ferrique (kg)			137 689	143 890	156 000	8,4%
Eau de Javel (kg)			9 269	5 974	3 600	-39,7%
Soude (kg)			2 491	4 341	1 650	-62,0%
UDEP BAVANS						
Acide sulfurique (kg)			200	166	102	-38,6%
ChloroSulfate ferrique (kg)			39 976	26 444	49 270	86,3%
Eau de Javel (kg)			770	347	1 193	243,8%
Soude (kg)			0	110	104	-5,5%
UDEP SAINTE SUZANNE						
Acide sulfurique (kg)			250	150	0	-100,0%
ChloroSulfate ferrique (kg)			157 220	241 660	189 600	-21,5%
Eau de Javel (kg)			2 310	1 290	4 200	225,6%

Polymère (kg)			2 125	2 350	2 225	-5,3%
Soude (kg)			0	0	0	0%

Usine de dépollution - File Boue

PMA - SECTEUR PERI URBAIN ASS

Usine de dépollution - File Boue

	2021	2022	2023	2024	2025	N/N-1
STEP COLOMBIER FONTAINE						
Chaux vive (kg)				11 275	14 950	32,6%
Polymère (kg)				1 097	1 079	-1,6%
STEP ECHENANS						
Polymère (kg)			491	555	695	25,2%
STEP PONT DE ROIDE VERMONDANS						
Polymère (kg)				923	950	2,9%

PMA - SECTEUR PMA29 ASS

Usine de dépollution - File Boue

	2021	2022	2023	2024	2025	N/N-1
UDEP ARBOUANS						
Chaux vive (kg)			355 940	398 670	280 140	-29,7%
Polymère (kg)			12 980	11 080	11 400	2,9%
UDEP BAVANS						
Polymère (kg)			550	1 450	1 750	20,7%
UDEP SAINTE SUZANNE						
Chaux éteinte (kg)			623 240	635 900	542 060	-14,8%
Chlorure ferrique (kg)			474 430	590 416	479 480	-18,8%
Polymère (kg)			10 768	10 867	9 350	-14,0%

5.5. Inventaire des installations

Capacité épuratoire en kg de DBO5 / j et capacité hydraulique en m3/j selon les données du constructeur, capacité en EH établie sur une base de 60 g de DBO5 par habitant et par jour.

PMA - SECTEUR PERI URBAIN ASS

Usines de dépollution	Capacité épuratoire en DBO5 (kg/j)	Capacité équivalent habitant (EH)	Capacité hydraulique (m3/j)
LAGUNE BEUTAL village	16	270	41
LAGUNE BRETIGNEY	6	100	15
LAGUNE PRESENTVILLERS	30	500	75
LAGUNE SOLEMONT	15	250	38
STEP ABBEVILLERS	66	1 100	165
STEP BEUTAL de la Guinguette	2	50	3
STEP BLAMONT	70	1 167	204
STEP COLOMBIER FONTAINE	240	4 000	860
STEP DAMBELIN	71	1 185	178
STEP DUNG	142	2 367	354
STEP ECHENANS	132	2 200	471
STEP ECOT	20	500	50
STEP FEULE Roselière	15	250	38
STEP MONTENOIS	115	1 920	230
STEP PONT DE ROIDE VERMONDANS	570	9 500	1 900
STEP ROCHES BLAMONT RIZOSPHÈRE	45	750	338
STEP ROCHES LES BLAMONT	32	540	81
STEP SAINT MAURICE COLOMBIER	86	1 425	225
STEP SAINT MAURICE ECHELOTTE	3	50	
STEP SAINTE MARIE	78	1 250	200
STEP VILLARS LES BLAMONT Rhizo	33	550	83
Capacité totale :	**1 787**	**29 924**	**5 549**

Capacité épuratoire en kg de DBO5 / j et capacité hydraulique en m3/j selon les données du constructeur, capacité en EH établie sur une base de 60 g de DBO5 par habitant et par jour.

PMA - SECTEUR PMA29 ASS

Usines de dépollution	Capacité épuratoire en DBO5 (kg/j)	Capacité équivalent habitant (EH)	Capacité hydraulique (m3/j)
UDEP ARBOUANS	4 300	71 667	28 000
UDEP BAVANS	1 187	19 800	25 920
UDEP SAINTE SUZANNE	3 500	58 350	20 000
Capacité totale :	**8 987**	**149 817**	**73 920**

Capacité épuratoire en kg de DBO5 / j et capacité hydraulique en m3/j selon les données du constructeur, capacité en EH établie sur une base de 60 g de DBO5 par habitant et par jour.

PMA - SECTEUR PERI URBAIN ASS

Postes de refoulement / relèvement	Trop plein	Débit des pompes (m3/h)
PR ABBEVILLERS rue de la Doue	Non	40
PR AUTECHAUX ROIDE Allée de Bl	Non	
PR BERCHE Square	Non	30
PR BERCHE Vernois	Non	15
PR BLAMONT Orée du Bois	Non	
PR BLAMONT Scotton	Non	
PR BONDEVAL RUE DE THULAY	Non	15
PR BOURGUIGNON Champagne	Oui	
PR BOURGUIGNON Chassagne	Non	
PR BOURGUIGNON Forges	Oui	40
PR BOURGUIGNON Le Pont	Oui	50
PR COLOMBIER La Raydans	Non	
PR COLOMBIER Les Cités	Oui	
PR COLOMBIER rue du Doubs	Oui	120
PR DAMPIERRE Breuil	Non	
PR DAMPIERRE L'Orée du Bois	Non	
PR DAMPJOUX VILLAGE	Non	
PR ECHENANS ROUTE DE SEMONDANS	Non	
PR ETOUVANS COMMANDANT JOLY	Non	
PR FEULE Secteur Pommerey	Non	
PR GOUX rue des Champs Moireys	Non	
PR GOUX rue sous Miecourt	Non	10
PR LONGEVELLE Auto Ecole	Oui	20
PR LONGEVELLE Bar	Non	20
PR LONGEVELLE Les Beussières	Oui	15
PR LONGEVELLE Passerelle	Oui	20
PR LOUGRES Ecole	Oui	20
PR LOUGRES Rue de Verdez	Non	30
PR LOUGRES Stade	Non	25
PR LOUGRES 3 Cantons	Non	40
PR NOIREFONTAINE GRANDE FONTAI	Non	9
PR NOIREFONTAINE MAIRIE	Non	9
PR NOIREFONTAINE PISTE CYCLABL	Non	14
PR PONT DE ROIDE Cuchot	Non	
PR PONT DE ROIDE En Presle	Non	
PR PONT DE ROIDE Moulin	Oui	50
PR PONT DE ROIDE Passerelle	Oui	80
PR PONT DE ROIDE Perception	Non	
PR PONT DE ROIDE Services tech	Non	
PR PONT DE ROIDE Zac	Oui	50

PR ROCHES LES BLAMONT Alouette	Non	
PR SAINT JULIEN Route d'Echena	Non	
PR SAINT MAURICE COLOMBIER Ecl	Oui	
PR SAINTE MARIE Salle des Fête	Non	
PR SAINTE MARIE ZAC	Non	
PR VILLARS LES BLAMONT Vaugond	Non	
PR VILLARS SS DAMJOUX BARBECHE	Non	
PR VILLARS SS DAMJOUX CHAMP MU	Non	9
PR VILLARS SS DAMJOUX REPRISE	Non	27
PR VILLARS SS DAMPJOUX GOUGEY	Non	27
PR VILLARS SS DAMPJOUX HAMEAU	Non	9
PR VILLARS SS DAMPJOUX LA COUA	Non	9

PMA - SECTEUR PMA29 ASS

Postes de refoulement / relèvement	**Trop plein**	**Débit des pompes (m3/h)**
BO DAMPIERRE BOIS DÉGRILLEUR	Non	
DEGRILLEUR MONTBELIARD CANAL	Non	
PR ALLENJOIE ATELIERS	Non	30
PR ALLENJOIE BREUIL	Non	70
PR ALLENJOIE ROUTE DE BROGNARD	Non	10
PR ARBOUANS KELLER	Non	23
PR ARBOUANS STADE	Non	90
PR AUDINCOURT COMBOTTES	Non	13
PR AUDINCOURT FOCH	Non	45
PR AUDINCOURT GARE	Non	34
PR AUDINCOURT JAPY	Non	19
PR AUDINCOURT JAURÈS	Non	50
PR AUDINCOURT LA NAILLE	Non	19
PR AUDINCOURT MAIRIE	Non	130
PR AUDINCOURT MONTANOT	Non	23
PR AUDINCOURT PARROT	Oui	20
PR AUDINCOURT POMMERONDE	Non	20
PR AUDINCOURT PONT DE GLAND	Non	43
PR AUDINCOURT TEMPLE	Oui	250
PR AUDINCOURT VIETTE	Non	70
PR BADEVEL BO RUE DU STADE	Non	80
PR BADEVEL FONTAINE	Non	30
PR BART ALLAN	Oui	80
PR BART EAUX PLUVIALES	Non	
PR BART LA ROCHE EP	Non	150
PR BART LA ROCHE EU	Non	40
PR BART RUPT	Non	50

PR BAVANS FAURECIA	Non	40
PR BAVANS GENDARMERIE	Non	155
PR BAVANS SOUS ROCHE	Non	90
PR BERCHE ZI ZB	Non	110
PR BETHONCOURT ECOLE	Oui	200
PR BETHONCOURT LA PRUSSE	Non	28
PR BETHONCOURT MITTAN	Non	245
PR BETHONCOURT RUDEROP	Non	14
PR BROGNARD LES ESSERTS	Non	36
PR BROGNARD VERVEL	Non	55
PR COURCELLES	Non	90
PR COURCELLES AÉRODROME	Non	15
PR COURCELLES BIS	Non	35
PR COURCELLES EP AMONT	Non	
PR DAMBENOIS OICHOTTES	Non	37
PR DAMBENOIS SILLONS	Non	37
PR DAMPIERRE SUR DOUBS CANAL	Oui	100
PR DAMPIERRE SUR DOUBS EGLISE	Oui	86
PR ETUPES CANAL	Non	150
PR ETUPES TECHNOLAND	Non	70
PR ETUPES ZI	Oui	260
PR EXINCOURT MINES	Non	87
PR EXINCOURT NORD	Oui	130
PR FESCHES LE CHATEL CASSERIE	Non	37
PR FESCHES LE CHATEL DORMOY	Oui	70
PR FESCHES LE CHATEL ECLUSE	Non	110
PR FESCHES LE CHATEL PAQUIS	Non	20
PR FESCHES LE CHATEL RONDELOT	Oui	20
PR FESCHES LE CHATEL VERDUN	Non	35
PR GRAND CHARMONT MAIRIE	Non	
PR GRAND-CHARMONT PERGAUD	Non	20
PR HERIMONCOURT BERNE	Oui	40
PR HERIMONCOURT LA LANNE	Non	26
PR MANDEURE ANGLOTS	Oui	25
PR MANDEURE COURCELOTTE	Non	40
PR MANDEURE EGLANTIERS	Non	20
PR MANDEURE LES CHÊNES	Non	20
PR MANDEURE PAPETERIE	Oui	40
PR MANDEURE POSTE	Non	41
PR MANDEURE ROMAINE	Non	50
PR MATHAY ACACIAS	Non	12
PR MATHAY AVIATEUR	Non	
PR MATHAY CÈDRES	Non	6

PR MATHAY CHAMP DE L'EPINE	Non	70
PR MATHAY EUROPE	Non	38
PR MATHAY GAIFFE	Non	28
PR MATHAY LE PONT	Non	53
PR MATHAY LONGUERAIES	Non	15
PR MATHAY SALLE DES FÊTES	Non	15
PR MATHAY VALLÈRES	Non	11
PR MONTBELIARD ALLIÉS	Oui	25
PR MONTBELIARD BO HOLLANDE	Non	
PR MONTBELIARD BONAL EP	Non	188
PR MONTBELIARD BONAL EU	Non	110
PR MONTBELIARD CUVIER	Non	70
PR MONTBELIARD EMMANÜS	Non	16
PR MONTBELIARD GARE	Non	13
PR MONTBELIARD HELVÉTIE	Oui	
PR MONTBELIARD MONT CHEVIS	Non	12
PR MONTBELIARD NEUF MOULINS	Non	48
PR MONTBELIARD PARIETTI	Non	300
PR MONTBELIARD PIED DES GOUTES	Non	19
PR MONTBELIARD PRAIRIE	Non	75
PR MONTBELIARD PRISON	Non	300
PR MONTBELIARD ROUTE DE LAIRE	Non	30
PR MONTBELIARD VELOTTE	Non	19
PR MONTBELIARD ZUP BIS	Non	30
PR NOMMAY COTEAU	Non	30
PR NOMMAY SAVOUREUSE	Non	12
PR SAINTE SUZANNE EAUX PLUVIAL	Non	
PR SAINTE SUZANNE TERRASSES	Non	15
PR SELONCOURT DÉCHETTERIE	Non	26
PR SELONCOURT HAUT DES ROCHES	Oui	13
PR SOCHAUX BRUNNER	Oui	20
PR SOCHAUX EGLISE	Oui	345
PR SOCHAUX GRAVIERS	Oui	130
PR SOCHAUX JACQUET	Non	37
PR SOCHAUX PISCINE	Non	33
PR SOCHAUX RÉPUBLIQUE	Oui	100
PR SOCHAUX ZIF PSA NORD	Non	
PR TAILLECOURT LE PARC	Non	30
PR TAILLECOURT PLEIN COEUR	Non	40
PR TAILLECOURT SOUS BOIS	Oui	18
PR VALENTIGNEY BATAILLE	Oui	40
PR VALENTIGNEY CYCLES	Oui	125
PR VALENTIGNEY LIBÉRATION	Non	15

PR VALENTIGNEY LORRAINE	Non	40
PR VIEUX CHARMONT MOULIN	Oui	80
PR VIEUX CHARMONT MOULIN BIS	Oui	18
PR VOUJEAUCOURT EAUX PLUVIALES	Non	
PR VOUJEAUCOURT LA CROZE	Oui	60
PR VOUJEAUCOURT MARCHÉ	Non	25
PR VOUJEAUCOURT OM	Non	30
PR VOUJEAUCOURT UNION	Oui	85
PR VOUJEAUCOURT UNION BIS	Oui	12
PR_COURCELLES AP AVAL	Non	


PMA - SECTEUR PMA29 ASS

Autres installations

BO ETUPES TECHNOLAND
BO MONTBELIARD CHIFFOGNE
BO SOCHAUX-BO ET DO SO1
DO AUDINCOURT AUD12
DO AUDINCOURT AUD13 SUPER U
DO AUDINCOURT AUD17 ACACIAS
DO AUDINCOURT AUD25
DO BADEVEL BO RUE DU STADE
DO BAVANS BAV4 PHARMACIE
DO BETHONCOURT BET02 EX UDEP
DO DAMPIERRE DOUBS PR EGLISE
DO EXINCOURT EXN15 CLÉMENCEAU
DO GRAND CHARMONT GCH01
DO MONTBELIARD MON57
DO MONTBELIARD MON58
DO MONTBELIARD MON60 BO ZUP
DO MONTBELIARD MON61 HELVÉTIE
DO MONTBELIARD MON62 CHIFFOGNE
DO VALENTIGNEY VAL10 MAIRIE
DO VALENTIGNEY VAL3 ABATTOIRS
DO VALENTIGNEY VAL4 DOUBS
DO VIEUX CHARMONT BROGNARD
DO VOUJEAUCOURT VOU7 SERVICE
DO VOUJEAUCOURT VOU8 DAMPIERRE

5.6. GESTION DES INSTALLATIONS

La Maintenance des Installations Électromécaniques

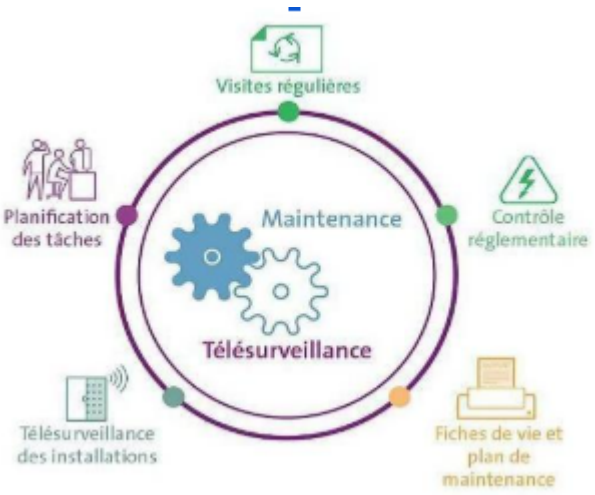

L'Eau du Pays de Montbéliard a mis en œuvre une organisation visant à garantir la meilleure préservation possible du patrimoine électromécanique qui lui est confié. Les besoins d'opérations de maintenance sont générés par :

- des gammes de maintenance préventives,
- des contrôles réglementaires,
- des audits qualité ou sécurité,
- des défauts détectés par les outils de télésurveillance,
- des contrôles in situ,
- des demandes des clients,

Les opérations sont toutes tracées et en majorité préalablement planifiées. Une cellule dédiée assure la mise à jour de la base de données patrimoniale, du planning des intervenants et des fiches de vie associées à chaque équipement. Les ordres d'intervention sont planifiés et transmis hebdomadairement par GSM sur les SMARTPHONE dont sont dotés individuellement chaque intervenant. Les mises à jour du planning affiché par le PDA sont réalisées en temps réel, de même que la restitution des comptes-rendus d'interventions complétés par les électromécaniciens.

Les Contrôles réglementaires

Contrôle réglementaire

L'ensemble des installations comportant des équipements électromécaniques, de levage ou à pression est soumis annuellement à des contrôles réglementaires par un organisme spécialisé agréé. Les comptes rendus sont exploités et donnent lieu à la mise en œuvre de programmes de mise en conformité des installations.
Dans ce cadre, nous avons réalisé en 2025 les contrôles suivants :

Nature du contrôle	Installations concernées	Date du dernier contrôle

Installations électriques	Tous les sites	12/2025
Equipements de levage	Tous les sites	12/2025
Portes et portails	Tous les sites	14/01/2025
Climatisation	Usines Arbouans / Sainte Suzanne / Bavans	27/05/2025
Extincteur	Usines Arbouans / Sainte Suzanne / Bavans	05/12/2025
BAES	Usines Arbouans / Sainte Suzanne / Bavans	05/12/2025
Extincteurs	Secteur PDRV	05/12/2025

L'entretien des Ouvrages

Le délégataire entreprend des opérations de maintenance électromécanique programmées mais également un suivi et un entretien régulier des équipements.

Les espaces verts sont entretenus au fil de l'année en interne et par une entreprise sous-traitante.

Le délégataire réalise les opérations d'entretien des appareillages mesures : vérification de la mesure, étalonnage si nécessaire, nettoyage, changement de pièces, etc…

TRAVAUX NEUFS DÉLÉGATAIRE INSTALLATIONS

Installations électromécaniques	Réalisé dans l'exercice
1ER ETABLISSEMENT	
1ER ETABLISSEMENT	
Diag Amont PMA29 (Y6K44) 2025	X
Sécurisation Usines assainissement (Y6K25) 2025	X
SEPM Télégestion 2G ASST (Y6K48) 2025	X
Télégestion assainissement (Y6K24) 2025	X

RENOUVELLEMENT INSTALLATIONS DE COLLECTE

Installations électromécaniques	Opération réalisée dans l'exercice	Mode de gestion
Chantier		
Chantier		
Remise prime CEE (Y9K13)	Renouvellement	Fond de renouvellement
CLAPET VALENTIGNEY Sous Roche		
""		
Clapet de régulation (YSK15)	Renouvellement	Continuité de service
CLAPET VALENTIGNEY Téléphone		
""		
Clapet de régulation 1 (YSK16)	Renouvellement	Continuité de service
Clapet de régulation 2 (YSK16)	Renouvellement	Continuité de service
DO AUDINCOURT AUD13 Super U		
SE----------		
Support de Télétransmission (FAKAZ)	Renouvellement	Fond de renouvellement
DO AUDINCOURT AUD17 Acacias		
SE----------		
Support de Télétransmission (FAKAY)	Renouvellement	Fond de renouvellement
DO AUDINCOURT AUD25 Nouveau Pont		
SE----------		
Débitmètre (FAKY8)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Support de Télétransmission (FAKAX)	Renouvellement	Fond de renouvellement
DO BAVANS BAV4 Pharmacie		
SE----------		
Support de Télétransmission (FAKBD)	Renouvellement	Fond de renouvellement
DO BETHONCOURT BET02 Ex Udep		
SE----------		
Support de Télétransmission (FAKBF)	Renouvellement	Fond de renouvellement
DO MONTBELIARD MON61 Helvétie		
SE----------		
Débitmètre 1 (FAKBG)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Débitmètre 2 (FAKFZ)	Renouvellement	Fond de renouvellement
DO MONTBELIARD MON62 Chiffogne		
SE----------		
Débitmètre (F9K35)	Renouvellement	Fond de renouvellement
DO VALENTIGNEY VAL10 Mairie		
SE----------		
Débitmètre (FAKY9)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Support de Télétransmission (FAKBC)	Renouvellement	Fond de renouvellement

DO VALENTIGNEY VAL3 Abattoirs		
SE----------		
Support de Télétransmission (FAKBB)	Renouvellement	Fond de renouvellement
DO VALENTIGNEY VAL4 Doubs		
SE----------		
Support de Télétransmission (FAKBA)	Renouvellement	Fond de renouvellement
DO VOUJEAUCOURT VOU7 Service		
SE----------		
Support de Télétransmission (FAKAW)	Renouvellement	Fond de renouvellement
DO VOUJEAUCOURT VOU8 Dampierre		
SE----------		
Débitmètre US (FAKBE)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Ensemble technique pour fond patrimonial		
__		
2 débitmètres (FBKCS)	Renouvellement	Fond de renouvellement
abbevillers créa débitmètre 25/fbkct (FBKCT)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Ass Rue de Bavans Présentville 25/ybk23 (YBK23)	Renouvellement	Fond de renouvellement
AUDINCOURT RUE MUSIQUE (YBK21)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Bavans Rue Jardins réduction EC 25/ybk28 (YBK28)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Béthoncourt Bussurel réhab coll 25/ybk31 (YBK31)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Chemisage collecteur 2024 PMA 29 25/ybk25 (YBK25)	Renouvellement	Fond de renouvellement
création débit sortie lagune beutal (F9K14) 2025 (F9K14)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Création débit sortie 25/f9k17 (F9K17)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Dampierre les B rue du Parcours 25/Y9K14 (Y9K14)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Echenans Grande Rue 25/Y9K15 (Y9K15)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Fond Pat Mandeure Sup regards doubles 25/ybk32 (YBK32)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Fond Pat Pont de Roide Pose clapets 25/y9k11 (Y9K11)	Renouvellement	Fond de renouvellement
FONDS PATRIMONIAL 25/YBK14 (YBK14)	Renouvellement	Fond de renouvellement
FONDS PATRIMONIAL 25/YBK17 (YBK17)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Mandeure Granges 25/ybk26 (YBK26)	Renouvellement	Fond de renouvellement
PR SOCHAUX Eglise Création Débitmètre 25/fbkcu (FBKCU)	Renouvellement	Fond de renouvellement
PR SOCHAUX Graviers réhabilitation 25/YBK24 (YBK24)	Renouvellement	Fond de renouvellement
SSZ Installation sonde mesure flux Ph 1 25/FBKAJ (FBKAJ)	Renouvellement	Fond de renouvellement
STEP BLAMONT Créa débitm entrée (F9K15) 2025 (F9K15)	Renouvellement	Fond de renouvellement
STEP ECOT Créa débitm sortie (F9K16) 2025 (F9K16)	Renouvellement	Fond de renouvellement
STEP ST MARIE Créa débi sortie (F9K18) 2025 (F9K18)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Valentigney régulation 25/ybk27 (YBK27)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Ensemble technique pour gestion du non programmé		
Sous Ensemble pour gestion du non programmé		
UT Fonds patrimonial cana et ouvrages (Y9K12)	Renouvellement	Fond de renouvellement
UT Renouv non programmé assainissement (Y7K13)	Renouvellement	Continuité de service
LAGUNE SOLEMONT		
SE----------		

Pompe de Relèvement 1 (FAKDP)	Renouvellement	Fond de renouvellement
PLUVIOMETRE BETHONCOURT Caserne pompiers		
SE----------		
Support de Télétransmission (FAKBL)	Renouvellement	Fond de renouvellement
PLUVIOMETRE BROGNARD Base nautique		
SE----------		
Support de Télétransmission (FAKBJ)	Renouvellement	Fond de renouvellement
PLUVIOMETRE SELONCOURT Déchetterie		
SE----------		
Support de Télétransmission (FAKBH)	Renouvellement	Fond de renouvellement
PLUVIOMETRE VANDONCOURT Ecole		
SE----------		
Support de Télétransmission (FAKBI)	Renouvellement	Fond de renouvellement
PR ABBEVILLERS rue de la Doue		
SE----------		
Pompe de Relèvement 1 (FAKC9)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Pompe de Relèvement 2 (FAKDQ)	Renouvellement	Fond de renouvellement
PR ALLENJOIE Breuil		
SE----------		
Armoire de Commande (FAKCB)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Pompe de Relèvement GR1 (F7K39)	Renouvellement	Continuité de service
PR AUDINCOURT Combottes		
SE----------		
Armoire de Commande (FAKBS)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Pompe de Relèvement GR2 (F9K32)	Renouvellement	Fond de renouvellement
PR AUDINCOURT Mairie		
SE----------		
Armoire de Commande (FAKBW)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Support de Télétransmission (FAKBX)	Renouvellement	Fond de renouvellement
PR AUDINCOURT Parrot		
SE----------		
Tuyauterie (FAKAT)	Renouvellement	Fond de renouvellement
PR AUDINCOURT Pommeronde		
SE----------		
Armoire de Commande (FAKBM)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Support de Télétransmission (F9K42)	Renouvellement	Fond de renouvellement
PR AUDINCOURT Temple		
SE----------		
Pompe de Relèvement GR2 (FAKQ3)	Renouvellement	Fond de renouvellement
PR AUDINCOURT Viette		
SE----------		
Tuyauterie (FAKQ4)	Renouvellement	Fond de renouvellement
PR BERCHE ZI ZB		

SE----------		
Armoire de Commande (FAKBN)	Renouvellement	Fond de renouvellement
PR BETHONCOURT La Prusse		
SE----------		
Armoire de Commande (FAKCC)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Support de Télétransmission (F9K43)	Renouvellement	Fond de renouvellement
PR BETHONCOURT Mittan		
SE----------		
Armoire de Commande (FAKCI)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Support de Télétransmission (FAKCJ)	Renouvellement	Fond de renouvellement
PR BETHONCOURT Ruderop		
SE----------		
Support de Télétransmission (FAKCD)	Renouvellement	Fond de renouvellement
PR BLAMONT Orée du Bois		
SE----------		
Armoire de Commande poste relèvement (FAK8Y)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Pompe de Relèvement 1 (FAKAN)	Renouvellement	Fond de renouvellement
PR BOURGUIGNON Le Pont		
SE----------		
Canalisation / Tuyauterie (FAK4C)	Renouvellement	Fond de renouvellement
PR COLOMBIER FONTAINE Les Cités		
SE----------		
Pompe de Relèvement 1 (FSK7Y)	Renouvellement	Continuité de service
Pompe de Relèvement 2 (F7K37)	Renouvellement	Continuité de service
PR DAMPIERRE SUR DOUBS Canal ZB		
SE----------		
Pompe de Relèvement GR2 (F7K21)	Renouvellement	Continuité de service
PR DAMPIERRE SUR DOUBS Eglise ZB		
SE----------		
SONDE DE NIVEAU (FAKBP)	Renouvellement	Fond de renouvellement
PR ECHENANS Route de Semondans		
SE----------		
Pompe de Relèvement 2 (FSK7S)	Renouvellement	Continuité de service
PR ETOUVANS Rue Commandant Joly		
SE----------		
Pompe de Relèvement 1 (FAKX8)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Pompe de Relèvement 2 (FAKX7)	Renouvellement	Fond de renouvellement
PR ETUPES ZI		
SE----------		
Armoire de Commande (FAKS7)	Renouvellement	Fond de renouvellement
PR EXINCOURT Nord		
SE----------		
Armoire de Commande (FAKCG)	Renouvellement	Fond de renouvellement

PR FESCHES LE CHATEL Casserie		
SE----------		
Pompe de Relèvement GR2 (FSK8M)	Renouvellement	Continuité de service
PR FESCHES LE CHATEL Verdun		
SE----------		
Armoire de Commande (FAKCA)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Pompe de Relèvement GR1 (FAKR6)	Renouvellement	Fond de renouvellement
PR GOUX LES DAMBELIN rue des Champs Moireys		
SE----------		
Pompe de Relèvement 1 (FAKDT)	Renouvellement	Fond de renouvellement
PR LONGEVELLE SUR LE DOUBS Auto Ecole		
SE----------		
Pompe de Relèvement 2 (FSK7U)	Renouvellement	Continuité de service
PR MANDEURE Eglantiers		
SE----------		
Armoire de Commande (FAKBU)	Renouvellement	Fond de renouvellement
PR MANDEURE Poste		
SE----------		
Armoire de Commande (FAKBV)	Renouvellement	Fond de renouvellement
PR MATHAY Acacias		
SE----------		
Armoire de Commande (FAKBQ)	Renouvellement	Fond de renouvellement
PR MATHAY Le Pont		
SE----------		
Armoire de Commande (FAKBR)	Renouvellement	Fond de renouvellement
PR MATHAY Salle des Fêtes		
SE----------		
Pompe de Relèvement GR1 (F7K33)	Renouvellement	Continuité de service
PR MONTBELIARD BO Petite Hollande		
SE----------		
Agitation BO n° 2 (FAKCK)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Pompe de Relèvement GR3 (FAKEN)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Vanne d'arrivée (FSK8F)	Rénovation	Continuité de service
VENTILATION (FAK8I)	Renouvellement	Fond de renouvellement
PR MONTBELIARD Emmanüs		
SE----------		
Pompe de Relèvement GR1 (F9K25)	Renouvellement	Fond de renouvellement
PR MONTBELIARD Mont Chevis		
SE----------		
Armoire de Commande (FAKBT)	Renouvellement	Fond de renouvellement
PR MONTBELIARD Neuf Moulins		
SE----------		
Tuyauterie (FAK8J)	Renouvellement	Fond de renouvellement

PR MONTBELIARD Parietti		
SE----------		
Pompe de Relèvement GR1 (FAKS3)	Renouvellement	Fond de renouvellement
PR MONTBELIARD Prairie		
SE----------		
Armoire de Commande (F7K25)	Renouvellement	Continuité de service
PR MONTBELIARD Prison		
SE----------		
Pompe de Relèvement GR1 (F9K19)	Renouvellement	Fond de renouvellement
PR PONT DE ROIDE VERMONDANS Passerelle		
SE----------		
Pompe de Relèvement 1 (FAKB2)	Renouvellement	Fond de renouvellement
PR PONT DE ROIDE VERMONDANS Services techniques		
SE----------		
Pompe de Relèvement 2 (FAKC2)	Renouvellement	Fond de renouvellement
PR PONT DE ROIDE VERMONDANS Zac		
SE----------		
Pompe de Relèvement 1 (FAKC3)	Renouvellement	Fond de renouvellement
PR SAINT JULIEN Route d'Echenans		
SE----------		
Pompe de Relèvement 2 (F9K45)	Renouvellement	Fond de renouvellement
PR SAINT MAURICE COLOMBIER Ecluse		
SE----------		
Détecteur de niveau (FAKDM)	Renouvellement	Fond de renouvellement
PR SOCHAUX Brunner		
SE----------		
Pompe de Relèvement GR1 (F9K22)	Renouvellement	Fond de renouvellement
PR SOCHAUX Eglise		
SE----------		
Armoire de Commande (FAKS4)	Renouvellement	Fond de renouvellement
PR TAILLECOURT Plein Coeur		
SE----------		
Pompe de Relèvement GR1 (F7K34)	Renouvellement	Continuité de service
PR VALENTIGNEY Cycles		
SE----------		
Armoire de Commande (FAKBY)	Renouvellement	Fond de renouvellement
PR VIEUX CHARMONT Moulin		
SE----------		
Armoire de Commande (FAKCF)	Renouvellement	Fond de renouvellement
PR VIEUX CHARMONT Moulin bis		
SE----------		
Armoire de Commande (FAKCE)	Renouvellement	Fond de renouvellement
PR VILLARS SOUS DAMPJOUX 10 - Rochedane reprise		

SE----------		
Vanne de Régulation NC (FAKDY)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Vanne de Régulation NO (FAKDZ)	Renouvellement	Fond de renouvellement
PR VILLARS SOUS DAMPJOUX 5 - Barbèche		
File Eau		
Vanne de Régulation NC (FAKDX)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Vanne de Régulation NO (FAKDW)	Renouvellement	Fond de renouvellement
PR VILLARS SOUS DAMPJOUX 8 - Gougey		
SE----------		
Canalisation / Tuyauterie (FSK3K)	Renouvellement	Continuité de service
PR VOUJEAUCOURT Marché		
SE----------		
Armoire de Commande (FAKBZ)	Renouvellement	Fond de renouvellement
STEP ABBEVILLERS		
File Eau - Prétraitement		
Dégrilleur (FSK8D)	Rénovation	Continuité de service
File Eau - Relèvement / Refoulement		
Pompe de Relèvement 2 (FAKEA)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Produits de Traitement		
Coffret protection pompe doseuse (FSK8H)	Rénovation	Continuité de service
STEP BLAMONT		
File Boues - Stockage / Evacuation Boues		
Pompe évacuation surnageant silo à boues (FAKK2)	Renouvellement	Fond de renouvellement
STEP COLOMBIER FONTAINE		
File Eau - Aération / Oxygénation		
Agitateur Bassin d'aération (FAKK3)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Potence Fixe agitateur (FSK8I)	Renouvellement	Continuité de service
File Eau - Alimentation Eau Brute		
Préleveur Eaux Brutes (FAK6D)	Renouvellement	Fond de renouvellement
File Eau - Prétraitement		
Motoréducteur tambour PREPAZUR (FAKEB)	Renouvellement	Fond de renouvellement
File Eau - Recirculation		
Pompe de Relèvement 2 (FAKEC)	Renouvellement	Fond de renouvellement
File Eau - Rejet Eau		
Préleveur eaux traitées (FAKAE)	Renouvellement	Fond de renouvellement
File Eau - Relèvement / Refoulement		
Sonde surverse A2 (FSK7M)	Renouvellement	Continuité de service
Produits de Traitement - Chaux Vive		
Convoyeur local chaulage (FAKK4)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Motoréducteur convoyeur local chaulage	Renouvellement	Continuité de service
Unité de Contrôle / Commande		
Automate file boues (FAK8S)	Renouvellement	Fond de renouvellement
STEP DAMBELIN		

File Eau - Relèvement / Refoulement		
Pompe de Relèvement 2 (FAKEE)	Renouvellement	Fond de renouvellement
STEP DUNG		
FILE BOUES - SOUTIRAGE DES BOUES		
Débitmètre comptage boues (FAKZ2)	Renouvellement	Fond de renouvellement
File Eau - Alimentation Eau Brute		
Débitmètre entrée station (FAKZ1)	Renouvellement	Fond de renouvellement
File Eau - Traitement Biologique à Boues Activées		
Brosse d'Aération (FAKEP)	Rénovation	Fond de renouvellement
Motoréducteur brosse d'aération (FAKEQ)	Renouvellement	Fond de renouvellement
STEP ECHENANS		
FILE BOUES - EPAISSISSEMENT		
Pompe de reprise des boues épaissies (FAKL4)	Renouvellement	Fond de renouvellement
File Eau - Traitement Biologique à Boues Activées		
Agitateur (FAKK9)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Agitateur rapide biosorption (FSK7Z)	Renouvellement	Continuité de service
Pompe de Recirculation n°1 (FAKL1)	Renouvellement	Fond de renouvellement
STEP MONTENOIS		
Air de Process/Lavage - Production d'Air		
Surpresseur d'air 1 pour bassin (<1,3bar) (FAKZ7)	Renouvellement	Fond de renouvellement
File Eau - Décantation / Clarification		
Roue pont racleur (FAKEG)	Renouvellement	Fond de renouvellement
PRODUITS DE TRAITEMENT - CHLORURE FERRIQUE		
Pompe Doseuse 2 (FAKZ6)	Renouvellement	Fond de renouvellement
STEP PONT DE ROIDE VERMONDANS		
Air de Process/Lavage - Production d'Air		
Compresseur d'air lavage table grille GDD (FAKEH)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Eau de Process/Lavage		
Pompe d'Elévation / Surpression (FAKFY)	Renouvellement	Fond de renouvellement
FILE BOUES - EPAISSISSEMENT		
Grille d'Epaississement (FAKEI)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Rampe de lavage GDD (FSK7R)	Rénovation	Continuité de service
File Eau - Décantation / Clarification		
Roue clarificaeur (FAKC5)	Renouvellement	Fond de renouvellement
FILE EAU - POSTE TOUTES EAUX		
Pompe de relèvement (FAKA9)	Renouvellement	Fond de renouvellement
File Eau - Rejet Eau		
Préleveur eau traitée (FAKEJ)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Produits de Traitement - Polymère Liquide		
Agitateur (FAKDN)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Agitateur mélangeur (FAKB1)	Renouvellement	Fond de renouvellement
STEP SAINT MAURICE COLOMBIER		
File Boues - Stockage / Evacuation Boues		

Agitateur (FAKL9)	Renouvellement	Fond de renouvellement
File Eau - Recirculation et Extraction		
Pompe de recirulation 2 (FAKEK)	Renouvellement	Fond de renouvellement
File Eau - Traitement Biologique		
Racleur ou pont racleur (FSK8G)	Rénovation	Continuité de service
STEP SAINTE MARIE		
File Eau - Recirculation		
pompe recirculation 1 (FAK8W)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Pompe recirculation 2 (FAKM1)	Renouvellement	Fond de renouvellement
UDEP ARBOUANS		
Bâtiments, VRD et Moyens Divers - Sécurité		
Centrale d'Alarme SURVEYOR 5 OLDHAM (FAKDG)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Eau de service - Alimentation eau industrielle		
Pompe forage eau nappe PC103.1 (FSK8Q)	Renouvellement	Continuité de service
FILE BOUES - DÉSHYDRATATION		
Centrifugeuse f1 X101 (FAK6N)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Filtre à Bandes 1 (FAKDH)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Pompe alimentation boue filtre f2 PV107.2 (F7K41)	Rénovation	Continuité de service
File Boues - Digestion des boues		
Chaudière gaz/fuel F101 (F7K42)	Rénovation	Continuité de service
File Boues - Traitement boue déshydratée		
Injecteur à chaux TV104 (FAKFX)	Renouvellement	Fond de renouvellement
File Eau - Clarification		
Motoréducteur Pont racleur f1 TR04.1 (FAKDI)	Renouvellement	Fond de renouvellement
File Eau - Matières de vidange		
Pompe de Brassage SP04 (FSK8P)	Renouvellement	Continuité de service
FILE EAU - POSTE TOUTES EAUX		
Niveau poste toutes eaux LT07 (F7K53)	Rénovation	Continuité de service
File Eau - Prétraitement		
Préleveur eau brute PE01 (FAKDK)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Turbine aératrice f1 BA05.1 (FSK8N)	Renouvellement	Continuité de service
File Eau - Relèvement intermédiaire		
Vis relèvement/interm VR02.2 F2 (FAKDL)	Renouvellement	Fond de renouvellement
File Eau - Traitement Biologique à Boues Activées		
Mesure O2 dissous f1 AT01.1 (F7K28)	Renouvellement	Continuité de service
Pompe recirculation liqueurs f2 SP02.2 (FAKZ4)	Rénovation	Fond de renouvellement
Surpresseur d'Air f2 SB02.2 (FSK8C)	Renouvellement	Continuité de service
Vanne papillon f1 SV03.1 (FAK6K)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Vanne papillon f2 SV03.2 (FAK6L)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Traitement de l'air - Désodorisation air		
Pompe recirculation TA PC201.1 (F9K33)	Renouvellement	Fond de renouvellement
UDEP BAVANS		
Bâtiments, VRD et Moyens Divers - Sécurité		

Détecteur sufure d'hydrogéne relevage (FAKCP)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Eau industrielle - Alimentation en Eau Service ou		
Pompe Skid eaux industielles PC102 (FAKAJ)	Renouvellement	Fond de renouvellement
File Eau - Clarification		
Motoréducteur Pont racleur Clarif F1 TR03 (F7K19)	Rénovation	Continuité de service
File Eau - Prétraitement		
Compresseur dessablage CC01 (F7K23)	Rénovation	Continuité de service
File Eau - Stockage bassin d'orage		
Pompe de Soutirage SP05.2 (FAKCQ)	Renouvellement	Fond de renouvellement
File Eau - Traitement Biologique à Boues Activées		
Mesure débit recirculation f1 FE04 (F7K29)	Renouvellement	Continuité de service
Pompe de Transfert SP04.3 (FAKCR)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Produits de Traitement (Prép/Stock/Distrib) - Clai		
Pompe Doseuse clairtan PD02.3 (FAKAU)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Traitement de l'air - Désodorisation air		
Pompe de Relèvement tour oxydo-basique PC202 (F7K38)	Renouvellement	Continuité de service
UDEP SAINTE SUZANNE		
BÂTIMENTS, VRD ET MOYENS DIVERS - BÂTIMENTS D'EXPL		
Grappin sur monorail 150 Kg - SANS N° - PAL-14225	Renouvellement	Continuité de service
Porte sectionnelle N°110518866 (FAKEM)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Porte sectionnelle N°233359/1 (FAKEL)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Eau de service - Alimentation eau industrielle		
Pompe d'Elévation / Surpression HB-PV-1102 (FAKCZ)	Renouvellement	Fond de renouvellement
File Boues - Conditionnement boues File 1		
Agitateur bache mélange rapide 1 EJ-AA-1100 (FAKCS)	Renouvellement	Fond de renouvellement
FILE BOUES - DÉSHYDRATATION		
Filtre à plateaux 1 EL-SB-1100 (FAKCX)	Rénovation	Fond de renouvellement
Filtre à plateaux 2 EL-SB-2100 (F9K23)	Rénovation	Fond de renouvellement
File Boues - Extraction / Soutirage des Boues		
Pompe de Soutirage DE-PV-3100 (FAKDB)	Renouvellement	Fond de renouvellement
File Boues - Stockage mélange boue St-Suzanne		
Agitateur EF-AA-3200 (FAKCT)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Agitateur EF-AA-3600 (FAKCU)	Renouvellement	Fond de renouvellement
File Eau - Bassin d'Orage Nord		
Mesure niveau BO Nord LT07 (F7K52)	Rénovation	Continuité de service
Motoréducteur Pont racleur TR02 (F7K22)	Renouvellement	Continuité de service
Pompe de reprise des eaux 1 BO Nord SP07.1 (FAKDA)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Pompe de reprise des sables BO Nord SP06 (F7K35)	Renouvellement	Continuité de service
File Eau - Clarification		
Débimètre recirculation boues FT05 (F7K49)	Rénovation	Continuité de service
Pompe recirculation boue sud CL2 SP02.4 (F9K38)	Rénovation	Fond de renouvellement
File Eau - Poste toutes eaux n°1 (EAU)		
Pompe toutes eaux LJ-PC-P1300 (FAKDD)	Renouvellement	Fond de renouvellement

File Eau - Poste toutes eaux n°2 (BOUES)		
Pompe toutes eaux LJ-PC-2200 (F9K21)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Pompe toutes eaux LJ-PC-2300 (F9K26)	Renouvellement	Fond de renouvellement
File Eau - Prétraitement		
Pompe Aération BA01.6 (FSK8L)	Renouvellement	Continuité de service
Pompe Aération BA01.3 (FSK8K)	Renouvellement	Continuité de service
Pompe Aération BA01.5 (FAKCY)	Renouvellement	Fond de renouvellement
File Eau - Relèvement de tête		
Dégrilleur fin DG04 (F7K26)	Rénovation	Continuité de service
Motoréducteur Dégrilleur fin DG02 (F7K44)	Renouvellement	Continuité de service
Motoréducteur Dégrilleur fin DG04 (FSK7W)	Renouvellement	Continuité de service
File Eau - Traitement Biologique à Boues Activées		
Mesure débit recirculation liqueurs FT04 (F7K46)	Rénovation	Continuité de service
Mesure O2 dissous aération AT02 (F7K48)	Rénovation	Continuité de service
Mesure potentiel redox endogéne AT04 (F7K51)	Rénovation	Continuité de service
Pompe recirculation liqueurs SP01.1 (FAK7J)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Surpresseur air aération secours RB01.6 (FSK7V)	Rénovation	Continuité de service
Surpresseur air endogéne RB01.4 (FAK7I)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Produits de Traitement - Lait de chaux déshydratat		
Dévouteur extraction de la chaux GR-TT-1100 (FAKCW)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Pompe GR-PV-1100 (F7K24)	Renouvellement	Continuité de service
Refus de dégrillage - Traitement et Transfert des		
Transporteur à vis TB02.2 (F9K13)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Sables Traitement - Stockage / Evacuation des Sabl		
Benne à sable BS-RB-1100 (FAKCV)	Renouvellement	Fond de renouvellement
Sables Traitement - Traitement et Transfert des Sa		
Agitateur BS-AA-1100 (FSK8R)	Renouvellement	Continuité de service
Classificateur à sable BO PR10 (FAKAM)	Renouvellement	Fond de renouvellement

5.7. RÉSEAUX

INDICE DE CONNAISSANCE ET DE GESTION PATRIMONIALE DES RÉSEAUX [P202.2]

Gestion patrimoine - Niveau de la politique patrimoniale du réseau	2021	2022	2023	2024	2025
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux	30	30	70	80	101

Gestion patrimoine - Niveau de la politique patrimoniale du réseau		Barème	Valeur ICGPR
Code VP	**Partie A : Plan des réseaux (15 points)**		
VP250	Existence d'un plan des réseaux	10	10
VP251	Mise à jour annuelle du plan des réseaux	5	5
Partie B : Inventaire des réseaux (30 points qui ne sont comptabilisés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A)			
VP252	Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques		Oui
VP253	Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres.		91,6 %
VP254	Mise à jour annuelle de l'inventaire des réseaux à partir d'une procédure formalisée pour les informations suivantes relatives aux tronçons de réseaux : linéaire, catégorie d'ouvrage, précision cartographique, matériaux et diamètres		Oui
Combinaison des variables VP252, VP253 et VP254	Informations structurelles complètes sur tronçon (diamètre, matériaux)	15	14
VP255	Connaissance pour chaque tronçon de l'âge des canalisations	15	12
	Total Parties A et B	**45**	**41**
Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 points qui ne sont comptabilisés que si 40 points au moins ont été obtenus pour la partie A et B)			
VP256	Existence information géographique précisant altimétrie canalisations	15	10
VP257	Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes	10	10
VP258	Inventaire pompes et équipements électromécaniques	10	10
VP260	Localisation des autres interventions	10	10
VP261	Définition mise en oeuvre plan pluriannuel enquête et auscultation réseau	10	10
VP262	Mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations	10	10
	Total:	**120**	**101**

Pour permettre une meilleure qualité des informations contenues dans la cartographie, il serait pertinent qu'une majorité des réseaux soit en classe A.

INVENTAIRES DES RÉSEAUX

	2021	2022	2023	2024	2025	N/N-1
Canalisations						
Longueur totale du réseau (km)	333,4	428,1	1 537,7	1 552,6	1 565,4	0,8%
Canalisations eaux usées (ml)	183 928	228 483	703 442	712 012	717 386	0,8%
dont gravitaires (ml)	168 670	210 690	665 190	672 974	678 263	0,8%
dont refoulement (ml)	15 258	17 793	38 252	39 038	39 123	0,2%
Canalisations unitaires (ml)	44 585	62 546	255 518	245 121	243 629	-0,6%
dont gravitaires (ml)	44 585	62 195	255 164	244 767	243 275	-0,6%
dont refoulement (ml)		351	354	354	354	0,0%
Canalisations eaux pluviales (ml)	104 878	137 087	578 774	595 476	604 352	1,5%
dont gravitaires (ml)	104 878	137 087	578 548	594 944	603 820	1,5%
dont refoulement (ml)			226	532	532	0,0%
Branchements						
Nombre de branchements eaux usées séparatifs ou unitaires	8 713	10 420	41 715	41 801	42 077	0,7%
Nombre de branchements eaux pluviales	0	0	39 152	39 168	39 245	0,2%
Ouvrages annexes						
Nombre de bouches d'égout, grilles avaloirs	2 429	2 429	25 074	25 074	4 729	-81,1%
Nombre de regards	5 883	5 883	33 978	40 454	40 199	-0,6%
Nombre de déversoirs d'orage	42	42	225	265	266	0,4%

Le nombre d'avaloirs à sensiblement diminué, nous avons décidé cette année d'inscrire le nombre d'avaloirs renseigné dans notre SIG, le chiffre annoncé auparavant était une estimation non mise à jour.

RENOUVELLEMENT DES CANALISATIONS

Canalisations	2021	2022	2023	2024	2025
Longueur du réseau de collecte des eaux usées hors branchements (ml)	228 513	291 029	958 960	957 133	961 015
Longueur renouvelée par le délégataire (ml)	0	150	1 962	1 161	1 247

	2021	2022	2023	2024	2025
Taux moyen de renouvellement des réseaux (%)	**0,00**		**0,26**	**0,44**	**0,28**
Longueur du réseau de collecte des eaux usées hors branchement (ml)	228 513	291 029	958 960	957 133	961 015
Longueur renouvelée par le délégataire (ml)	0	150	1 962	1 161	1 247
Longueur renouvelée totale (ml)	0	150	1 962	2 098	3 811

Le taux moyen de renouvellement des réseaux à partir de 2023 est recalculé pour prendre en compte la totalité du périmètre des 73 communes. Le taux de 2024 comportait une erreur de calcul. La valeur correcte pour 2024 est de 0,25 ce qui met en évidence une progression de ce taux en 2025.

Opérations de maintenance des réseaux et branchements

Travaux d'entretien sur le réseau	2021	2022	2023	2024	2025	N/N-1
Nombre de réparations de branchements			9	8	7	-12,5%
Nombre de réparations de collecteurs	1	2	18	20	23	15,0%
Nombre de réparations de regards			96	103	110	6,8%
Nombre de remplacements de tampons	22	56	64	70	97	38,6%

Interventions d'inspection et de contrôle	2021	2022	2023	2024	2025	N/N-1
Longueur de canalisation inspectée par caméra (ml)	39 532	48 452	140 254	154 805	154 006	-0,5%

Interventions de curage préventif	2021	2022	2023	2024	2025	N/N-1
Nombre d'interventions sur réseau	765	962	8 322	10 278	7 810	-24,0%
sur branchements	6		15	22	18	-18,2%
sur canalisations	187				871	
sur accessoires	572	962	13 832	10 256	6 921	-32,5%
sur bouches d'égout, grilles avaloirs	570	962	9 839	6 307	3 016	-52,2%
sur dessableurs	2		43	15	42	180,0%
sur déversoir d'orage			3 250	3 180	3 128	-1,6%
Longueur de canalisation curée (ml)	61 402	77 244	314 863	355 750	309 466	-13,0%

Le détail du curage préventif des collecteurs est dans le tableau ci-dessous

Commune	Bassin de collecte	Linéaire curé - Diamètre	Secteur
ABBEVILLERS	Bassin collecte UDEP Abbévillers	5467 ml	PMA Péri-Urbain
BONDEVAL	Bassin collecte UDEP Arbouans	75 ml	PMA Péri-Urbain
MESLIERES	Bassin collecte UDEP Arbouans	168 ml	PMA Péri-Urbain
BERCHE	Bassin collecte UDEP Bavans	5871 ml	PMA Péri-Urbain
DAMPIERRE-SUR-LE-DOUBS	Bassin collecte UDEP Bavans	4815 ml	PMA Péri-Urbain
BEUTAL	Bassin collecte UDEP Beutal	300 ml	PMA Péri-Urbain
PIERREFONTAINE-LES-BLAMONT	Bassin collecte UDEP Blamont	4877 ml	PMA Péri-Urbain
COLOMBIER-FONTAINE	Bassin collecte UDEP Colombier Fontaine	2485 ml	PMA Péri-Urbain
ETOUVANS	Bassin collecte UDEP Colombier Fontaine	14297 ml	PMA Péri-Urbain
LONGEVELLE-SUR-DOUBS	Bassin collecte UDEP Colombier Fontaine	7881 ml	PMA Péri-Urbain
LOUGRES	Bassin collecte UDEP Colombier Fontaine	1168 ml	PMA Péri-Urbain
DAMBELIN	Bassin collecte UDEP Dambelin	408 ml	PMA Péri-Urbain
GOUX-LES-DAMBELIN	Bassin collecte UDEP Dambelin	1229 ml	PMA Péri-Urbain

ALLONDANS	Bassin collecte UDEP Dung	4004 ml	PMA Péri-Urbain
DUNG	Bassin collecte UDEP Dung	969 ml	PMA Péri-Urbain
ISSANS	Bassin collecte UDEP Dung	328 ml	PMA Péri-Urbain
RAYNANS	Bassin collecte UDEP Dung	3136 ml	PMA Péri-Urbain
ECHENANS	Bassin collecte UDEP Echenans	3186 ml	PMA Péri-Urbain
SAINT-JULIEN-LES-MONTBELIARD	Bassin collecte UDEP Echenans	2727 ml	PMA Péri-Urbain
SEMONDANS	Bassin collecte UDEP Echenans	1359 ml	PMA Péri-Urbain
ECOT	Bassin collecte UDEP Ecot	5247 ml	PMA Péri-Urbain
FEULE	Bassin collecte UDEP Feule	4454 ml	PMA Péri-Urbain
MONTENOIS	Bassin collecte UDEP Montenois	1219 ml	PMA Péri-Urbain
AUTECHAUX-ROIDE	Bassin collecte UDEP Pont de Roide Vermondans	2543 ml	PMA Péri-Urbain
BOURGUIGNON	Bassin collecte UDEP Pont de Roide Vermondans	7527 ml	PMA Péri-Urbain
ECURCEY	Bassin collecte UDEP Pont de Roide Vermondans	330 ml	PMA Péri-Urbain
NOIREFONTAINE	Bassin collecte UDEP Pont de Roide Vermondans	70 ml	PMA Péri-Urbain
PONT-DE-ROIDE-VERMONDANS	Bassin collecte UDEP Pont de Roide Vermondans	4174 ml	PMA Péri-Urbain
VILLARS-SOUS-DAMPJOUX	Bassin collecte UDEP Pont de Roide Vermondans	193 ml	PMA Péri-Urbain
PRESENTEVILLERS	Bassin collecte UDEP Présentvillers	682 ml	PMA Péri-Urbain
ROCHES-LES-BLAMONT	Bassin collecte UDEP Roche les Blamont	944 ml	PMA Péri-Urbain
SAINT-MAURICE-COLOMBIER	Bassin collecte UDEP Saint Maurice Colombier	11926 ml	PMA Péri-Urbain
VILLARS-SOUS-ECOT	Bassin collecte UDEP Saint Maurice Colombier	6180 ml	PMA Péri-Urbain
SAINTE-MARIE	Bassin collecte UDEP Sainte Marie	1648 ml	PMA Péri-Urbain
SOLEMONT	Bassin collecte UDEP Solemont	860 ml	PMA Péri-Urbain
VILLARS-LES-BLAMONT	Bassin collecte UDEP Villars les Blamont	4192 ml	PMA Péri-Urbain
ARBOUANS	Bassin collecte UDEP Arbouans	2496 ml	PMA Urbain
AUDINCOURT	Bassin collecte UDEP Arbouans	11080 ml	PMA Urbain
DASLE	Bassin collecte UDEP Arbouans	4810 ml	PMA Urbain
HERIMONCOURT	Bassin collecte UDEP Arbouans	4619 ml	PMA Urbain
MANDEURE	Bassin collecte UDEP Arbouans	9093 ml	PMA Urbain
MATHAY	Bassin collecte UDEP Arbouans	4515 ml	PMA Urbain
SELONCOURT	Bassin collecte UDEP Arbouans	25961 ml	PMA Urbain
TAILLECOURT	Bassin collecte UDEP Arbouans	2131 ml	PMA Urbain
VALENTIGNEY	Bassin collecte UDEP Arbouans	14342 ml	PMA Urbain
VANDONCOURT	Bassin collecte UDEP Arbouans	649 ml	PMA Urbain
BART	Bassin collecte UDEP Bavans	1258 ml	PMA Urbain
BAVANS	Bassin collecte UDEP Bavans	6138 ml	PMA Urbain
VOUJEAUCOURT	Bassin collecte UDEP Bavans	4737 ml	PMA Urbain
ALLENJOIE	Bassin collecte UDEP Sainte Suzanne	2288 ml	PMA Urbain
BADEVEL	Bassin collecte UDEP Sainte Suzanne	3618 ml	PMA Urbain
BETHONCOURT	Bassin collecte UDEP Sainte Suzanne	9615 ml	PMA Urbain
BROGNARD	Bassin collecte UDEP Sainte Suzanne	1631 ml	PMA Urbain
COURCELLES-LES-MONTBELIARD	Bassin collecte UDEP Sainte Suzanne	6261 ml	PMA Urbain
DAMBENOIS	Bassin collecte UDEP Sainte Suzanne	990 ml	PMA Urbain
DAMPIERRE-LES-BOIS	Bassin collecte UDEP Sainte Suzanne	858 ml	PMA Urbain

ETUPES	Bassin collecte UDEP Sainte Suzanne	5145 ml	PMA Urbain
EXINCOURT	Bassin collecte UDEP Sainte Suzanne	17710 ml	PMA Urbain
FESCHES-LE-CHATEL	Bassin collecte UDEP Sainte Suzanne	4504 ml	PMA Urbain
GRAND-CHARMONT	Bassin collecte UDEP Sainte Suzanne	11253 ml	PMA Urbain
MONTBELIARD	Bassin collecte UDEP Sainte Suzanne	19432 ml	PMA Urbain
NOMMAY	Bassin collecte UDEP Sainte Suzanne	3959 ml	PMA Urbain
SAINTE-SUZANNE	Bassin collecte UDEP Sainte Suzanne	1846 ml	PMA Urbain
SOCHAUX	Bassin collecte UDEP Sainte Suzanne	5499 ml	PMA Urbain
VIEUX-CHARMONT	Bassin collecte UDEP Sainte Suzanne	6011 ml	PMA Urbain

Interventions curatives	2021	2022	2023	2024	2025	N/N-1
Nombre de désobstructions sur réseau	35	27	187	330	260	-21,2%
sur branchements	12	12	93	182	110	-39,6%
sur canalisations	19	15	73	114	144	26,3%
sur accessoires	4		21	34	6	-82,4%
sur bouches d'égout, grilles avaloirs	4		21	34	6	-82,4%
Longueur de canalisation curée dans le cadre d'une opération de désobstruction (ml)	1 176		2 388	2 756	6 974	153,0%

POINTS NOIRS DU RÉSEAU DE COLLECTE

	2021	2022	2023	2024	2025	N/N-1
Nombre total de points concernés sur le réseau	2	2	36	36	35	-2,8%
Longueur du réseau de collecte des eaux usées hors branchements (ml)	228 513	291 029	958 960	957 133	961 015	0,4%
Nombre de points du réseau nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100km	0,88	0,69	3,75	3,76	3,64	-3,2%

5.8. Gestion des réseaux

Renouvellement patrimoine réseaux

Réseaux	Quantité renouvelée dans l'exercice	Mode de gestion
Réseau (lot)		
AVALOIRS ET BOUCHES EGOUT (YSK13)	4	Continuité de service
BRANCHEMENTS ASSAINISSEMENT (ASK11)	7	Continuité de service
TAMPONS DE REGARD (YSK11)	51	Continuité de service
TAMPONS DE REGARD (YSK12)	57	Continuité de service

L'auscultation du réseau de collecte

Ci-dessous un tableau présentant les inspections télévisées des canalisations :

Commune	Bassin de collecte	Linéaire inspecté - Diamètre	Secteur
ABBEVILLERS	Bassin collecte UDEP Abbévillers	4196 ml	Secteur Péri urbain
BONDEVAL	Bassin collecte UDEP Arbouans	114 ml	Secteur Péri urbain
BERCHE	Bassin collecte UDEP Bavans	4308 ml	Secteur Péri urbain
DAMPIERRE-SUR-LE-DOUBS	Bassin collecte UDEP Bavans	3484 ml	Secteur Péri urbain
BEUTAL	Bassin collecte UDEP Beutal	489 ml	Secteur Péri urbain
BLAMONT	Bassin collecte UDEP Blamont	148 ml	Secteur Péri urbain
PIERREFONTAINE-LES-BLAMONT	Bassin collecte UDEP Blamont	5391 ml	Secteur Péri urbain
COLOMBIER-FONTAINE	Bassin collecte UDEP Colombier Fontaine	396 ml	Secteur Péri urbain
ETOUVANS	Bassin collecte UDEP Colombier Fontaine	12709 ml	Secteur Péri urbain
LONGEVELLE-SUR-DOUBS	Bassin collecte UDEP Colombier Fontaine	5162 ml	Secteur Péri urbain
LOUGRES	Bassin collecte UDEP Colombier Fontaine	103 ml	Secteur Péri urbain
DAMBELIN	Bassin collecte UDEP Dambelin	122 ml	Secteur Péri urbain
ALLONDANS	Bassin collecte UDEP Dung	3256 ml	Secteur Péri urbain
DUNG	Bassin collecte UDEP Dung	229 ml	Secteur Péri urbain
RAYNANS	Bassin collecte UDEP Dung	3092 ml	Secteur Péri urbain
ECHENANS	Bassin collecte UDEP Echenans	3381 ml	Secteur Péri urbain
SAINT-JULIEN-LES-MONTBELIARD	Bassin collecte UDEP Echenans	3848 ml	Secteur Péri urbain
ECOT	Bassin collecte UDEP Ecot	6327 ml	Secteur Péri urbain
FEULE	Bassin collecte UDEP Feule	4685 ml	Secteur Péri urbain
MONTENOIS	Bassin collecte UDEP Montenois	1206 ml	Secteur Péri urbain
AUTECHAUX-ROIDE	Bassin collecte UDEP Pont de Roide Vermondans	2158 ml	Secteur Péri urbain
BOURGUIGNON	Bassin collecte UDEP Pont de Roide Vermondans	7249 ml	Secteur Péri urbain
ECURCEY	Bassin collecte UDEP Pont de Roide Vermondans	227 ml	Secteur Péri urbain
NOIREFONTAINE	Bassin collecte UDEP Pont de Roide Vermondans	180 ml	Secteur Péri urbain

PONT-DE-ROIDE-VERMONDANS	Bassin collecte UDEP Pont de Roide Vermondans	1211 ml	Secteur Péri urbain
VILLARS-SOUS-DAMPJOUX	Bassin collecte UDEP Pont de Roide Vermondans	207 ml	Secteur Péri urbain
ROCHES-LES-BLAMONT	Bassin collecte UDEP Roche les Blamont	193 ml	Secteur Péri urbain
SAINT-MAURICE-COLOMBIER	Bassin collecte UDEP Saint Maurice Colombier	12412 ml	Secteur Péri urbain
VILLARS-SOUS-ECOT	Bassin collecte UDEP Saint Maurice Colombier	5981 ml	Secteur Péri urbain
SAINTE-MARIE	Bassin collecte UDEP Sainte Marie	229 ml	Secteur Péri urbain
VILLARS-LES-BLAMONT	Bassin collecte UDEP Villars les Blamont	6026 ml	Secteur Péri urbain
AUDINCOURT	Bassin collecte UDEP Arbouans	1035 ml	Secteur Urbain
DASLE	Bassin collecte UDEP Arbouans	2861 ml	Secteur Urbain
HERIMONCOURT	Bassin collecte UDEP Arbouans	2221 ml	Secteur Urbain
MANDEURE	Bassin collecte UDEP Arbouans	311 ml	Secteur Urbain
MATHAY	Bassin collecte UDEP Arbouans	130 ml	Secteur Urbain
SELONCOURT	Bassin collecte UDEP Arbouans	8242 ml	Secteur Urbain
TAILLECOURT	Bassin collecte UDEP Arbouans	55 ml	Secteur Urbain
VALENTIGNEY	Bassin collecte UDEP Arbouans	9715 ml	Secteur Urbain
BART	Bassin collecte UDEP Bavans	37 ml	Secteur Urbain
BAVANS	Bassin collecte UDEP Bavans	28 ml	Secteur Urbain
VOUJEAUCOURT	Bassin collecte UDEP Bavans	31 ml	Secteur Urbain
ALLENJOIE	Bassin collecte UDEP Sainte Suzanne	502 ml	Secteur Urbain
BETHONCOURT	Bassin collecte UDEP Sainte Suzanne	3529 ml	Secteur Urbain
DAMBENOIS	Bassin collecte UDEP Sainte Suzanne	95 ml	Secteur Urbain
DAMPIERRE-LES-BOIS	Bassin collecte UDEP Sainte Suzanne	103 ml	Secteur Urbain
ETUPES	Bassin collecte UDEP Sainte Suzanne	442 ml	Secteur Urbain
EXINCOURT	Bassin collecte UDEP Sainte Suzanne	8815 ml	Secteur Urbain
FESCHES-LE-CHATEL	Bassin collecte UDEP Sainte Suzanne	563 ml	Secteur Urbain
GRAND-CHARMONT	Bassin collecte UDEP Sainte Suzanne	6787 ml	Secteur Urbain
MONTBELIARD	Bassin collecte UDEP Sainte Suzanne	8430 ml	Secteur Urbain
SAINTE-SUZANNE	Bassin collecte UDEP Sainte Suzanne	90 ml	Secteur Urbain
SOCHAUX	Bassin collecte UDEP Sainte Suzanne	851 ml	Secteur Urbain
VIEUX-CHARMONT	Bassin collecte UDEP Sainte Suzanne	518 ml	Secteur Urbain

5.9. Consommateurs de votre service et leur satisfaction

La facture 120 m³ de chaque commune

ABBEVILLERS	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**201,37**	**215,38**	**6,96%**
Part délégataire			**132,50**	**139,10**	**4,98%**
Consommation	120	1,1592	132,50	139,10	4,98%
Part collectivité(s)			**68,87**	**76,28**	**10,76%**
Consommation	120	0,6357	68,87	76,28	10,76%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**202,57**	**219,06**	**8,14%**
TVA			20,26	21,91	8,14%
TOTAL € TTC			**222,83**	**240,97**	**8,14%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

ALLENJOIE	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**209,10**	**215,38**	**3,00%**
Part délégataire			**141,97**	**139,10**	**-2,02%**
Consommation	120	1,1592	141,97	139,10	-2,02%
Part collectivité(s)			**67,13**	**76,28**	**13,63%**
Consommation	120	0,6357	67,13	76,28	13,63%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**210,30**	**219,06**	**4,17%**
TVA			21,03	21,91	4,18%
TOTAL € TTC			**231,33**	**240,97**	**4,17%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

ALLONDANS	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**208,52**	**215,38**	**3,29%**
Part délégataire			**128,84**	**139,10**	**7,96%**
Consommation	120	1,1592	128,84	139,10	7,96%
Part collectivité(s)			**79,68**	**76,28**	**-4,27%**
Consommation	120	0,6357	79,68	76,28	-4,27%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**

Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**209,72**	**219,06**	**4,45%**
TVA			20,97	21,91	4,48%
TOTAL € TTC			**230,69**	**240,97**	**4,46%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

ARBOUANS	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**209,10**	**215,38**	**3,00%**
Part délégataire			**141,97**	**139,10**	**-2,02%**
Consommation	120	1,1592	141,97	139,10	-2,02%
Part collectivité(s)			**67,13**	**76,28**	**13,63%**
Consommation	120	0,6357	67,13	76,28	13,63%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**210,30**	**219,06**	**4,17%**
TVA			21,03	21,91	4,18%
TOTAL € TTC			**231,33**	**240,97**	**4,17%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

AUDINCOURT	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**209,10**	**215,38**	**3,00%**
Part délégataire			**141,97**	**139,10**	**-2,02%**
Consommation	120	1,1592	141,97	139,10	-2,02%
Part collectivité(s)			**67,13**	**76,28**	**13,63%**
Consommation	120	0,6357	67,13	76,28	13,63%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**210,30**	**219,06**	**4,17%**
TVA			21,03	21,91	4,18%
TOTAL € TTC			**231,33**	**240,97**	**4,17%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

AUTECHAUX ROIDE	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**199,43**	**215,38**	**8,00%**
Part délégataire			**131,21**	**139,10**	**6,01%**
Consommation	120	1,1592	131,21	139,10	6,01%
Part collectivité(s)			**68,22**	**76,28**	**11,81%**
Consommation	120	0,6357	68,22	76,28	11,81%

Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**200,63**	**219,06**	**9,19%**
TVA			20,06	21,91	9,22%
TOTAL € TTC			**220,69**	**240,97**	**9,19%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

BADEVEL	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**209,10**	**215,38**	**3,00%**
Part délégataire			**141,97**	**139,10**	**-2,02%**
Consommation	120	1,1592	141,97	139,10	-2,02%
Part collectivité(s)			**67,13**	**76,28**	**13,63%**
Consommation	120	0,6357	67,13	76,28	13,63%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**210,30**	**219,06**	**4,17%**
TVA			21,03	21,91	4,18%
TOTAL € TTC			**231,33**	**240,97**	**4,17%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

BART	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**209,10**	**215,38**	**3,00%**
Part délégataire			**141,97**	**139,10**	**-2,02%**
Consommation	120	1,1592	141,97	139,10	-2,02%
Part collectivité(s)			**67,13**	**76,28**	**13,63%**
Consommation	120	0,6357	67,13	76,28	13,63%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**210,30**	**219,06**	**4,17%**
TVA			21,03	21,91	4,18%
TOTAL € TTC			**231,33**	**240,97**	**4,17%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

BAVANS	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**209,10**	**215,38**	**3,00%**
Part délégataire			**141,97**	**139,10**	**-2,02%**
Consommation	120	1,1592	141,97	139,10	-2,02%
Part collectivité(s)			**67,13**	**76,28**	**13,63%**

Consommation	120	0,6357	67,13	76,28	13,63%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**210,30**	**219,06**	**4,17%**
TVA			21,03	21,91	4,18%
TOTAL € TTC			**231,33**	**240,97**	**4,17%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

BERCHE	**m³**	**Prix au 01/01/2026**	**Montant au 01/01/2025**	**Montant au 01/01/2026**	**N/N-1**
Collecte et dépollution des eaux usées *			**207,98**	**215,38**	**3,56%**
Part délégataire			**136,04**	**139,10**	**2,25%**
Consommation	120	1,1592	136,04	139,10	2,25%
Part collectivité(s)			**71,94**	**76,28**	**6,03%**
Consommation	120	0,6357	71,94	76,28	6,03%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**209,18**	**219,06**	**4,72%**
TVA			20,91	21,91	4,78%
TOTAL € TTC			**230,09**	**240,97**	**4,73%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

BETHONCOURT	**m³**	**Prix au 01/01/2026**	**Montant au 01/01/2025**	**Montant au 01/01/2026**	**N/N-1**
Collecte et dépollution des eaux usées *			**209,10**	**215,38**	**3,00%**
Part délégataire			**141,97**	**139,10**	**-2,02%**
Consommation	120	1,1592	141,97	139,10	-2,02%
Part collectivité(s)			**67,13**	**76,28**	**13,63%**
Consommation	120	0,6357	67,13	76,28	13,63%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**210,30**	**219,06**	**4,17%**
TVA			21,03	21,91	4,18%
TOTAL € TTC			**231,33**	**240,97**	**4,17%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

BEUTAL	**m³**	**Prix au 01/01/2026**	**Montant au 01/01/2025**	**Montant au 01/01/2026**	**N/N-1**
Collecte et dépollution des eaux usées *			**211,05**	**215,38**	**2,05%**
Part délégataire			**137,68**	**139,10**	**1,03%**
Consommation	120	1,1592	137,68	139,10	1,03%

Part collectivité(s)			**73,37**	**76,28**	**3,97%**
Consommation	120	0,6357	73,37	76,28	3,97%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**212,25**	**219,06**	**3,21%**
TVA			21,23	21,91	3,20%
TOTAL € TTC			**233,48**	**240,97**	**3,21%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

BLAMONT	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**195,24**	**215,38**	**10,32%**
Part délégataire			**129,23**	**139,10**	**7,64%**
Consommation	120	1,1592	129,23	139,10	7,64%
Part collectivité(s)			**66,01**	**76,28**	**15,56%**
Consommation	120	0,6357	66,01	76,28	15,56%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**196,44**	**219,06**	**11,51%**
TVA			19,64	21,91	11,56%
TOTAL € TTC			**216,08**	**240,97**	**11,52%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

BONDEVAL	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**199,78**	**215,38**	**7,81%**
Part délégataire			**127,22**	**139,10**	**9,34%**
Consommation	120	1,1592	127,22	139,10	9,34%
Part collectivité(s)			**72,56**	**76,28**	**5,13%**
Consommation	120	0,6357	72,56	76,28	5,13%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**200,98**	**219,06**	**9,00%**
TVA			20,10	21,91	9,00%
TOTAL € TTC			**221,08**	**240,97**	**9,00%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

BOURGUIGNON	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**203,55**	**215,38**	**5,81%**
Part délégataire			**133,67**	**139,10**	**4,06%**

Consommation	120	1,1592	133,67	139,10	4,06%
Part collectivité(s)			**69,88**	**76,28**	**9,16%**
Consommation	120	0,6357	69,88	76,28	9,16%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**204,75**	**219,06**	**6,99%**
TVA			20,48	21,91	6,98%
TOTAL € TTC			**225,23**	**240,97**	**6,99%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

BRETIGNEY	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**205,00**	**215,38**	**5,06%**
Part délégataire			**134,45**	**139,10**	**3,46%**
Consommation	120	1,1592	134,45	139,10	3,46%
Part collectivité(s)			**70,55**	**76,28**	**8,12%**
Consommation	120	0,6357	70,55	76,28	8,12%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**206,20**	**219,06**	**6,24%**
TVA			20,63	21,91	6,20%
TOTAL € TTC			**226,83**	**240,97**	**6,23%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

BROGNARD	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**209,10**	**215,38**	**3,00%**
Part délégataire			**141,97**	**139,10**	**-2,02%**
Consommation	120	1,1592	141,97	139,10	-2,02%
Part collectivité(s)			**67,13**	**76,28**	**13,63%**
Consommation	120	0,6357	67,13	76,28	13,63%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**210,30**	**219,06**	**4,17%**
TVA			21,03	21,91	4,18%
TOTAL € TTC			**231,33**	**240,97**	**4,17%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

COLOMBIER FONTAINE	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**221,51**	**215,38**	**-2,77%**

Part délégataire			**141,97**	**139,10**	**-2,02%**
Consommation	120	1,1592	141,97	139,10	-2,02%
Part collectivité(s)			**79,54**	**76,28**	**-4,10%**
Consommation	120	0,6357	79,54	76,28	-4,10%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**222,71**	**219,06**	**-1,64%**
TVA			22,27	21,91	-1,62%
TOTAL € TTC			**244,98**	**240,97**	**-1,64%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

COURCELLES LES MONTBELIARD	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**209,10**	**215,38**	**3,00%**
Part délégataire			**141,97**	**139,10**	**-2,02%**
Consommation	120	1,1592	141,97	139,10	-2,02%
Part collectivité(s)			**67,13**	**76,28**	**13,63%**
Consommation	120	0,6357	67,13	76,28	13,63%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**210,30**	**219,06**	**4,17%**
TVA			21,03	21,91	4,18%
TOTAL € TTC			**231,33**	**240,97**	**4,17%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

DAMBELIN	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**196,76**	**215,38**	**9,46%**
Part délégataire			**129,94**	**139,10**	**7,05%**
Consommation	120	1,1592	129,94	139,10	7,05%
Part collectivité(s)			**66,82**	**76,28**	**14,16%**
Consommation	120	0,6357	66,82	76,28	14,16%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**197,96**	**219,06**	**10,66%**
TVA			19,79	21,91	10,71%
TOTAL € TTC			**217,75**	**240,97**	**10,66%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

DAMBENOIS	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1

Collecte et dépollution des eaux usées *			**209,10**	**215,38**	**3,00%**
Part délégataire			**141,97**	**139,10**	**-2,02%**
Consommation	120	1,1592	141,97	139,10	-2,02%
Part collectivité(s)			**67,13**	**76,28**	**13,63%**
Consommation	120	0,6357	67,13	76,28	13,63%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**210,30**	**219,06**	**4,17%**
TVA			21,03	21,91	4,18%
TOTAL € TTC			**231,33**	**240,97**	**4,17%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

DAMPIERRE LES BOIS	m^3	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**209,10**	**215,38**	**3,00%**
Part délégataire			**141,97**	**139,10**	**-2,02%**
Consommation	120	1,1592	141,97	139,10	-2,02%
Part collectivité(s)			**67,13**	**76,28**	**13,63%**
Consommation	120	0,6357	67,13	76,28	13,63%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**210,30**	**219,06**	**4,17%**
TVA			21,03	21,91	4,18%
TOTAL € TTC			**231,33**	**240,97**	**4,17%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

DAMPIERRE SUR LE DOUBS	m^3	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**207,98**	**215,38**	**3,56%**
Part délégataire			**136,04**	**139,10**	**2,25%**
Consommation	120	1,1592	136,04	139,10	2,25%
Part collectivité(s)			**71,94**	**76,28**	**6,03%**
Consommation	120	0,6357	71,94	76,28	6,03%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**209,18**	**219,06**	**4,72%**
TVA			20,91	21,91	4,78%
TOTAL € TTC			**230,09**	**240,97**	**4,73%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

DAMPJOUX	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *				**215,38**	
Part délégataire				**139,10**	
Consommation	120	1,1592		139,10	
Part collectivité(s)				**76,28**	
Consommation	120	0,6357		76,28	
Organismes publics				**3,68**	
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307		3,68	
TOTAL € HT				**219,06**	
TVA				21,91	
TOTAL € TTC				**240,97**	

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

DASLE	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**209,10**	**215,38**	**3,00%**
Part délégataire			**141,97**	**139,10**	**-2,02%**
Consommation	120	1,1592	141,97	139,10	-2,02%
Part collectivité(s)			**67,13**	**76,28**	**13,63%**
Consommation	120	0,6357	67,13	76,28	13,63%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**210,30**	**219,06**	**4,17%**
TVA			21,03	21,91	4,18%
TOTAL € TTC			**231,33**	**240,97**	**4,17%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

DUNG	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**208,52**	**215,38**	**3,29%**
Part délégataire			**128,84**	**139,10**	**7,96%**
Consommation	120	1,1592	128,84	139,10	7,96%
Part collectivité(s)			**79,68**	**76,28**	**-4,27%**
Consommation	120	0,6357	79,68	76,28	-4,27%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**209,72**	**219,06**	**4,45%**
TVA			20,97	21,91	4,48%
TOTAL € TTC			**230,69**	**240,97**	**4,46%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

ECHENANS	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**208,52**	**215,38**	**3,29%**
Part délégataire			**128,84**	**139,10**	**7,96%**
Consommation	120	1,1592	128,84	139,10	7,96%
Part collectivité(s)			**79,68**	**76,28**	**-4,27%**
Consommation	120	0,6357	79,68	76,28	-4,27%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**209,72**	**219,06**	**4,45%**
TVA			20,97	21,91	4,48%
TOTAL € TTC			**230,69**	**240,97**	**4,46%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

ECOT	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**199,79**	**215,38**	**7,80%**
Part délégataire			**127,36**	**139,10**	**9,22%**
Consommation	120	1,1592	127,36	139,10	9,22%
Part collectivité(s)			**72,43**	**76,28**	**5,32%**
Consommation	120	0,6357	72,43	76,28	5,32%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**200,99**	**219,06**	**8,99%**
TVA			20,10	21,91	9,00%
TOTAL € TTC			**221,09**	**240,97**	**8,99%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

ECURCEY	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**198,95**	**215,38**	**8,26%**
Part délégataire			**131,21**	**139,10**	**6,01%**
Consommation	120	1,1592	131,21	139,10	6,01%
Part collectivité(s)			**67,74**	**76,28**	**12,61%**
Consommation	120	0,6357	67,74	76,28	12,61%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**200,15**	**219,06**	**9,45%**
TVA			20,01	21,91	9,50%
TOTAL € TTC			**220,16**	**240,97**	**9,45%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

ETOUVANS	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**230,96**	**215,38**	**-6,75%**
Part délégataire			**141,97**	**139,10**	**-2,02%**
Consommation	120	1,1592	141,97	139,10	-2,02%
Part collectivité(s)			**88,99**	**76,28**	**-14,28%**
Consommation	120	0,6357	88,99	76,28	-14,28%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**232,16**	**219,06**	**-5,64%**
TVA			23,22	21,91	-5,64%
TOTAL € TTC			**255,38**	**240,97**	**-5,64%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

ETUPES	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**209,10**	**215,38**	**3,00%**
Part délégataire			**141,97**	**139,10**	**-2,02%**
Consommation	120	1,1592	141,97	139,10	-2,02%
Part collectivité(s)			**67,13**	**76,28**	**13,63%**
Consommation	120	0,6357	67,13	76,28	13,63%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**210,30**	**219,06**	**4,17%**
TVA			21,03	21,91	4,18%
TOTAL € TTC			**231,33**	**240,97**	**4,17%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

EXINCOURT	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**209,10**	**215,38**	**3,00%**
Part délégataire			**141,97**	**139,10**	**-2,02%**
Consommation	120	1,1592	141,97	139,10	-2,02%
Part collectivité(s)			**67,13**	**76,28**	**13,63%**
Consommation	120	0,6357	67,13	76,28	13,63%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**210,30**	**219,06**	**4,17%**
TVA			21,03	21,91	4,18%

TOTAL € TTC			**231,33**	**240,97**	**4,17%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

FESCHES LE CHATEL	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**209,10**	**215,38**	**3,00%**
Part délégataire			**141,97**	**139,10**	**-2,02%**
Consommation	120	1,1592	141,97	139,10	-2,02%
Part collectivité(s)			**67,13**	**76,28**	**13,63%**
Consommation	120	0,6357	67,13	76,28	13,63%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**210,30**	**219,06**	**4,17%**
TVA			21,03	21,91	4,18%
TOTAL € TTC			**231,33**	**240,97**	**4,17%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

FEULE	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**223,20**	**215,38**	**-3,50%**
Part délégataire			**141,97**	**139,10**	**-2,02%**
Consommation	120	1,1592	141,97	139,10	-2,02%
Part collectivité(s)			**81,23**	**76,28**	**-6,09%**
Consommation	120	0,6357	81,23	76,28	-6,09%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**224,40**	**219,06**	**-2,38%**
TVA			22,44	21,91	-2,36%
TOTAL € TTC			**246,84**	**240,97**	**-2,38%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

GLAY	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**213,44**	**215,38**	**0,91%**
Part délégataire			**138,96**	**139,10**	**0,10%**
Consommation	120	1,1592	138,96	139,10	0,10%
Part collectivité(s)			**74,48**	**76,28**	**2,42%**
Consommation	120	0,6357	74,48	76,28	2,42%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**214,64**	**219,06**	**2,06%**

TVA			21,47	21,91	2,05%
TOTAL € TTC			**236,11**	**240,97**	**2,06%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

GOUX LES DAMBELIN	**m³**	**Prix au 01/01/2026**	**Montant au 01/01/2025**	**Montant au 01/01/2026**	**N/N-1**
Collecte et dépollution des eaux usées *			**206,69**	**215,38**	**4,20%**
Part délégataire			**135,35**	**139,10**	**2,77%**
Consommation	120	1,1592	135,35	139,10	2,77%
Part collectivité(s)			**71,34**	**76,28**	**6,92%**
Consommation	120	0,6357	71,34	76,28	6,92%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**207,89**	**219,06**	**5,37%**
TVA			20,79	21,91	5,39%
TOTAL € TTC			**228,68**	**240,97**	**5,37%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

GRAND CHARMONT	**m³**	**Prix au 01/01/2026**	**Montant au 01/01/2025**	**Montant au 01/01/2026**	**N/N-1**
Collecte et dépollution des eaux usées *			**209,10**	**215,38**	**3,00%**
Part délégataire			**141,97**	**139,10**	**-2,02%**
Consommation	120	1,1592	141,97	139,10	-2,02%
Part collectivité(s)			**67,13**	**76,28**	**13,63%**
Consommation	120	0,6357	67,13	76,28	13,63%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**210,30**	**219,06**	**4,17%**
TVA			21,03	21,91	4,18%
TOTAL € TTC			**231,33**	**240,97**	**4,17%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

HERIMONCOURT	**m³**	**Prix au 01/01/2026**	**Montant au 01/01/2025**	**Montant au 01/01/2026**	**N/N-1**
Collecte et dépollution des eaux usées *			**209,10**	**215,38**	**3,00%**
Part délégataire			**141,97**	**139,10**	**-2,02%**
Consommation	120	1,1592	141,97	139,10	-2,02%
Part collectivité(s)			**67,13**	**76,28**	**13,63%**
Consommation	120	0,6357	67,13	76,28	13,63%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%

TOTAL € HT			**210,30**	**219,06**	**4,17%**
TVA			21,03	21,91	4,18%
TOTAL € TTC			**231,33**	**240,97**	**4,17%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

ISSANS	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**208,52**	**215,38**	**3,29%**
Part délégataire			**128,84**	**139,10**	**7,96%**
Consommation	120	1,1592	128,84	139,10	7,96%
Part collectivité(s)			**79,68**	**76,28**	**-4,27%**
Consommation	120	0,6357	79,68	76,28	-4,27%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**209,72**	**219,06**	**4,45%**
TVA			20,97	21,91	4,48%
TOTAL € TTC			**230,69**	**240,97**	**4,46%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

LONGEVELLE SUR DOUBS	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**222,86**	**215,38**	**-3,36%**
Part délégataire			**141,97**	**139,10**	**-2,02%**
Consommation	120	1,1592	141,97	139,10	-2,02%
Part collectivité(s)			**80,89**	**76,28**	**-5,70%**
Consommation	120	0,6357	80,89	76,28	-5,70%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**224,06**	**219,06**	**-2,23%**
TVA			22,41	21,91	-2,23%
TOTAL € TTC			**246,47**	**240,97**	**-2,23%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

LOUGRES	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**225,95**	**215,38**	**-4,68%**
Part délégataire			**141,97**	**139,10**	**-2,02%**
Consommation	120	1,1592	141,97	139,10	-2,02%
Part collectivité(s)			**83,98**	**76,28**	**-9,17%**
Consommation	120	0,6357	83,98	76,28	-9,17%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**

Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**227,15**	**219,06**	**-3,56%**
TVA			22,72	21,91	-3,57%
TOTAL € TTC			**249,87**	**240,97**	**-3,56%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

MANDEURE	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**209,10**	**215,38**	**3,00%**
Part délégataire			**141,97**	**139,10**	**-2,02%**
Consommation	120	1,1592	141,97	139,10	-2,02%
Part collectivité(s)			**67,13**	**76,28**	**13,63%**
Consommation	120	0,6357	67,13	76,28	13,63%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**210,30**	**219,06**	**4,17%**
TVA			21,03	21,91	4,18%
TOTAL € TTC			**231,33**	**240,97**	**4,17%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

MATHAY	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**209,10**	**215,38**	**3,00%**
Part délégataire			**141,97**	**139,10**	**-2,02%**
Consommation	120	1,1592	141,97	139,10	-2,02%
Part collectivité(s)			**67,13**	**76,28**	**13,63%**
Consommation	120	0,6357	67,13	76,28	13,63%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**210,30**	**219,06**	**4,17%**
TVA			21,03	21,91	4,18%
TOTAL € TTC			**231,33**	**240,97**	**4,17%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

MESLIERES	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**209,10**	**215,38**	**3,00%**
Part délégataire			**136,63**	**139,10**	**1,81%**
Consommation	120	1,1592	136,63	139,10	1,81%
Part collectivité(s)			**72,47**	**76,28**	**5,26%**
Consommation	120	0,6357	72,47	76,28	5,26%

Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**210,30**	**219,06**	**4,17%**
TVA			21,03	21,91	4,18%
TOTAL € TTC			**231,33**	**240,97**	**4,17%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

MONTBELIARD	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**209,10**	**215,38**	**3,00%**
Part délégataire			**141,97**	**139,10**	**-2,02%**
Consommation	120	1,1592	141,97	139,10	-2,02%
Part collectivité(s)			**67,13**	**76,28**	**13,63%**
Consommation	120	0,6357	67,13	76,28	13,63%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**210,30**	**219,06**	**4,17%**
TVA			21,03	21,91	4,18%
TOTAL € TTC			**231,33**	**240,97**	**4,17%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

MONTENOIS	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**202,59**	**215,38**	**6,31%**
Part délégataire			**133,16**	**139,10**	**4,46%**
Consommation	120	1,1592	133,16	139,10	4,46%
Part collectivité(s)			**69,43**	**76,28**	**9,87%**
Consommation	120	0,6357	69,43	76,28	9,87%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**203,79**	**219,06**	**7,49%**
TVA			20,38	21,91	7,51%
TOTAL € TTC			**224,17**	**240,97**	**7,49%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

NEUCHATEL URTIERE	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**223,20**	**215,38**	**-3,50%**
Part délégataire			**141,97**	**139,10**	**-2,02%**
Consommation	120	1,1592	141,97	139,10	-2,02%
Part collectivité(s)			**81,23**	**76,28**	**-6,09%**

Consommation	120	0,6357	81,23	76,28	-6,09%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**224,40**	**219,06**	**-2,38%**
TVA			22,44	21,91	-2,36%
TOTAL € TTC			**246,84**	**240,97**	**-2,38%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

NOIREFONTAINE	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**211,05**	**215,38**	**2,05%**
Part délégataire			**137,68**	**139,10**	**1,03%**
Consommation	120	1,1592	137,68	139,10	1,03%
Part collectivité(s)			**73,37**	**76,28**	**3,97%**
Consommation	120	0,6357	73,37	76,28	3,97%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**212,25**	**219,06**	**3,21%**
TVA			21,23	21,91	3,20%
TOTAL € TTC			**233,48**	**240,97**	**3,21%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

NOMMAY	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**209,10**	**215,38**	**3,00%**
Part délégataire			**141,97**	**139,10**	**-2,02%**
Consommation	120	1,1592	141,97	139,10	-2,02%
Part collectivité(s)			**67,13**	**76,28**	**13,63%**
Consommation	120	0,6357	67,13	76,28	13,63%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**210,30**	**219,06**	**4,17%**
TVA			21,03	21,91	4,18%
TOTAL € TTC			**231,33**	**240,97**	**4,17%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

PIERREFONTAINE LES BLAMONT	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**190,73**	**215,38**	**12,92%**
Part délégataire			**127,97**	**139,10**	**8,70%**
Consommation	120	1,1592	127,97	139,10	8,70%

Part collectivité(s)			**62,76**	**76,28**	**21,54%**
Consommation	120	0,6357	62,76	76,28	21,54%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**191,93**	**219,06**	**14,14%**
TVA			19,20	21,91	14,11%
TOTAL € TTC			**211,13**	**240,97**	**14,13%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

PONT DE ROIDE VERMONDANS	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**208,14**	**215,38**	**3,48%**
Part délégataire			**136,13**	**139,10**	**2,18%**
Consommation	120	1,1592	136,13	139,10	2,18%
Part collectivité(s)			**72,01**	**76,28**	**5,93%**
Consommation	120	0,6357	72,01	76,28	5,93%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**209,34**	**219,06**	**4,64%**
TVA			20,93	21,91	4,68%
TOTAL € TTC			**230,27**	**240,97**	**4,65%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

PRESENTEVILLERS	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**208,52**	**215,38**	**3,29%**
Part délégataire			**128,84**	**139,10**	**7,96%**
Consommation	120	1,1592	128,84	139,10	7,96%
Part collectivité(s)			**79,68**	**76,28**	**-4,27%**
Consommation	120	0,6357	79,68	76,28	-4,27%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**209,72**	**219,06**	**4,45%**
TVA			20,97	21,91	4,48%
TOTAL € TTC			**230,69**	**240,97**	**4,46%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

RAYNANS	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**208,52**	**215,38**	**3,29%**
Part délégataire			**128,84**	**139,10**	**7,96%**

Consommation	120	1,1592	128,84	139,10	7,96%
Part collectivité(s)			**79,68**	**76,28**	**-4,27%**
Consommation	120	0,6357	79,68	76,28	-4,27%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**209,72**	**219,06**	**4,45%**
TVA			20,97	21,91	4,48%
TOTAL € TTC			**230,69**	**240,97**	**4,46%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

REMONDANS VAIVRE	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**199,48**	**215,38**	**7,97%**
Part délégataire			**130,84**	**139,10**	**6,31%**
Consommation	120	1,1592	130,84	139,10	6,31%
Part collectivité(s)			**68,64**	**76,28**	**11,13%**
Consommation	120	0,6357	68,64	76,28	11,13%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**200,68**	**219,06**	**9,16%**
TVA			20,06	21,91	9,22%
TOTAL € TTC			**220,74**	**240,97**	**9,16%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

ROCHES LES BLAMONT	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**199,21**	**215,38**	**8,12%**
Part délégataire			**131,35**	**139,10**	**5,90%**
Consommation	120	1,1592	131,35	139,10	5,90%
Part collectivité(s)			**67,86**	**76,28**	**12,41%**
Consommation	120	0,6357	67,86	76,28	12,41%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**200,41**	**219,06**	**9,31%**
TVA			20,05	21,91	9,28%
TOTAL € TTC			**220,46**	**240,97**	**9,30%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

SAINT JULIEN LES MONTBELIARD	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**208,52**	**215,38**	**3,29%**

Part délégataire			**128,84**	**139,10**	**7,96%**
Consommation	120	1,1592	128,84	139,10	7,96%
Part collectivité(s)			**79,68**	**76,28**	**-4,27%**
Consommation	120	0,6357	79,68	76,28	-4,27%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**209,72**	**219,06**	**4,45%**
TVA			20,97	21,91	4,48%
TOTAL € TTC			**230,69**	**240,97**	**4,46%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

SAINT MAURICE COLOMBIER	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**207,42**	**215,38**	**3,84%**
Part délégataire			**135,74**	**139,10**	**2,48%**
Consommation	120	1,1592	135,74	139,10	2,48%
Part collectivité(s)			**71,68**	**76,28**	**6,42%**
Consommation	120	0,6357	71,68	76,28	6,42%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**208,62**	**219,06**	**5,00%**
TVA			20,86	21,91	5,03%
TOTAL € TTC			**229,48**	**240,97**	**5,01%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

SAINTE MARIE	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**208,52**	**215,38**	**3,29%**
Part délégataire			**128,84**	**139,10**	**7,96%**
Consommation	120	1,1592	128,84	139,10	7,96%
Part collectivité(s)			**79,68**	**76,28**	**-4,27%**
Consommation	120	0,6357	79,68	76,28	-4,27%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**209,72**	**219,06**	**4,45%**
TVA			20,97	21,91	4,48%
TOTAL € TTC			**230,69**	**240,97**	**4,46%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

SAINTE SUZANNE	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1

Collecte et dépollution des eaux usées *			**209,10**	**215,38**	**3,00%**
Part délégataire			**141,97**	**139,10**	**-2,02%**
Consommation	120	1,1592	141,97	139,10	-2,02%
Part collectivité(s)			**67,13**	**76,28**	**13,63%**
Consommation	120	0,6357	67,13	76,28	13,63%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**210,30**	**219,06**	**4,17%**
TVA			21,03	21,91	4,18%
TOTAL € TTC			**231,33**	**240,97**	**4,17%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

SELONCOURT	**m³**	**Prix au 01/01/2026**	**Montant au 01/01/2025**	**Montant au 01/01/2026**	**N/N-1**
Collecte et dépollution des eaux usées *			**209,10**	**215,38**	**3,00%**
Part délégataire			**141,97**	**139,10**	**-2,02%**
Consommation	120	1,1592	141,97	139,10	-2,02%
Part collectivité(s)			**67,13**	**76,28**	**13,63%**
Consommation	120	0,6357	67,13	76,28	13,63%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**210,30**	**219,06**	**4,17%**
TVA			21,03	21,91	4,18%
TOTAL € TTC			**231,33**	**240,97**	**4,17%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

SEMONDANS	**m³**	**Prix au 01/01/2026**	**Montant au 01/01/2025**	**Montant au 01/01/2026**	**N/N-1**
Collecte et dépollution des eaux usées *			**208,52**	**215,38**	**3,29%**
Part délégataire			**128,84**	**139,10**	**7,96%**
Consommation	120	1,1592	128,84	139,10	7,96%
Part collectivité(s)			**79,68**	**76,28**	**-4,27%**
Consommation	120	0,6357	79,68	76,28	-4,27%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**209,72**	**219,06**	**4,45%**
TVA			20,97	21,91	4,48%
TOTAL € TTC			**230,69**	**240,97**	**4,46%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

SOCHAUX	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**209,10**	**215,38**	**3,00%**
Part délégataire			**141,97**	**139,10**	**-2,02%**
Consommation	120	1,1592	141,97	139,10	-2,02%
Part collectivité(s)			**67,13**	**76,28**	**13,63%**
Consommation	120	0,6357	67,13	76,28	13,63%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**210,30**	**219,06**	**4,17%**
TVA			21,03	21,91	4,18%
TOTAL € TTC			**231,33**	**240,97**	**4,17%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

SOLEMONT	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**199,80**	**215,38**	**7,80%**
Part délégataire			**127,09**	**139,10**	**9,45%**
Consommation	120	1,1592	127,09	139,10	9,45%
Part collectivité(s)			**72,71**	**76,28**	**4,91%**
Consommation	120	0,6357	72,71	76,28	4,91%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**201,00**	**219,06**	**8,99%**
TVA			20,10	21,91	9,00%
TOTAL € TTC			**221,10**	**240,97**	**8,99%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

TAILLECOURT	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**209,10**	**215,38**	**3,00%**
Part délégataire			**141,97**	**139,10**	**-2,02%**
Consommation	120	1,1592	141,97	139,10	-2,02%
Part collectivité(s)			**67,13**	**76,28**	**13,63%**
Consommation	120	0,6357	67,13	76,28	13,63%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**210,30**	**219,06**	**4,17%**
TVA			21,03	21,91	4,18%
TOTAL € TTC			**231,33**	**240,97**	**4,17%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

VALENTIGNEY	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**209,10**	**215,38**	**3,00%**
Part délégataire			**141,97**	**139,10**	**-2,02%**
Consommation	120	1,1592	141,97	139,10	-2,02%
Part collectivité(s)			**67,13**	**76,28**	**13,63%**
Consommation	120	0,6357	67,13	76,28	13,63%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**210,30**	**219,06**	**4,17%**
TVA			21,03	21,91	4,18%
TOTAL € TTC			**231,33**	**240,97**	**4,17%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

VANDONCOURT	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**209,10**	**215,38**	**3,00%**
Part délégataire			**141,97**	**139,10**	**-2,02%**
Consommation	120	1,1592	141,97	139,10	-2,02%
Part collectivité(s)			**67,13**	**76,28**	**13,63%**
Consommation	120	0,6357	67,13	76,28	13,63%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**210,30**	**219,06**	**4,17%**
TVA			21,03	21,91	4,18%
TOTAL € TTC			**231,33**	**240,97**	**4,17%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

VIEUX CHARMONT	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**209,10**	**215,38**	**3,00%**
Part délégataire			**141,97**	**139,10**	**-2,02%**
Consommation	120	1,1592	141,97	139,10	-2,02%
Part collectivité(s)			**67,13**	**76,28**	**13,63%**
Consommation	120	0,6357	67,13	76,28	13,63%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**210,30**	**219,06**	**4,17%**
TVA			21,03	21,91	4,18%
TOTAL € TTC			**231,33**	**240,97**	**4,17%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

VILLARS LES BLAMONT	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**194,14**	**215,38**	**10,94%**
Part délégataire			**128,64**	**139,10**	**8,13%**
Consommation	120	1,1592	128,64	139,10	8,13%
Part collectivité(s)			**65,50**	**76,28**	**16,46%**
Consommation	120	0,6357	65,50	76,28	16,46%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**195,34**	**219,06**	**12,14%**
TVA			19,53	21,91	12,19%
TOTAL € TTC			**214,87**	**240,97**	**12,15%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

VILLARS SOUS DAMPJOUX	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**200,00**	**215,38**	**7,69%**
Part délégataire			**124,76**	**139,10**	**11,49%**
Consommation	120	1,1592	124,76	139,10	11,49%
Part collectivité(s)			**75,24**	**76,28**	**1,38%**
Consommation	120	0,6357	75,24	76,28	1,38%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**201,20**	**219,06**	**8,88%**
TVA			20,12	21,91	8,90%
TOTAL € TTC			**221,32**	**240,97**	**8,88%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

VILLARS SOUS ECOT	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**200,17**	**215,38**	**7,60%**
Part délégataire			**131,87**	**139,10**	**5,48%**
Consommation	120	1,1592	131,87	139,10	5,48%
Part collectivité(s)			**68,30**	**76,28**	**11,68%**
Consommation	120	0,6357	68,30	76,28	11,68%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**201,37**	**219,06**	**8,78%**
TVA			20,14	21,91	8,79%

TOTAL € TTC			**221,51**	**240,97**	**8,79%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

VOUJEAUCOURT	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Collecte et dépollution des eaux usées *			**209,10**	**215,38**	**3,00%**
Part délégataire			**141,97**	**139,10**	**-2,02%**
Consommation	120	1,1592	141,97	139,10	-2,02%
Part collectivité(s)			**67,13**	**76,28**	**13,63%**
Consommation	120	0,6357	67,13	76,28	13,63%
Organismes publics			**1,20**	**3,68**	**206,67%**
Performance des systèmes d'assainissement collectifs (agence de l'eau)	120	0,0307	1,20	3,68	206,67%
TOTAL € HT			**210,30**	**219,06**	**4,17%**
TVA			21,03	21,91	4,18%
TOTAL € TTC			**231,33**	**240,97**	**4,17%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

CONSOMMATEURS ET ASSIETTE DE LA REDEVANCE

	2021	2022	2023	2024	2025	N/N-1
Nombre d'abonnés (clients) desservis	**8 849**	**10 425**	**49 107**	**48 924**	**48 275**	**-1,3%**
Abonnés sur le périmètre du service	8 848	10 420	49 101	48 919	48 270	-1,3%
Autres services (réception d'effluent)	1	5	6	5	5	0,0%
Assiette de la redevance (m3)	**809 331**	**957 368**	**5 704 343**	**5 967 107**	**6 222 239**	**4,3%**
Effluent collecté sur le périmètre du service	784 386	921 820	5 597 457	5 870 709	6 122 711	4,3%
Autres services (réception d'effluent)	24 945	35 548	106 886	96 398	99 528	3,2%

	2021	2022	2023	2024	2025
Assiette de la redevance réception d'effluent autres services (m3)	**24 945**	**35 548**	**106 886**	**96 398**	**99 528**
Convention de déversement des effluents de la CCST (Feche l'Eglise) vers PMA			26 430	25 000	27 795
Convention de déversement des effluents de CC2VV (Desandans) vers PMA		14 556	34 935	34 000	33 932
Convention de déversement des effluents de Laire vers PMA		6 623	15 093	16 355	16 305
Convention de déversement des effluents de Le Vernoy vers PMA		2 124	4 929	5 439	5 868
Convention pour le déversement des effluents de la Commune d'Aibre			20 105	15 604	15 628

Les principaux indicateurs de la relation consommateurs

	2021	2022	2023	2024	2025	N/N-1
Nombre d'interventions avec déplacement chez le client	68	41	237	95	18	-81,1%
Nombre annuel de demandes d'abonnement	638	668	3 016	2 663	2 991	12,3%
Taux de mutation	7,3 %	6,5 %	6,3 %	5,6 %	6,3 %	12,5%

Données économiques

	2021	2022	2023	2024	2025
Taux d'impayés	**0,85 %**	**1,18 %**	**1,21 %**	**0,66 %**	**1,21 %**
Montant des impayés au 31/12/N en € TTC (sur factures N-1)	9 204	24 868	200 692	118 998	188 054
Montant facturé N - 1 en € TTC	1 083 212	2 107 812	16 579 472	17 931 010	15 588 675

	2021	2022	2023	2024	2025
Nombre de demandes d'abandon de créance à caractère social	12	11	13	0	13
Montant des abandons de créances ou des versements à un fonds de solidarité (€)	897,59	1 142,75	1 835,78	0,00	618,64
Assiette totale (m3)	809 331	957 368	5 704 343	5 967 107	6 222 239

	2021	2022	2023	2024	2025
Nombre d'échéanciers de paiements ouverts au cours de l'année	127	146	856	919	2 056
Nombre de dossiers de dégrèvements acceptés	33	17	47	19	59

	2021	2022	2023	2024	2025	N/N-1
ABBEVILLERS						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	1 070	1 079	1 088	1 111	1 119	0,7%
Nombre d'abonnés (clients) desservis	440	452	464	466	463	-0,6%
Assiette de la redevance (m3)	40 590	41 723	34 375	63 566	40 814	-35,8%
ALLENJOIE						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	0	0	757	756	753	-0,4%
Nombre d'abonnés (clients) desservis			339	333	330	-0,9%
Assiette de la redevance (m3)			26 231	23 007	26 682	16,0%

ALLONDANS						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	0	263	260	251	243	-3,2%
Nombre d'abonnés (clients) desservis		109	116	115	118	2,6%
Assiette de la redevance (m3)		8 677	7 335	10 731	10 814	0,8%
ARBOUANS						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)			911	909	901	-0,9%
Nombre d'abonnés (clients) desservis			391	395	383	-3,0%
Assiette de la redevance (m3)			36 368	39 082	63 028	61,3%
AUDINCOURT						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	0	0	13 763	14 179	14 251	0,5%
Nombre d'abonnés (clients) desservis			4 418	4 365	4 411	1,1%
Assiette de la redevance (m3)			604 056	589 947	626 912	6,3%
AUTECHAUX ROIDE						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	521	528	526	513	503	-1,9%
Nombre d'abonnés (clients) desservis	230	231	267	261	251	-3,8%
Assiette de la redevance (m3)	19 752	24 227	19 307	19 414	50 535	160,3%
BADEVEL						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	0	0	821	816	823	0,9%
Nombre d'abonnés (clients) desservis			362	358	344	-3,9%
Assiette de la redevance (m3)			25 433	29 579	33 852	14,4%
BART						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	0	0	2 059	2 069	2 073	0,2%
Nombre d'abonnés (clients) desservis			832	833	827	-0,7%
Assiette de la redevance (m3)			74 078	81 392	78 536	-3,5%
BAVANS						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	0	0	3 678	3 655	3 634	-0,6%
Nombre d'abonnés (clients) desservis			1 545	1 529	1 528	-0,1%
Assiette de la redevance (m3)			148 478	125 150	155 278	24,1%
BERCHE						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	523	537	553	554	557	0,5%
Nombre d'abonnés (clients) desservis	224	222	227	228	224	-1,8%
Assiette de la redevance (m3)	19 711	19 362	24 233	17 674	18 067	2,2%
BETHONCOURT						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	0	0	5 404	5 384	5 363	-0,4%
Nombre d'abonnés (clients) desservis			1 446	1 443	1 391	-3,6%
Assiette de la redevance (m3)			188 677	220 606	228 382	3,5%
BEUTAL						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	275	275	273	273	275	0,7%
Nombre d'abonnés (clients) desservis	126	124	136	135	131	-3,0%
Assiette de la redevance (m3)	9 999	9 984	9 746	8 688	10 589	21,9%
BLAMONT						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	1 241	1 236	1 236	1 250	1 263	1,0%

Nombre d'abonnés (clients) desservis	465	490	488	484	503	3,9%
Assiette de la redevance (m3)	46 407	52 113	54 068	81 808	51 808	-36,7%
BONDEVAL						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	489	486	481	483	485	0,4%
Nombre d'abonnés (clients) desservis	205	207	214	213	212	-0,5%
Assiette de la redevance (m3)	19 003	15 562	17 892	15 308	18 453	20,5%
BOURGUIGNON						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	928	917	911	900	894	-0,7%
Nombre d'abonnés (clients) desservis	328	328	397	405	333	-17,8%
Assiette de la redevance (m3)	22 858	26 106	24 915	27 513	27 884	1,3%
BRETIGNEY						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	74	76	76	76	76	0,0%
Nombre d'abonnés (clients) desservis	36	36		38	36	-5,3%
Assiette de la redevance (m3)	2 387	2 456	2 337	2 329	2 238	-3,9%
BROGNARD						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	0	0	490	487	488	0,2%
Nombre d'abonnés (clients) desservis			252	254	245	-3,5%
Assiette de la redevance (m3)			48 783	45 069	42 705	-5,2%
COLOMBIER FONTAINE						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	1 257	1 244	1 228	1 218	1 234	1,3%
Nombre d'abonnés (clients) desservis	538	546	590	576	569	-1,2%
Assiette de la redevance (m3)	37 199	49 057	55 350	49 246	54 998	11,7%
COURCELLES LES MONTBELIARD						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	0	0	1 430	1 448	1 411	-2,6%
Nombre d'abonnés (clients) desservis			544	537	531	-1,1%
Assiette de la redevance (m3)			42 010	39 624	57 561	45,3%
DAMBELIN						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	507	508	508	507	521	2,8%
Nombre d'abonnés (clients) desservis	254	260	276	276	259	-6,2%
Assiette de la redevance (m3)	17 942	18 200	18 104	26 945	18 981	-29,6%
DAMBENOIS						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	0	0	773	762	751	-1,4%
Nombre d'abonnés (clients) desservis			319	314	329	4,8%
Assiette de la redevance (m3)			25 062	26 854	30 990	15,4%
DAMPIERRE LES BOIS						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	0	0	1 609	1 603	1 592	-0,7%
Nombre d'abonnés (clients) desservis			745	736	725	-1,5%
Assiette de la redevance (m3)			65 209	62 976	75 437	19,8%
DAMPIERRE SUR LE DOUBS						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	464	462	460	463	460	-0,6%
Nombre d'abonnés (clients) desservis	213	218	224	221	223	0,9%
Assiette de la redevance (m3)	17 833	30 775	22 889	15 599	13 516	-13,4%

DAMPJOUX						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)				168	165	-1,8%
Nombre d'abonnés (clients) desservis					73	
Assiette de la redevance (m3)					10 831	
DASLE						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	0	0	1 406	1 405	1 396	-0,6%
Nombre d'abonnés (clients) desservis			642	638	608	-4,7%
Assiette de la redevance (m3)			53 686	48 274	60 739	25,8%
DUNG						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	0	641	637	629	632	0,5%
Nombre d'abonnés (clients) desservis		290	298	293	293	0,0%
Assiette de la redevance (m3)		24 475	22 703	25 860	28 314	9,5%
ECHENANS						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	0	163	165	167	167	0,0%
Nombre d'abonnés (clients) desservis		67	76	75	71	-5,3%
Assiette de la redevance (m3)		6 429	7 589	5 143	8 164	58,7%
ECOT						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	507	501	499	501	507	1,2%
Nombre d'abonnés (clients) desservis	211	218	241	241	227	-5,8%
Assiette de la redevance (m3)	22 011	13 303	21 359	17 111	16 633	-2,8%
ECURCEY						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	275	275	273	272	272	0,0%
Nombre d'abonnés (clients) desservis	80	78	80	81	80	-1,2%
Assiette de la redevance (m3)	6 611	6 287	4 642	11 279	6 500	-42,4%
ETOUVANS						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	841	848	844	839	835	-0,5%
Nombre d'abonnés (clients) desservis	378	379	389	392	387	-1,3%
Assiette de la redevance (m3)	34 043	24 294	26 683	27 631	28 741	4,0%
ETUPES						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	0	0	3 784	3 782	3 778	-0,1%
Nombre d'abonnés (clients) desservis			1 455	1 449	1 445	-0,3%
Assiette de la redevance (m3)			165 935	186 972	187 944	0,5%
EXINCOURT						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	0	0	3 299	3 303	3 331	0,8%
Nombre d'abonnés (clients) desservis			1 484	1 478	1 460	-1,2%
Assiette de la redevance (m3)			137 490	147 514	173 272	17,5%
FESCHES LE CHATEL						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	0	0	2 197	2 205	2 188	-0,8%
Nombre d'abonnés (clients) desservis			952	954	937	-1,8%
Assiette de la redevance (m3)			77 537	78 612	92 959	18,3%
FEULE						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	178	178	183	187	191	2,1%

Nombre d'abonnés (clients) desservis	71	70	88	86	80	-7,0%
Assiette de la redevance (m3)	6 106	4 530	8 101	125	7 230	5 684,0%
GLAY						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	342	341	342	339	340	0,3%
Nombre d'abonnés (clients) desservis	154	157	156	161	165	2,5%
Assiette de la redevance (m3)	12 042	11 685	8 396	18 934	8 987	-52,5%
GOUX LES DAMBELIN						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	282	282	282	279	276	-1,1%
Nombre d'abonnés (clients) desservis	117	118	137	138	118	-14,5%
Assiette de la redevance (m3)	7 372	8 513	8 271	7 714	9 357	21,3%
GRAND CHARMONT						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	0	0	5 922	5 932	5 939	0,1%
Nombre d'abonnés (clients) desservis			1 668	1 669	1 658	-0,7%
Assiette de la redevance (m3)			217 691	226 223	222 106	-1,8%
HERIMONCOURT						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	0	0	3 672	3 632	3 582	-1,4%
Nombre d'abonnés (clients) desservis			1 355	1 342	1 323	-1,4%
Assiette de la redevance (m3)			129 038	122 490	136 495	11,4%
ISSANS						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	0	247	242	243	244	0,4%
Nombre d'abonnés (clients) desservis		130	138	137	133	-2,9%
Assiette de la redevance (m3)		9 125	8 917	10 148	9 895	-2,5%
LONGEVELLE SUR DOUBS						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	689	684	679	676	672	-0,6%
Nombre d'abonnés (clients) desservis	308	304	325	326	302	-7,4%
Assiette de la redevance (m3)	23 675	22 476	21 258	21 677	22 457	3,6%
LOUGRES						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	772	758	752	751	749	-0,3%
Nombre d'abonnés (clients) desservis	343	351	380	375	360	-4,0%
Assiette de la redevance (m3)	21 366	24 998	21 566	25 760	28 941	12,3%
MANDEURE						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	0	0	4 945	4 880	4 814	-1,4%
Nombre d'abonnés (clients) desservis			1 773	1 757	1 716	-2,3%
Assiette de la redevance (m3)			182 987	150 938	184 001	21,9%
MATHAY						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	0	0	2 189	2 186	2 178	-0,4%
Nombre d'abonnés (clients) desservis			986	983	836	-15,0%
Assiette de la redevance (m3)			62 279	62 954	76 127	20,9%
MESLIERES						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	359	354	350	346	341	-1,4%
Nombre d'abonnés (clients) desservis	115	120	119	116	124	6,9%
Assiette de la redevance (m3)	8 872	9 075	5 836	15 913	5 224	-67,2%

MONTBELIARD						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	0	0	26 269	26 098	25 999	-0,4%
Nombre d'abonnés (clients) desservis			5 233	5 234	5 156	-1,5%
Assiette de la redevance (m3)			1 084 308	1 269 285	1 195 718	-5,8%
MONTENOIS						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	1 533	1 515	1 502	1 472	1 440	-2,2%
Nombre d'abonnés (clients) desservis	623	623	664	659	654	-0,8%
Assiette de la redevance (m3)	42 578	50 465	45 216	53 035	52 532	-0,9%
NEUCHATEL URTIERE						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	191	182	174	172	170	-1,2%
Nombre d'abonnés (clients) desservis	71	71	75	75	73	-2,7%
Assiette de la redevance (m3)	5 625	5 500	5 322	5 569	5 951	6,9%
NOIREFONTAINE						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	346	341	337	332	331	-0,3%
Nombre d'abonnés (clients) desservis	148	151	165	164	149	-9,1%
Assiette de la redevance (m3)	10 359	11 730	11 111	11 892	11 309	-4,9%
NOMMAY						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	0	0	1 649	1 641	1 637	-0,2%
Nombre d'abonnés (clients) desservis			730	730	726	-0,5%
Assiette de la redevance (m3)			55 550	51 786	64 260	24,1%
PIERREFONTAINE LES BLAMONT						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	481	482	482	487	490	0,6%
Nombre d'abonnés (clients) desservis	180	177	175	175	180	2,9%
Assiette de la redevance (m3)	15 264	15 577	12 677	23 320	15 424	-33,9%
PONT DE ROIDE VERMONDANS						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	4 230	4 198	4 162	4 087	4 027	-1,5%
Nombre d'abonnés (clients) desservis	1 624	1 623	1 666	1 658	1 633	-1,5%
Assiette de la redevance (m3)	206 123	191 681	183 375	207 780	174 415	-16,1%
PRESENTEVILLERS						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	0	470	476	492	482	-2,0%
Nombre d'abonnés (clients) desservis		224	232	230	232	0,9%
Assiette de la redevance (m3)		17 141	16 916	17 056	20 533	20,4%
RAYNANS						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	0	339	345	343	342	-0,3%
Nombre d'abonnés (clients) desservis		138	142	144	140	-2,8%
Assiette de la redevance (m3)		14 683	12 794	14 058	14 850	5,6%
REMONDANS VAIVRE						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	238	237	229	220	211	-4,1%
Nombre d'abonnés (clients) desservis	98	102	107	105	106	1,0%
Assiette de la redevance (m3)	8 678	9 803	10 399	8 938	8 358	-6,5%
ROCHES LES BLAMONT						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	639	631	630	630	626	-0,6%

Nombre d'abonnés (clients) desservis	281	283	280	282	290	2,8%
Assiette de la redevance (m3)	23 643	24 309	24 828	34 643	23 038	-33,5%
SAINT JULIEN LES MONTBELIARD						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	0	168	164	166	165	-0,6%
Nombre d'abonnés (clients) desservis		81	88	88	81	-8,0%
Assiette de la redevance (m3)		6 588	5 353	7 567	5 893	-22,1%
SAINT MAURICE COLOMBIER						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	933	929	928	929	912	-1,8%
Nombre d'abonnés (clients) desservis	375	376	406	405	394	-2,7%
Assiette de la redevance (m3)	23 533	30 631	28 338	35 305	29 519	-16,4%
SAINTE MARIE						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	0	695	687	678	669	-1,3%
Nombre d'abonnés (clients) desservis		322	349	345	325	-5,8%
Assiette de la redevance (m3)		22 572	20 278	24 336	24 919	2,4%
SAINTE SUZANNE						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	0	0	1 488	1 461	1 486	1,7%
Nombre d'abonnés (clients) desservis			622	616	611	-0,8%
Assiette de la redevance (m3)			61 221	62 940	60 693	-3,6%
SELONCOURT						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	0	0	5 894	5 922	5 953	0,5%
Nombre d'abonnés (clients) desservis			2 409	2 398	2 428	1,3%
Assiette de la redevance (m3)			228 037	305 907	297 205	-2,8%
SEMONDANS						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	0	313	315	318	322	1,3%
Nombre d'abonnés (clients) desservis		133	138	140	139	-0,7%
Assiette de la redevance (m3)		10 811	9 137	11 496	10 566	-8,1%
SOCHAUX						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	0	0	3 862	3 839	3 813	-0,7%
Nombre d'abonnés (clients) desservis			811	804	770	-4,2%
Assiette de la redevance (m3)			207 324	178 777	199 286	11,5%
SOLEMONT						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	149	146	144	140	134	-4,3%
Nombre d'abonnés (clients) desservis	74	74	80	79	75	-5,1%
Assiette de la redevance (m3)	5 546	5 578	5 140	4 534	5 007	10,4%
TAILLECOURT						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	0	0	1 129	1 148	1 160	1,0%
Nombre d'abonnés (clients) desservis			538	541	537	-0,7%
Assiette de la redevance (m3)			40 479	53 721	46 425	-13,6%
VALENTIGNEY						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	0	0	11 065	10 956	10 801	-1,4%
Nombre d'abonnés (clients) desservis			3 487	3 476	3 467	-0,3%
Assiette de la redevance (m3)			419 336	348 869	436 136	25,0%

VANDONCOURT						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	0	0	840	848	842	-0,7%
Nombre d'abonnés (clients) desservis			362	355	353	-0,6%
Assiette de la redevance (m3)			30 465	27 977	28 394	1,5%
VIEUX CHARMONT						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	0	0	2 904	2 923	2 867	-1,9%
Nombre d'abonnés (clients) desservis			1 035	1 045	1 039	-0,6%
Assiette de la redevance (m3)			100 644	97 259	108 914	12,0%
VILLARS LES BLAMONT						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	449	447	458	466	475	1,9%
Nombre d'abonnés (clients) desservis	209	215	219	218	231	6,0%
Assiette de la redevance (m3)	18 589	16 326	14 099	26 824	16 696	-37,8%
VILLARS SOUS DAMPJOUX						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	360	359	357	358	360	0,6%
Nombre d'abonnés (clients) desservis	159	156	166	166	166	0,0%
Assiette de la redevance (m3)	13 763	13 475	12 920	13 355	14 298	7,1%
VILLARS SOUS ECOT						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	358	355	353	353	345	-2,3%
Nombre d'abonnés (clients) desservis	170	166	178	177	170	-4,0%
Assiette de la redevance (m3)	14 906	11 518	12 791	14 081	12 722	-9,7%
VOUJEAUCOURT						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	0	0	3 190	3 195	3 218	0,7%
Nombre d'abonnés (clients) desservis			1 410	1 404	1 383	-1,5%
Assiette de la redevance (m3)			172 499	127 020	176 673	39,1%

Autechaux Roide : Le volume de l’assiette de la redevance pour l’année 2025 comprend une erreur de saisie des volumes facturés à Zurfluh Feller d'environ 25 000 m3. Ce qui explique l’augmentation de 160 % par rapport à 2024.

Feule : Le volume de l’assiette de la redevance pour l’année 2024 comprend une erreur de saisie. La bonne valeur était 5 108 m3 au lieu de 126 m3.

6. ANNEXES

6.1. ENGAGEMENTS À INCIDENCE FINANCIÈRE

Ce chapitre a pour objectif de présenter les engagements liés à l'exécution du service public et qui, à ce titre, peuvent entraîner des obligations financières entre Veolia, actuel délégataire de service, et toute entité (publique ou privée) qui pourrait être amenée à reprendre à l'issue du contrat l'exécution du service. Ce chapitre constitue pour les élus un élément de transparence et de prévision.
Conformément aux préconisations de l'Ordre des Experts Comptables, ce chapitre ne présente que les « engagements significatifs, sortant de l'ordinaire, nécessaires à la continuité du service, existant à la fin de la période objet du rapport, et qui à la fois devraient se continuer au-delà du terme normal de la convention de délégation et être repris par l'exploitant futur ».
Afin de rester simples, les informations fournies ont une nature qualitative. A la demande de la collectivité, et en particulier avant la fin du contrat, Veolia pourra détailler ces éléments.

6.1.1. FLUX FINANCIERS DE FIN DE CONTRAT

Les flux financiers de fin de contrat doivent être anticipés dans les charges qui s'appliqueront immédiatement à tout nouvel exploitant du service. Sur la base de ces informations, il est de la responsabilité de la collectivité, en qualité d'entité organisatrice du service, d'assurer la bonne prise en compte de ces contraintes dans son cahier des charges.

RÉGULARISATIONS DE TVA

Si Veolia a assuré pour le compte de la collectivité la récupération de la TVA au titre des immobilisations (investissements) mises à disposition[1], deux cas se présentent :
Le nouvel exploitant est assujetti à la TVA[2] : aucun flux financier n'est nécessaire. Une simple déclaration des montants des immobilisations, dont la mise à disposition est transférée, doit être adressée aux Services de l'Etat.
Le nouvel exploitant n'est pas assujetti à la TVA : l'administration fiscale peut être amenée à réclamer à Veolia la part de TVA non amortie sur les immobilisations transférées. Dans ce cas, le repreneur doit s'acquitter auprès de Veolia du montant dû à l'administration fiscale pour les immobilisations transférées, et simultanément faire valoir ses droits auprès du Fonds de Compensation de la TVA. Le cahier des charges doit donc imposer au nouvel exploitant de disposer des sommes nécessaires à ce remboursement.

BIENS DE RETOUR

Les biens de retour (listés dans l'inventaire détaillé des biens du service) sont remis gratuitement à la collectivité à l'échéance du contrat selon les modalités prévues au contrat.

BIENS DE REPRISE

Les biens de reprise (listés dans l'inventaire détaillé des biens du service) seront remis au nouvel exploitant, si celui-ci le souhaite, à l'échéance du contrat selon les modalités prévues au contrat. Ces biens doivent généralement être achetés par le nouvel exploitant.

[1] art. 210 de l'annexe II du Code Général des Impôts

[2] Conformément au principe posé par le nouvel article 257 bis du Code Général des Impôts précisé par l'instruction 3 A 6 36 parue au BOI N°50 du 20 Mars 2006 repris dans le BOFiP (BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-10)

Autres biens ou prestations

Hormis les biens de retour et les biens de reprise prévus au contrat, Veolia utilise, dans le cadre de sa liberté de gestion, certains biens et prestations. Le cas échéant, sur demande de la collectivité et selon des conditions à déterminer, les parties pourront convenir de leur mise à disposition auprès du nouvel exploitant.

Consommations non facturées et recouvrement des sommes dues au délégataire à la fin du contrat

Les sommes correspondantes au service exécuté jusqu'à la fin du contrat sont dues au délégataire sortant. La continuité de service est à privilégier (maintien des calendriers de facturation ou de mensualisation jusqu'à l'échéance du contrat). Il y a donc lieu de définir avec la collectivité les modalités de facturation et de recouvrement des sommes dues ainsi que les modalités de reversement des encaissements qui s'imposeront le cas échéant au nouvel exploitant : part ancien contrat en prorata temporis, reprise des soldes de mensualisation des comptes clients. L'introduction de relevés spécifiques, notamment si le contrat se termine après une facturation d'acompte, peut être une option à considérer.

6.1.2. Dispositions applicables au personnel

Les dispositions applicables au personnel du délégataire sortant s'apprécient dans le contexte de la période de fin de contrat. Les engagements qui en découlent pour le nouvel exploitant ne peuvent pas faire ici l'objet d'une présentation totalement exhaustive, pour deux motifs principaux :

- ils évoluent au fil du temps, au gré des évolutions de carrière, des aléas de la vie privée des agents et des choix d'organisation du délégataire ;
- ils sont soumis à des impératifs de protection des données personnelles.

Veolia propose de rencontrer la collectivité sur ce sujet pour inventorier les contraintes qui s'appliqueront en fin de contrat.

Dispositions conventionnelles applicables aux salariés de Veolia

Les salariés de Veolia bénéficient :

- des dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises des Services d'Eau et d'Assainissement du 12 avril 2000 ;
- des dispositions de l'accord interentreprises de l'Unité Economique et Sociale " Veolia - Générale des Eaux " du 12 novembre 2008 qui a pris effet au 1er janvier 2009, d'accords conclus dans le cadre de cette Unité Economique et Sociale et qui concernent notamment : l'intéressement et la participation, le temps de travail des cadres, la protection sociale (retraite, prévoyance, handicap, formation) et d'accords d'établissement, usages et engagements unilatéraux.

Protection des salariés et de l'emploi en fin de contrat

Des dispositions légales assurent la protection de l'emploi et des salariés à l'occasion de la fin d'un contrat, lorsque le service est susceptible de changer d'exploitant, que le futur exploitant ait un statut public ou privé. A défaut, il est de la responsabilité de la collectivité de prévoir les mesures appropriées.
Lorsque l'entité sortante constitue une entité économique autonome, c'est-à-dire comprend des moyens corporels (matériel, outillage, marchandises, bâtiments, ateliers, terrains, équipements), des éléments incorporels (clientèle, droit au bail, etc.) et du personnel affecté, le tout organisé pour une mission identifiée,

l'ensemble des salariés qui y sont affectés sont automatiquement transférés au nouvel exploitant, qu'il soit public ou privé (art. L 1224-1 du Code du Travail).

Dans cette hypothèse, Veolia transmettra à la collectivité, à la fin du contrat, la liste des salariés affectés au contrat ainsi que les éléments d'information les concernant (en particulier la masse salariale correspondante).
Le statut applicable à ces salariés au moment du transfert et pendant les trois mois suivants est celui en vigueur chez Veolia. Au-delà de ces trois mois, le statut Veolia est soit maintenu pendant une période de douze mois maximums, avec maintien des avantages individuels acquis au-delà de ces douze mois, soit aménagé au statut du nouvel exploitant.

Lorsque l'entité sortante ne constitue pas une entité économique autonome mais que le nouvel exploitant entre dans le champ d'application de la Convention collective Nationale des entreprises d'eau et d'assainissement d'avril 2000, l'application des articles 2.5.2 ou 2.5.4 de cette Convention s'impose tant au précédent délégataire qu'au nouvel exploitant avant la fin de la période de 12 mois.

A défaut d'application des dispositions précitées, seule la collectivité peut prévoir les modalités permettant la sauvegarde des emplois correspondant au service concerné par le contrat de délégation qui s'achève. Veolia se tient à la disposition de la collectivité pour fournir en amont les informations nécessaires à l'anticipation de cette question.

En tout état de cause, d'un point de vue général, afin de clarifier les dispositions applicables et de protéger l'emploi, nous proposons de préciser avec la collectivité avant la fin du contrat, le cadre dans lequel sera géré le statut des salariés et la protection de l'emploi à la fin du contrat. Il est utile que ce cadre soit précisé dans le cahier des charges du nouvel exploitant.

La liste nominative des agents[3] affectés au contrat peut varier en cours de contrat, par l'effet normal de la vie dans l'entreprise : mutations, départs et embauches, changements d'organisation, mais aussi par suite d'événements de la vie personnelle des salariés. Ainsi, la liste nominative définitive ne pourra être constituée qu'au cours des dernières semaines d'exécution du contrat.

COMPTES ENTRE EMPLOYEURS SUCCESSIFS

Les dispositions à prendre entre employeurs successifs concernant le personnel transféré sont les suivantes :

- de manière générale, dispositions identiques à celles appliquées en début du contrat ;
- concernant les salaires et notamment les salaires différés : chaque employeur supporte les charges afférentes aux salaires (et les charges sociales ou fiscales directes ou indirectes y afférant) rattachables à la période effective d'activité dont il a bénéficié ; le calcul est fait sur la base du salaire de référence ayant déterminé le montant de la charge mais plafonné à celui applicable au jour de transfert : ce compte déterminera notamment les prorata 13ème mois, de primes annuelles, de congés payés, décomptes des heures supplémentaires ou repos compensateurs, …. ;
- concernant les autres rémunérations : pas de comptes à établir au titre des rémunérations différées dont les droits ne sont exigibles qu'en cas de survenance d'un événement ultérieur non encore intervenu : indemnité de départ à la retraite, droits à des retraites d'entreprises à prestations définies, médailles du travail, etc.

[3] Certaines informations utiles ont un caractère confidentiel et n'ont pas à figurer dans le rapport annuel qui est un document public. Elles pourront être fournies, dans le respect des droits des personnes intéressées, séparément à l'autorité délégante, sur sa demande justifiée par la préparation de la fin de contrat.

6.2. ANNEXES FINANCIÈRES

LES MODALITÉS D'ÉTABLISSEMENT DU CARE

Introduction générale

Les articles R 3131-2 à R 3131-4 du Code de la Commande Publique fournissent des précisions sur les données devant figurer dans le Rapport Annuel du Délégataire prévu à l'article L 3131-5 du même Code, et en particulier sur le Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation (CARE) de la délégation.

Le CARE établi au titre de 2025 respecte ces principes. La présente annexe fournit les informations relatives à ses modalités d'établissement.

Pour la réalisation de son activité, à savoir l'exécution du contrat de concession des Services Publics pour la gestion des services de l'eau potable et de l'assainissement sur le périmètre de la Communauté d'Agglomération « Pays de Montbéliard Agglomération », la Société des Eaux du Pays de Montbéliard dispose de moyens propres. Elle bénéficie par ailleurs de l'assistance de Veolia Eau au travers du GIE national au sein duquel Veolia Eau a mutualisé un certain nombre de compétences.

Cet accès aux différents services et prestations d'expertise et d'assistance générale de Veolia Eau s'exerce en particulier dans les domaines suivants :

- l'assistance dans la gestion des consommateurs,
- l'assistance technique à l'exploitation et dans la gestion de l'environnement informatique,
- l'assistance administrative portant sur les domaines de la finance et de la comptabilité, des ressources humaines, de la gestion juridique et contractuelle, ainsi que des achats et des approvisionnements,
- et les services d'assistance, de conseils et de contrôle fournis par le siège de Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux.

Le compte annuel de résultat de l'exploitation relatif à un contrat de délégation de service public, établi sous la responsabilité de la Société délégataire, regroupe l'ensemble des produits et des charges imputables à ce contrat, selon les règles exposées ci-dessous.

La présente annexe a pour objet de préciser les modalités de détermination de ces produits et de ces charges.

Faits Marquants

A l'écoute de ses clients et des consommateurs, Veolia Eau est convaincu que si l'eau est au cœur des grands défis du 21ème siècle, il convient aussi d'être très attentif à la quête grandissante de transparence, de proximité, d'implication des collectivités ainsi qu'à la recherche constante d'efficacité et de qualité.
L'organisation de Veolia Eau selon une logique "gLocale" répond à ces enjeux. Elle permet à la fois de partager le meilleur de ce que peut apporter un grand groupe en matière de qualité, d'innovation, de solutions et d'investissements (« global »); mais aussi en s'appuyant sur 55 « Territoires », avec des moyens renforcés pour l'exploitation, toujours plus ancrés dans les territoires et avec un réel pouvoir de décision (« local »). 9 Régions viennent quant à elle assumer un rôle de coordination et de mutualisation au bénéfice des Territoires.

Les moyens du Groupe ont été alloués aux différents niveaux en fonction des missions qui leur sont confiées : coordination et mutualisation pour les Régions, proximité, opérations et développement pour les Territoires, exécution opérationnelle pour les Services Locaux.

La Société des Eaux du Pays de Montbéliard, tout en respectant les engagements contractuels qu'elle a pris concernant son organisation locale, bénéficie de sa proximité avec le Territoire Franche-Comté de la Région Est et du concours que ceux-ci peuvent lui apporter.

1. **Produits**

Les produits inscrits dans le compte annuel de résultat de l'exploitation regroupent l'ensemble des produits d'exploitation hors TVA comptabilisés en application du contrat, y compris ceux des travaux attribués à titre exclusif.

En ce qui concerne les activités de distribution d'eau et d'assainissement, ces produits se fondent sur les volumes distribués de l'exercice, valorisés en prix de vente. A la clôture de l'exercice, une estimation s'appuyant sur les données de gestion est réalisée et comptabilisée sur la part des produits non relevés et/ou non facturés à la fin du mois de Novembre. Les éventuels écarts avec les facturations sont comptabilisés dans les comptes de l'année suivante. Les dégrèvements (dont ceux consentis au titre de la loi dite « Warsmann » du 17 mai 2011 qui fait obligation à la Société d'accorder - dans certaines conditions - des dégrèvements aux usagers ayant enregistré des surconsommations d'eau et d'assainissement du fait de fuites sur leurs installations après compteur) sont quant à eux portés en minoration des produits d'exploitation de l'année où ils sont accordés.

S'agissant des produits des travaux attribués à titre exclusif, ils correspondent aux montants comptabilisés en application du principe de l'avancement.

Le détail des produits annexé au compte annuel du résultat de l'exploitation fournit une ventilation des produits entre les produits facturés au cours de l'exercice et ceux résultant de la variation de la part estimée des consommations.
Compte tenu de la réforme des redevances de l'agence de l'eau applicable au 1er janvier 2025, le détail produit de l'année 2025 présente une solution temporaire et transitoire pour présenter les années 2024 et 2025 non comparables entre elles suite à cette évolution. Ainsi, il a été retenu de ne pas faire évoluer le libellé du détail des produits et d'intégrer les nouvelles redevances dans les anciennes redevances utilisées antérieurement à 2025, à savoir :

- La nouvelle redevance consommation eau potable est comprise dans la redevance pollution qu'elle remplace
- Les nouvelles redevances performance des réseaux d'eau potable et des systèmes d'assainissement collectifs sont, elles, comprises dans la redevance modernisation réseau qui a disparu à la suite de cette réforme.

Ce détail produit sera donc complètement mis à jour avec ces nouvelles redevances en 2026, dès lors que le détail produit présentera deux années comparables en termes de redevance.

2. **Charges**

Les charges inscrites dans le compte annuel du résultat de l'exploitation englobent l'ensemble des charges imputables au contrat.

Le montant de ces charges résulte soit directement de dépenses inscrites en comptabilité soit de calculs à caractère économique (charges calculées § 2.2).

2.1 **Dépenses courantes d'exploitation**

Il s'agit des dépenses de personnel imputées directement, d'énergie électrique, d'achats d'eau, de produits de traitement, d'analyses, des redevances contractuelles et obligatoires, de la Contribution Foncière des Entreprises et de certains impôts locaux, etc.

En cours d'année, les imputations directes de dépenses de personnel opérationnel au contrat ou au chantier sont valorisées suivant un coût standard par catégorie d'agent qui intègre également une quote-part de frais « d'environnement » (véhicule, matériel et outillage, frais de déplacement, encadrement de proximité…). En fin d'année, l'écart entre le montant réel des dépenses engagées au niveau du Service Local dont dépendent les agents et le coût standard imputé fait l'objet d'une répartition au prorata des heures imputées sur les contrats du Service Local. Cet écart est ventilé selon sa nature sur trois rubriques des CARE (personnel, véhicules, autres charges).

2.2 **Charges calculées**

Un certain nombre de charges doivent faire l'objet d'un calcul économique. Les éléments correspondants résultent de l'application du principe selon lequel : "Pour que les calculs des coûts et des résultats fournissent des valeurs correctes du point de vue économique…, il peut être nécessaire en comptabilité analytique, de substituer à certaines charges enregistrées en comptabilité générale selon des critères fiscaux ou sociaux, les charges correspondantes calculées selon des critères techniques et économiques" (voir note 1 ci-après).

Ces charges concernent principalement les éléments suivants :

Charges relatives au renouvellement :
Les charges économiques calculées relatives au renouvellement sont présentées sous des rubriques distinctes en fonction des clauses contractuelles (y compris le cas échéant au sein d'un même contrat).

- Garantie pour continuité du service
Cette rubrique correspond à la situation dans laquelle le délégataire est tenu de prendre à sa charge et à ses risques et périls l'ensemble des dépenses d'entretien, de réparation et de renouvellement des ouvrages nécessaires à la continuité du service. Le délégataire se doit de les assurer à ses frais, sans que cela puisse donner lieu à ajustement (en plus ou en moins) de sa rémunération contractuelle.

La charge portée dans le CARE au titre d'une obligation contractuelle de type « garantie pour continuité de service » correspond aux travaux réalisés dans l'exercice.

- Fonds contractuel de renouvellement
Cette rubrique est renseignée lorsque la Société est contractuellement tenue de prélever tous les ans sur ses produits un certain montant et de le consacrer aux dépenses de renouvellement dans le cadre d'un suivi pluriannuel spécifique. Un décompte contractuel délimitant les obligations des deux parties est alors établi. C'est le montant correspondant à la définition contractuelle qui est repris dans cette rubrique.

Charges relatives aux investissements :
Les investissements financés par le délégataire sont pris en compte dans le compte annuel du résultat de l'exploitation, sous forme de redevances permettant d'étaler leur coût financier total :

- pour les biens appartenant au délégataire (biens propres et en particulier les compteurs du domaine privé) : sur leur durée de vie économique puisqu'ils restent lui appartenir indépendamment de l'existence du contrat ;
- pour les investissements contractuels (biens de retour) : sur la durée du contrat puisqu'ils ne servent au délégataire que pendant cette durée.

Le montant de ces redevances résulte d'un calcul actuariel permettant de reconstituer, sur ces durées et en euros constants, le montant de l'investissement initial.
S'agissant des compteurs, ce dernier comprend, depuis 2008, les frais de pose valorisés par l'application de critères opérationnels et qui ne sont donc en contrepartie plus compris dans les charges de l'exercice.

L'étalement de ce coût financier global obéit aux règles suivantes :

- pour les investissements antérieurs à 2021, les redevances évoquées ci-dessus respectent une progressivité prédéterminée et constante (+1,5% par an) d'une année sur l'autre de la redevance attachée à un investissement donné. Le taux financier retenu est calculé à partir du Taux Moyen des Emprunts d'Etat en vigueur l'année de réalisation de l'investissement, majoré d'une marge. Un calcul financier spécifique garantit la neutralité actuarielle de la progressivité de 1,5% indiquée ci-dessus ;

- pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021, ces redevances prennent la forme d'une annuité constante et non plus progressive. Le taux financier retenu est déterminé en tenant compte des conditions de financement de l'année en cours. Le taux annuel de financement est fixé à 2,25% pour les investissements réalisés en 2021, 3,90% pour l'année 2022, 5,35% pour l'année 2023 et 5,30% pour les investissements réalisés en 2024 et 5,65% pour l'année 2025.

Toutefois, par dérogation avec ce qui précède, et pour tous les contrats prenant effet à compter du 1er janvier 2015, la redevance peut reprendre le calcul arrêté entre les parties lors de la signature du contrat.

Enfin, et compte tenu de leur nature particulière, les biens immobiliers du domaine privé font l'objet d'un calcul spécifique comparable à l'approche retenue par les professionnels du secteur. Le montant de la redevance initiale attachée à un bien est pris égal à 7% du montant de l'investissement immobilier (terrain + constructions + agencements du domaine privé) puis est ajusté chaque année de l'évolution de l'indice du coût de la construction. Les agencements pris à bail donnent lieu à un calcul similaire.

- Investissements du domaine privé
Hormis le parc de compteurs relevant du domaine privé du délégataire (avec une redevance portée sur la ligne « Charges relatives aux compteurs du domaine privé ») et quelques cas où Veolia Eau ou ses filiales sont propriétaires d'ouvrages de production (avec une redevance alors portée sur la ligne « Charges relatives aux investissements du domaine privé »), les redevances attachées aux biens du domaine privé sont portées sur les lignes correspondant à leur affectation (la redevance d'un camion hydro cureur sera affectée sur la ligne « engins et véhicules », celle relative à un ordinateur à la ligne « informatique »…).

2.3 **Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement**

Cette rubrique reprend essentiellement les pertes sur les créances devenues définitivement irrécouvrables, comptabilisées au cours de l'exercice. Celles-ci peuvent être enregistrées plusieurs années après l'émission des factures correspondantes compte tenu des délais notamment administratifs nécessaires à leur constatation définitive. Elle ne traduit par conséquent qu'avec un décalage dans le temps l'évolution des difficultés liées au recouvrement des créances.

2.4 **Impôt sur les sociétés**

L'impôt calculé correspond à celui qui serait dû par une entité autonome, en appliquant au résultat brut bénéficiaire, le taux en vigueur de l'impôt sur les sociétés.

Dans un souci de simplification, le taux normatif retenu en 2025 correspond au taux normal de l'impôt sur les sociétés applicable aux entreprises soit 25%, hors contribution sociale additionnelle de 3,3%.

2.5 **Charges d'encadrement, de structure, d'assistance, de support, d'assistance des services centraux**

Comme rappelé en préambule de la présente annexe, la Société bénéficie du support de Veolia Eau au travers de services rendus par son GIE national.

Ainsi, dans le cadre d'un contrat d'assistance, Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux réalise les prestations suivantes au profit de la Société.

La Société bénéficie des services de Veolia Eau - Compagnie générale des Eaux pour la gestion des consommateurs à travers ses plateformes et le service clients local. La plateforme Produits & Cash a pour missions de facturer, encaisser, recouvrer et reverser les produits qui reviennent aux Collectivités, aux Agences de l'Eau et aux autres tiers. La plateforme Relation Client 360 est en charge de la relation client et sa digitalisation.

La Société bénéficie également des services de Veolia Eau - Compagnie générale des Eaux en matière d'assistance à l'exploitation du service public de l'eau potable. Cette assistance s'exerce en particulier dans les domaines de la conduite de l'exploitation et de l'amélioration de la performance, de la gestion de l'astreinte, des relations techniques avec les tiers parties prenantes, la veille et les expertises techniques, la gestion des crises et la mise en œuvre de la réglementation en matière de qualité, de sécurité et d'environnement. Le service de mise à disposition et de maintenance de l'environnement informatique de la Société intègre l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, ainsi que l'accès aux applicatifs, logiciels et progiciels métiers.

La société confie à Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux la réalisation de services et de prestations en matière d'assistance générale. Cette assistance s'exerce dans les domaines de la gestion comptable et financière, des ressources humaines, de la gestion juridique et contractuelle, ainsi que dans la gestion des achats et des approvisionnements.

Dans le cadre d'une convention spécifique relevant des prestations de frais de siège national, Veolia Eau appuie les actions de la Société des Eaux du Pays de Montbéliard en faisant jouer toutes les synergies de nature à renforcer son image, soutenir sa croissance et optimiser les services rendus à son client, capitaliser les expériences et les savoir-faire, mobiliser les compétences de ses collaborateurs et activer son développement. Les différentes missions effectuées par la société mère sont :

- l'assistance générale d'entreprise : notamment dans les relations avec les organisations professionnalles, syndicales, administratives et de normalisation, dans la coordination des réseaux d'experts au sein du Groupe Veolia, dans la fourniture d'outils d'audit pour soutenir les processus de gestion des risques, dans la fourniture de conseils d'expertise dans le domaine de la sécurité, dans la promotion des règles d'éthique et de conformité, et en matière de garantie de bonne exécution ;
- l'accès à la recherche & développement, notamment la veille technologique sur la thématique de l'eau et de la santé, la recherche de partenariats techniques innovants et la veille sur les innovations en matière de développement durable ;
- l'assistance en matière de gestion fiscale, financière et comptable, sociale, juridique et contractuelle, ainsi que la veille informatique.

Toujours dans le cadre de ce contrat et de cette convention spécifique, Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux en facture à la Société les coûts correspondants ; ces coûts font partie des charges de la Société et figurent dans la rubriques Contribution des services centraux et recherche du CARE.

2.6 **Autres charges**

2.6.1 **Valorisation des travaux réalisés dans le cadre d'un contrat de délégation de service public (DSP)**

Pour valoriser les travaux réalisés dans le cadre d'un contrat de DSP, une quote-part de frais de structure est calculée sur la dépense brute du chantier. Cette disposition est applicable à l'ensemble des catégories de travaux relatifs aux délégations de service public (production immobilisée, travaux exclusifs, travaux de renouvellement), hors frais de pose des compteurs. Par exception, la quote-part est réduite à la seule composante « frais généraux » si la prestation intellectuelle est comptabilisée séparément. De même, les taux forfaitaires de maîtrise d'œuvre et de gestion contractuelle des travaux ne sont pas automatiquement applicables aux opérations supérieures à 500 K€. Ces prestations peuvent alors faire l'objet d'un calcul spécifique.

L'objectif de cette approche est de prendre en compte les différentes prestations intellectuelles associées réalisées en interne (maîtrise d'œuvre en phase projet et en phase chantier, gestion contractuelle imposée par le contrat DSP : suivi des programmes pluriannuels, planification annuelle des chantiers, reporting contractuel et réglementaire, mises à jour des inventaires,...).

La quote-part de frais ainsi attribuée aux différents chantiers est portée en diminution des charges indirectes réparties selon les règles exposées au § 2.5 (de même que la quote-part « frais généraux » affectée aux chantiers hors DSP sur la base de leurs dépenses brutes ou encore que la quote-part de 5% appliquée aux achats d'eau en gros).

2.6.2 **Participation des salariés aux résultats de l'entreprise**

Les charges de personnel indiquées dans les comptes annuels de résultat de l'exploitation comprennent la participation des salariés acquittée par la Société en 2025 au titre de l'exercice 2024.

2.7 **Autres informations**

Au-delà des charges économiques calculées présentées ci-dessus et substituées aux charges enregistrées en comptabilité générale, la Société a privilégié, pour la présentation de ses comptes annuels de résultat de l'exploitation, une approche selon laquelle les risques liés à l'exploitation – et notamment les risques sur créances impayées mentionnées au paragraphe 2.3, qui donnent lieu à la constatation de provisions pour risques et charges ou pour dépréciation en comptabilité générale – sont pris en compte pour leur montant définitif au moment de leur concrétisation. Les dotations et reprises de provisions relatives à ces risques ou dépréciation en sont donc exclues (à l'exception des dotations et reprises pour investissements futurs évoquées ci-dessus).

Notes :

1. *Texte issu de l'ancien Plan Comptable Général de 1983, et dont la refonte opérée en 1999 ne traite plus des aspects relatifs à la comptabilité analytique.*

2. *C'est-à-dire les biens indispensables au fonctionnement du service public qui seront remis obligatoirement à la collectivité délégante, en fin de contrat.*

3. *L'obligation de renouvellement est valorisée dans la garantie lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:*
   - *le bien doit faire partie d'une famille technique dont le renouvellement incombe contractuellement au délégataire,*
   - *la date de renouvellement passée ou prévisionnelle entre dans l'horizon de la période contractuelle en cours.*

DÉTAIL DES BIENS RENOUVELÉS ET VALORISÉS DANS LE CADRE DU/DES COMPTE(S) DE RENOUVELLEMENT

AVIS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

La Société a demandé à l'un des Co-Commissaires aux Comptes de Veolia d'établir un avis sur la procédure d'établissement de ses CARE. Une copie de cet avis est disponible sur simple demande de la collectivité.

6.3. Détail des textes réglementaires

Chaque année, une sélection des textes réglementaires les plus marquants de l'année vous est proposée, accompagnée des impacts susceptibles d'être significatifs pour votre service.

L'année 2025 a été marquée par la publication de textes législatifs et réglementaires particulièrement structurants, à court et moyen termes, pour les services d'assainissement.

Vos interlocuteurs se tiennent à votre disposition pour répondre à vos différentes questions et échanger de manière approfondie sur leurs conséquences particulières pour votre service.

DES NOUVELLES ÉCHÉANCES STRUCTURANTES POUR LES SERVICES D'ASSAINISSEMENT

Les années 2026 et 2027 seront marquées par l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions réglementaires ou mises en œuvre qui sont autant de défis à relever pour les services d'assainissement.
Dans le cadre de la réforme des redevances des agences de l'eau, le décret no 2025-431 du 14 mai 2025 (JO du 17 mai 2025) rend obligatoire la saisie des données du RPQS dans le SISPEA (Observatoire National des Services d'Eau et d'Assainissement) pour l'ensemble des services, indépendamment du nombre d'habitants que ces services desservent.

Cartographie des réseaux

Depuis le 1er janvier 2026, dans le cadre de la réforme anti-endommagements (ou "DT-DICT"), les réseaux non-sensibles (cas général pour les réseaux d'eau) situés en unité urbaine relevés en classe de précision "B" ou "C" peuvent se voir imputer toute ou partie des charges liées :

- Aux investigations complémentaires menées durant la phase de préparation des chantiers ;
- Aux arrêts des chantiers dus à la découverte inopinée de canalisations cartographiées avec une précision insuffisante.

Dans la pratique opérationnelle, compte-tenu de la fréquence des chantiers et de la densité des réseaux, la cartographie en classe "A" de précision des réseaux est à privilégier. A défaut ces coûts sont susceptibles d'impacter significativement votre service

Pour mémoire, hors unité urbaine (au sens de l'INSEE), cette disposition s'appliquera à l'ensemble des réseaux au 1er janvier 2032.

Repérage de l'amiante avant travaux

L'arrêté du 4 juin 2024 (JO du 30 juin 2024) est venu préciser les modalités de réalisation du repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles autres que bâtis tels que les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport ou réseaux divers. Cet arrêté qui couvre les enrobés routiers et les réseaux **entrera pleinement en application le 1er juillet 2026** afin de permettre au préalable la mise en œuvre des formations des opérateurs en charge de réaliser ces opérations de repérage, selon la norme NF X 46-102 de novembre 2020.

Les dispositions de cet arrêté précisent que le donneur d'ordre des travaux est tenu d'adresser au propriétaire de l'ouvrage une copie du rapport de repérage afin que ce dernier puisse mettre à jour le dossier de traçabilité.

L'arrêté précise également les conditions d'exemption de ce repérage : situation d'urgence ou lorsque les informations provenant des documents de traçabilité sont antérieurement connues.

Ce texte parachève le corpus réglementaire lié au risque amiante également actualisé par différentes publications et recommandations. Nous attirons notamment votre attention sur une publication en 2024 par

l'INRS de mesures de l'empoussièrement en amiante généré par la technique d'hydrocurage. Il s'en est suivi de nouvelles préconisations de prévention qui impacteront les services d'assainissement.

PERFORMANCE DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT

Conformité des systèmes d'assainissement urbain

L'Instruction du Gouvernement du 4 juillet 2025 (BO du 18 juillet 2025) concerne la collecte et le traitement des eaux résiduaires urbaines. Cette instruction, à destination des préfets, s'appuie sur le constat que le taux de conformité réglementaire des systèmes d'assainissement ne cesse de diminuer depuis plus d'une dizaine d'années alors que la France a été condamnée en octobre 2024 par la Cour de justice européenne pour manquement dans la mise en œuvre de la directive eaux résiduaires urbaines de 1991 et que la transposition de cette même directive révisée est en cours.
L'instruction enjoint les préfets de mettre en œuvre tous les leviers d'action dont ils disposent pour un retour à la conformité dont la mise en demeure, l'astreinte journalière, la consignation des fonds, l'articulation avec une réponse pénale lors de non-respect des injonctions, le rejet de toute extension de l'urbanisme lorsque les systèmes d'assainissement ne répondent pas à la réglementation et le partage de l'amende en cas de condamnation européenne conformément à l'article 112 de la loi NOTRe de 2015.
Cette instruction demande aussi aux préfets que la mise aux normes des systèmes d'assainissement, lorsque nécessaire, s'inscrive dans la perspective de la nouvelle directive eaux résiduaires, en cours de transposition.

Réforme des redevances des agences de l'eau

La réforme des redevances des Agences de l'eau est entrée en vigueur au 1er janvier 2025.
Ainsi, deux composantes des redevances (sur trois) seront modulées au regard d'un certain nombre de critères de performance des services, à savoir :

- Pour les services d'eau : le niveau des pertes en eau et la gestion du patrimoine ;
- Pour les services d'assainissement : la conformité en équipement et en performance ainsi que l'effectivité de l'autosurveillance du système d'assainissement (réseau de collecte et stations d'épuration) et l'efficacité du système d'assainissement (selon la performance épuratoire, la bonne destination des boues, le réseau de collecte, …).

L'année 2026 marquera l'intégration dans le calcul de la redevance de l'efficacité de l'ensemble du système d'assainissement (collecte et traitement), à partir d'indicateurs de performance de l'année 2024.

RÉSILIENCE DES SERVICES ET CYBERSÉCURITÉ

En 2025, le projet de loi comprenant la transposition de deux directives européennes, à savoir, la directive européenne 2022/2557 du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques et la directive 2022/2555 du 14 décembre 2022 (dite NIS2 pour Network and Information Security) a poursuivi son parcours législatif. Ces deux directives modifient le champ des secteurs d'activité ou la taille des sites considérés comme entités critiques ou essentielles en y incluant notamment les services d'eau et d'assainissement.
D'autre part, un rapport de l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI), publié fin novembre 2024, a pointé les risques particuliers qui pèsent sur les acteurs de l'eau et de l'assainissement en France, en recensant au moins 31 "compromissions" dans ce secteur depuis 2021.
Cette loi toujours en cours d'adoption est donc susceptible d'impacts significatifs (financiers et/ou organisationnels) pour votre service.

RÉUTILISATION DES EAUX USÉES TRAITÉES : des possibilités d'usages élargies au bénéfice de la sobriété hydrique

Le Plan Eau présenté en mars 2023 comporte cinq mesures visant à faciliter le recours aux eaux non-conventionnelles (ENC - incluant les eaux usées traitées, mais également les eaux de pluie, les eaux grises, les eaux d'exhaure, etc.) et à contribuer ainsi aux économies de prélèvement d'eau sur un territoire. Ce

plan a pour objectif de développer 1000 projets opérationnels d'ici à 2027.
En 2025, trois textes réglementaires sont venus compléter ceux déjà publiés depuis 2023 et qui fixaient le cadre général du recours à ces Eaux Non Conventionnelles, à savoir :

- **Le décret 2025-239 et l'arrêté du 14 mars 2025** (JO du 15 mars 2025) ont précisé les conditions d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour certains usages domestiques, en remplacement de l'eau potable dans les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) et pour les installations nucléaires de base. Cette utilisation est autorisée lorsque la qualité des eaux n'a aucune influence, directe ou indirecte, sur la santé des usagers. L'arrêté du 14 mars 2025 détaille les utilisations d'eaux impropres à la consommation humaine (EICH) qui peuvent être librement mises en œuvre et celles dont les critères de qualité et les conditions techniques sont préalablement fixées. Il précise les critères de qualité et les conditions techniques à satisfaire pour utiliser ces eaux pour les usages domestiques mentionnés (lavage du linge, des sols intérieurs, évacuation des excréta, alimentation de fontaines décoratives, nettoyage des surfaces extérieures, arrosage des jardins potagers et des espaces verts).

- **L'arrêté du 8 septembre 2025** (JO du 5 octobre 2025) fixe les prescriptions applicables à l'utilisation d'eaux usées traitées pour les usages liés à la propreté urbaine : ces prescriptions visant à garantir la protection de la santé publique, humaine et animale, et de l'environnement. Les usages urbains concernés portent sur le nettoyage de voirie par balayeuses, le nettoyage sans lance d'aspersion des accotements des voiries (et des ouvrages d'art), le nettoyage de quais de déchèteries, l'hydrocurage de réseaux d'assainissement (et d'eaux pluviales), les opérations sur installations d'assainissement non collectif, le nettoyage de bennes à ordures. La démarche pour accéder à ces utilisations demeure inchangée et une demande d'autorisation adressée au préfet reste nécessaire. Des qualités d'eau à respecter sont définies pour certains usages (nettoyages voiries, accotements, ouvrages d'art). Pour d'autres usages, il n'y a pas de qualité spécifiée et les eaux usées traitées peuvent directement être utilisées sans traitement complémentaire en sortie de station d'épuration sous réserve toutefois que l'évaluation des risques requise dans le dossier de demande d'autorisation en démontre l'innocuité (hydrocurage, nettoyage des quais et bennes à ordures). Cet arrêté modifie également à la marge deux précédents arrêtés de décembre 2023 relatifs aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour l'arrosage d'espaces verts et aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation de cultures.

COMMANDE PUBLIQUE

Nouveaux seuils européens applicables au 1er janvier 2026

La Commission européenne a publié les nouveaux seuils de procédure formalisée qui prendront effet au 1er janvier 2026. Ces seuils connaissent une légère baisse par rapport à ceux appliqués depuis le 1er janvier 2024.
Comparatif des seuils (Montants HT)

Type de Marché	Seuils 2024	Nouveaux Seuils 2026
Marchés de travaux	5 538 000 €	5 404 000 €
Marchés de fournitures et services de l'État	143 000 €	140 000 €
Marchés de fournitures et services des autres pouvoirs	221 000 €	216 000 €

adjudicateurs		

Le seuil applicable aux concessions est le même que celui des marchés de travaux.

Modifications de certains seuils du code de la commande publique (CCP)

Le décret n° 2025-1386, paru au Journal Officiel le 30 décembre 2025, modifie les seuils de procédure et de publicité du Code de la commande publique (CCP). Ces changements impactent les seuils en dessous desquels les acheteurs publics peuvent passer des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables :

- Marchés de fournitures ou de services : Le seuil est relevé de 40 000 € à 60 000 € HT.
- Marchés de travaux : Le seuil est porté de 40 000 € à 100 000 € HT.

Ces ajustements prennent effet de manière échelonnée :

- Le seuil de 100 000 € pour les travaux s'applique dès le 1er janvier 2026.
- Le seuil de 60 000 € pour les fournitures et services s'applique à compter du 1er avril 2026.

Le relèvement des seuils vient consolider, notamment, le seuil de 100 000 € institué par la loi ASAP (2020) pour les marchés de travaux, assurant ainsi sa pérennité.
Il est important de noter que cette évolution des seuils nationaux doit être considérée en lien avec les seuils européens de procédure formalisée.

Simplification du code de la commande publique

Le code de la commande publique est également modifié par le décret n° 2025-1383 du 29 décembre 2025. Cette modification a notamment pour objectif de :

- Abaisser le plafond du chiffre d'affaires minimal exigible des entreprises candidates de deux fois à une fois et demie le montant du marché : cette mesure vise à éviter des seuils disproportionnés tout en sécurisant l'acheteur quant à la capacité financière des soumissionnaires.
- Autoriser les acheteurs à contracter directement avec le soumissionnaire arrivé en seconde position en cas d'incapacité de l'attributaire à exécuter le marché : ce nouvel article R. 2152-4-1 du CCP autorise l'acheteur à attribuer le marché au candidat classé second (ou suivants, si refus ou impossibilité avérée) en cas de défaillance du premier, évitant ainsi une reprise complète de la procédure (nouvelle publicité et mise en concurrence). Cet assouplissement procédural, qui doit intervenir avant la notification du marché et respecter strictement l'ordre de classement initial, maintient les principes de la commande publique.
- Clarifier les modalités de remboursement des avances (articles L. 2191-2 et R. 2191-3 et s. du CCP) pour sécuriser l'exécution financière des marchés. Il précise que l'appréciation de l'avancement pour le remboursement se fait uniquement sur les prestations du titulaire, sans tenir compte des co-traitants ou sous-traitants. Si l'avance est inférieure ou égale à 30 % du marché, le remboursement par précompte commence dès que les prestations du titulaire atteignent 65 % du montant TTC de sa part du marché.

AUTRES RÉGLEMENTATIONS PUBLIÉES EN 2025

Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025

La Loi de Finances pour 2025 apporte des clarifications sur certains aspects de la réforme des redevances des agences de l'eau, tout en rectifiant les inexactitudes de formulation qui avaient été identifiées.
Premièrement, elle clarifie les règles relatives à l'événement déclencheur et à la base de calcul de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique, due par les industriels non connectés au réseau public de collecte des eaux usées, conformément à l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement.
Deuxièmement, elle modifie le calcul des redevances liées à la performance des réseaux d'eau potable et des systèmes d'assainissement collectif, mentionnées aux articles L.213-10-5 et L.213-10-6 du même code. Ces aménagements visent à :

- Simplifier la détermination de leur assiette.

- Préciser la compétence des agences de l'eau lorsqu'un établissement public redevable couvre un périmètre relevant de plusieurs agences.
- Introduire un coefficient de modulation globale dans les cas où plusieurs entités gèrent un même réseau d'eau potable.

Enfin, elle établit le montant de l'indemnité forfaitaire destinée à couvrir les frais d'assiette et de recouvrement. Cette indemnité est versée à l'exploitant du service responsable de la facturation de l'eau potable, qui effectue à ce titre la déclaration et le paiement de la redevance. Cette indemnité étant indexée sur l'inflation, un arrêté du 24 décembre 2025 (JO du 31 décembre 2025) a relevé celle-ci à 0,31 € hors taxes par facture de fourniture d'eau potable, dans la limite de 0,92 € hors taxes par an et par abonné au service d'eau. Ce même arrêté a également revalorisé certaines redevances des agences de l'eau, notamment celles assises sur un paramètre indexé à l'inflation.

Décret n° 2025-66 du 24 janvier 2025 portant modification de dispositions relatives aux redevances des agences de l'eau

Le décret n°2024-787 introduit plusieurs ajustements réglementaires dans le code de l'environnement concernant la redevance pour la pollution de l'eau.

- Suivi des rejets : L'agrément de l'agence pour le dispositif de suivi régulier des rejets est désormais tacite (principe du "silence vaut accord").
- Redevance élevage : Le montant de la redevance élevage est triplé uniquement pour les redevables ayant fait l'objet d'une condamnation pénale dans le cadre d'une police administrative spéciale pour la protection des eaux. Les redevables ayant seulement fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction ne sont plus concernés. Chaque année civile, le préfet transmet à l'agence de l'eau la liste des éleveurs condamnés.
- La capacité nominale de traitement de la station d'épuration remplace la charge brute de pollution organique comme indicateur réglementaire (articles D.213-48-12-9 à D.213-48-12-12 et D.213-48-26-1), dans un objectif d'harmonisation.
- L'article R.213-48-39, relatif à la notification de la liste des personnes s'acquittant de la redevance pollution non domestique, est abrogé, car il est devenu obsolète suite à l'introduction des nouvelles redevances.

Décret n° 2025-431 du 14 mai 2025 : obligation de publication des données du RPQS

Le décret no 2025-431 du 14 mai 2025 (JO du 17 mai 2025) vient préciser deux dispositions d'application de l'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales relatif à la transmission des informations sur les services publics d'eau et d'assainissement dans le SISPEA et de l'article L. 1321-9 du code de la santé publique, à savoir :

- La transmission des données sur la qualité de l'eau. Ce faisant, le décret complète la transposition en droit français de la Directive européenne 2020/2184 (article 14 et annexe 4 de la directive) ;
- Dans le cadre de la "fiscalisation" des redevances des agences de l'eau, il rend obligatoire la saisie des données du RPQS dans le SISPEA pour l'ensemble des services d'eau et d'assainissement, indépendamment du nombre d'habitants que ces services desservent. Cette saisie dans le SISPEA doit survenir au plus tard dans les 15 jours après l'approbation du RPQS par l'assemblée délibérative de chaque service d'eau ou d'assainissement.

Assouplissement de la gestion des compétences eau et assainissement

La loi n° 2025-327 du 11 avril 2025 (JO du 12 avril 2025) abroge le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et d'agglomération. Ainsi les communes qui n'ont pas encore transféré les compétences "eau" et "assainissement" à leur communauté de communes à la date d'entrée en vigueur de la loi ne seront plus obligées de procéder à ce transfert au 1er janvier 2026 (article 2). Toutefois, il n'y aura pas de retour en arrière possible pour les communes qui ont déjà transféré les compétences : les transferts déjà effectués ne seront pas remis en cause.

- Le texte consacre le caractère sécable de la compétence assainissement, en distinguant l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif. Cela signifie qu'une commune qui a

transféré à l'intercommunalité une partie seulement de la compétence sera libre de transférer ou non l'autre partie de cette compétence à compter de la promulgation de la loi.

- La loi précise aussi qu'une commune ayant conservé l'exercice des compétences eau et assainissement peut réaliser, avec l'EPCI et les communes du bassin versant, des études sur la gestion de la ressource en eau et sur la sécurité du service.
- Le texte sécurise en outre la possibilité pour les gestions des compétences "eau" et "assainissement" de créer de nouveaux syndicats afin d'en mutualiser l'exercice. L'article 1 complète ainsi l'article L.5111-6 du code général des collectivités territoriales, qui subordonne l'autorisation par le préfet de la création de syndicats de communes et de syndicats mixtes à leur compatibilité avec le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI), afin d'exonérer les syndicats compétents en matière d'eau ou d'assainissement d'une telle exigence de compatibilité.
- Enfin, le texte inscrit dans la loi la possibilité pour les communes de se fournir mutuellement de l'eau en cas de pénurie. Lorsqu'une telle pénurie intervient pour la première fois sur une période de cinq ans, l'article 4 prévoit que les volumes d'eau fournis par la commune donatrice pourront être déduits du calcul des redevances liées à l'eau potable.

Par ailleurs, la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 (JO du 25 mars 2025) pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture ajoute au code général des collectivités territoriales (CGCT) des articles L. 2224-7-8 et L. 2224-7-9 : le département peut recevoir un mandat de maîtrise d'ouvrage, conclu à titre gratuit, en vue de la production, du transport et du stockage d'eau destinée à la consommation humaine (EDCH) ou en vue de l'approvisionnement en eau, confié par l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent.

Modifications de l'instruction budgétaire et comptable M4

L'instruction budgétaire et comptable M4, applicable aux services publics industriels et commerciaux, a été modifiée à compter du 1er janvier 2026 par un arrêté du 30 décembre 2025 (JO du 31 décembre 2025) pour tenir compte des évolutions réglementaires et/ou législatives intervenues au cours de l'exercice 2025, notamment les dispositions législatives résultant de la publication de l'ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 relative à la généralisation du compte financier unique.

Adaptation du droit français au droit de l'Union européenne

La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (dite loi "DDADUE") introduit plusieurs évolutions substantielles susceptibles d'intéresser les collectivités territoriales et leurs délégataires. Parmi celles-ci, on retiendra notamment :

S'agissant d'abord des actions de groupe, l'article 16 de la loi DDADUE procède à une refonte d'ensemble du régime applicable. Ce dispositif, qui permet à un demandeur unique de porter un recours pour le compte d'un groupe défini, était jusqu'alors éclaté en sept cadres procéduraux distincts. Il fait désormais l'objet d'une unification, à l'exception du domaine de la santé publique. Cette réforme élargit le cercle des entités habilitées à agir : outre les associations agréées, les organisations syndicales représentatives et les syndicats agricoles, les associations non agréées justifiant de deux années d'activité peuvent désormais solliciter la cessation d'un manquement. La loi institue par ailleurs des tribunaux judiciaires spécialisés, crée une amende civile destinée à sanctionner les comportements intentionnels à l'origine de dommages sériels, et prévoit la constitution d'un fonds dédié au financement de ces actions ainsi que la tenue d'un registre public par le ministère de la Justice. Le décret n°2025-1191 du 10 décembre 2025 précise les modalités d'application de ces dispositions en encadrant les conditions de délivrance, de renouvellement et de retrait des agréments permettant aux associations d'introduire une action de groupe. Il confie cette compétence à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et fixe les obligations de transparence financière en cas de financement par des tiers afin de prévenir les conflits d'intérêts dans l'introduction ou la conduite d'une telle action.

En outre, l'article 23 de la loi DDADUE modifie substantiellement le régime applicable aux espèces protégées. Aux termes de cette nouvelle disposition, un porteur de projet est dispensé de déposer une demande de dérogation « espèces protégées » dès lors que deux conditions cumulatives sont réunies : d'une part, les mesures d'évitement et de réduction proposées doivent réduire le risque d'atteinte à tel point qu'il ne soit pas suffisamment caractérisé ; d'autre part, un dispositif de suivi de ces mesures doit être intégré au projet

afin de garantir leur efficacité et de permettre, le cas échéant, la mise en œuvre de toute mesure supplémentaire nécessaire. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 29 avril 2025, a confirmé la conformité de ce dispositif dérogatoire à la Constitution.

Vers une politique européenne de résilience hydrique

Dans sa recommandation 2025/1179 du 4 juin (JOUE du 16 juin 2025), la Commission européenne fixe sa stratégie de résilience hydrique.

A l'instar du plan Eau adopté par la France en mars 2023, la Commission reconnaît qu'« *il est grand temps de placer la résilience de l'eau au cœur de l'agenda politique ».* Ce faisant, la Commission identifie trois objectifs prioritaires sur ce chemin : la restauration et la protection du cycle de l'eau pour garantir un approvisionnement durable en eau, la garantie d'accès à une eau de qualité et à l'assainissement de manière abordable mais également la construction d'une économie de l'eau qui soutient la compétitivité de l'UE.

Ce texte, non réglementaire, annonce un objectif d'amélioration de l'efficacité hydrique de 10% à l'horizon 2030 et dresse les lignes directrices d'une politique générale qui sera reprise dans les directives sectorielles à venir.

Protection des masses d'eau

La Commission européenne a adopté, le 28 février 2025, **la décision d'exécution 2025/439 actualisant la liste de vigilance des substances susceptibles de présenter un risque pour l'environnement aquatique**, en application de la directive 2008/105/CE. Cette liste impose aux États membres de surveiller certaines substances afin d'évaluer leur inscription éventuelle sur la liste des substances prioritaires, lesquelles sont soumises à des normes de qualité environnementale strictes. Cette décision remplace celle du 22 juillet 2022. Seize substances sont retirées de la liste après quatre années de surveillance, parmi lesquelles le sulfaméthoxazole, la venlafaxine et plusieurs fongicides. Plusieurs substances sont maintenues en raison de l'insuffisance de données disponibles, notamment le fipronil, la metformine et certains agents de protection solaire. De nouvelles substances intègrent la liste, dont l'octisalate, la 6PPD, l'abamectine, des antifongiques azolés, l'étoxazole, la fluoxétine, le propranolol et les antibiotiques oxytétracycline et tétracycline.

La Circulaire du 16 juin 2025 (BO du 1er juillet 2025) a pour objet de demander aux préfets coordonnateurs de bassin d'engager la révision des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d'origine agricole dans le cadre des dispositions du code de l'environnement.

La directive européenne "nitrates" de 1991 prévoit en effet un réexamen au moins tous les quatre ans de la liste des zones vulnérables afin de tenir compte de l'évolution des pollutions des masses d'eau par les nitrates d'origine agricole. En France, cette désignation est réalisée au niveau des bassins hydrographiques, sous la responsabilité des préfets coordonnateurs de bassin. Les mesures applicables dans ces zones sont, quant à elles, définies au niveau national, ainsi qu'au niveau régional sous l'égide des préfets de région. La dernière désignation des zones vulnérables a été conduite en 2020-2021 pour entrer en vigueur à partir de la campagne culturale 2021-2022. La révision des ZV devra être finalisée pour une signature des arrêtés au plus tard le 31 mars 2026.

Simplification du droit de l'environnement

Le décret n° 2025-804 du 11 août 2025 porte diverses mesures dites de « simplification du droit de l'environnement ».

Une disposition majeure concerne la durée de validité des inventaires faune-flore réalisés dans le cadre de l'évaluation environnementale des projets. Le nouvel article R. 411-21-4 du code de l'environnement fixe désormais cette durée à cinq ans, contre trois ans selon la doctrine administrative antérieure. Ainsi, les inventaires devront avoir été achevés ou actualisés moins de cinq ans avant la date de dépôt du dossier pour lequel ils sont requis. Ces inventaires sont nécessaires pour la description de l'état initial dans les études d'impact, l'évaluation des incidences notables, directes et indirectes dans les études d'incidence des projets, ainsi que dans le cadre des demandes de dérogations relatives aux espèces protégées. L'autorité compétente conserve la faculté d'exiger des compléments ou actualisations si de nouveaux enjeux écologiques apparaissent.

Le décret instaure par ailleurs une procédure dématérialisée pour la transmission des déclarations et rapports d'accidents ou d'incidents concernant les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Il consacre également le principe du « silence vaut rejet » à l'issue d'un délai de trois mois pour les décisions

relatives aux demandes de dispense d'évaluation environnementale fondées sur le III de l'article 27 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, lequel prévoit un régime dérogatoire pour les raccordements liés à des projets de transition énergétique sur des sites listés par voie réglementaire. Enfin, parmi les autres mesures introduites, le décret procède à une mise en cohérence des zones pouvant faire l'objet de servitudes d'utilité publique et des formats sur la cartographie des phénomènes dangereux.

Sécurité sanitaire des eaux de piscines et des baignades artificielles

Trois textes publiés au JO du 24 décembre 2025 sont venus modifier le cadre réglementaire applicable à la sécurité sanitaire des eaux de piscines et des baignades artificielles.

Le décret 2025-1285 met en conformité les dispositions du Code de la Santé Publique relatives à la sécurité sanitaire des eaux des piscines, notamment aux produits et procédés de traitement, avec la procédure d'approbation des substances actives biocides réalisée au niveau européen au titre du règlement n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (désinfectants).
Un premier arrêté du 19 décembre 2025 relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines porte la disposition emblématique de cette réforme, à savoir, la possibilité d'adapter la fréquence des vidanges complètes des bassins en fonction de la qualité réelle de l'eau, au lieu de la vidange annuelle obligatoire. Cette nouvelle approche permettra le maintien d'une eau propre et saine pour tous les usagers tout en réduisant les temps de fermeture des piscines, en allégeant les charges des collectivités et en préservant les ressources en eau.
Un second arrêté, également en date du 19 décembre 2025, modifie les modalités de réalisation du programme d'analyses de la qualité de l'eau des piscines ainsi que les limites et références de qualité des baignades artificielles.

6.4. ASSURANCES

Dans le cadre de ses obligations contractuelles, Veolia a souscrit aux polices d'assurance suivantes :

- **Assurance de responsabilité civile** : cette assurance couvre Veolia des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile, quel qu'en soit le fondement juridique, que Veolia est susceptible d'encourir vis-à-vis des tiers à raison des dommages corporels, matériels et immatériels qui trouvent leur origine dans l'exécution de ses obligations.
- **Assurance de dommages aux biens :** cette assurance est souscrite par Veolia pour son propre compte. Elle a pour objet de garantir les biens affermés contre les dommages résultant de l'exploitation du service.

L'ensemble de ces attestations d'assurance est disponible sur simple demande de la Collectivité.

6.5. CERTIFICATS ISO

afaq
AFNOR CERTIFICATION

Certificat
Certificate

N° 2015/69288.12 **Page 1 / 9**

AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par :
AFNOR Certification certifies that the management system implemented by:

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

pour les activités suivantes :
for the following activities:

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU POTABLE ET D'EAU DE PROCESS.
COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES. ACCUEIL ET SERVICE AUX CONSOMMATEURS.

DRINKING WATER AND PROCESS WATER PRODUCTION AND DISTRIBUTION.
WASTEWATER COLLECTION AND TREATMENT. CUSTOMER SERVICE.

a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
has been assessed and found to meet the requirements of:

ISO 50001 : 2018

et est déployé sur les sites suivants :
and is developed on the following locations:

Adresse	N° SIREN
21 RUE LA BOETIE FR-75008 PARIS	572025526

Liste complémentaire des sites certifiés en annexe / *Complementary list of certified locations on appendix*

(L'ensemble des activités de l'entreprise sur le(s) site(s) donné(s) est couvert par la certification)
(The scope of certification covers all activities carried out on the above-mentioned location(s))

Ce certificat est valable à compter du (année/mois/jour) *This certificate is valid from (year/month/day)* **2024-11-11** Jusqu'au *until* **2027-11-10**

Ce document est signé électroniquement. Il constitue un original électronique à valeur probatoire.
This document is electronically signed. It stands for an electronic original with probationary value.

Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification

Flashez ce QR Code pour vérifier la validité du certificat

Seul le certificat électronique, consultable sur www.afnor.org, fait foi en temps réel de la certification de l'organisme.
The electronic certificate only, available at www.afnor.org, attests in real-time that the company is certified.
Accréditation COFRAC n°4-0001, Certification de Systèmes de Management, Portée disponible sur www.cofrac.fr.
COFRAC accreditation n°4-0001, Management Systems Certification, Scope available on www.cofrac.fr.
AFAQ est une marque déposée. *AFAQ is a registered trademark.* CERTI F 1461.5 12/2020

11 rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex - France - T. +33 (0)1 41 62 80 00 - F. +33 (0)1 49 17 90 00
SAS au capital de 18 187 000 € - 479 076 002 RCS Bobigny - www.afnor.org

afnor CERTIFICATION

Certificat
Certificate

N° 2015/69287.11

AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par :
AFNOR Certification certifies that the management system implemented by:

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

pour les activités suivantes :
for the following activities:

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU POTABLE & D'EAU DE PROCESS.
COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES. ACCUEIL ET SERVICE AUX CONSOMMATEURS.

DRINKING WATER & PROCESS WATER PRODUCTION AND DISTRIBUTION.
WASTEWATER COLLECTION AND TREATMENT. CUSTOMER SERVICE.

a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
has been assessed and found to meet the requirements of:

ISO 9001 : 2015

et est déployé sur les sites suivants :
and is developed on the following locations:

21 RUE LA BOETIE FR-75008 PARIS

Liste des sites certifiés en annexe(s) / *List of certified locations on appendix(ces)*

Ce certificat est valable à compter du (année/mois/jour) *This certificate is valid from (year/month/day)* **2024-11-10** Jusqu'au *Until* **2027-11-09**

Ce document est signé électroniquement. Il constitue un original électronique à valeur probatoire.
This document is electronically signed. It stands for an electronic original with probationary value.

Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification

Flashez ce QR Code pour vérifier la validité du certificat

Seul le certificat électronique, consultable sur www.afnor.org, fait foi en temps réel de la certification de l'organisme. *The electronic certificate only, available at www.afnor.org, attests in real-time that the company is certified.* Accréditation COFRAC n° 4-0001, Certification de Systèmes de Management. Portée disponible sur www.cofrac.fr. *COFRAC accreditation n° 4-0001, Management Systems Certification, Scope available on www.cofrac.fr*
AFAQ est une marque déposée. *AFAQ is a registered trademark* - CERTI F 0956.9./07-2020

11 rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex - France - T. +33 (0)1 41 62 80 00 - F. +33 (0)1 49 17 90 00
SAS au capital de 18 187 000 € - 479 076 002 RCS Bobigny - **www.afnor.org**

Certificat
Certificate

N° 2015/69286.11

AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par :
AFNOR Certification certifies that the management system implemented by:

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

pour les activités suivantes :
for the following activities:

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU POTABLE & D'EAU DE PROCESS.
COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES. ACCUEIL ET SERVICE AUX CONSOMMATEURS.

DRINKING WATER & PROCESS WATER PRODUCTION AND DISTRIBUTION.
WASTEWATER COLLECTION AND TREATMENT. CUSTOMER SERVICE.

a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
has been assessed and found to meet the requirements of:

ISO 14001 : 2015

et est déployé sur les sites suivants :
and is developed on the following locations:

21 RUE LA BOETIE FR-75008 PARIS

Liste des sites certifiés en annexe(s) / *List of certified locations on appendix(ces)*

Ce certificat est valable à compter du (année/mois/jour) *This certificate is valid from (year/month/day)* **2024-11-10** Jusqu'au *Until* **2027-11-09**

Ce document est signé électroniquement. Il constitue un original électronique à valeur probatoire.
This document is electronically signed. It stands for an electronic original with probationary value.

Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification

Flashez ce QR Code pour vérifier la validité du certificat

Seul le certificat électronique, consultable sur www.afnor.org, fait foi en temps réel de la certification de l'organisme. *The electronic certificate only, available at www.afnor.org, attests in real-time that the company is certified.* Accréditation COFRAC n° 4-0001, Certification de Systèmes de Management. Portée disponible sur www.cofrac.fr. *COFRAC accreditation n° 4-0001, Management Systems Certification, Scope available on www.cofrac.fr*
AFAQ est une marque déposée. *AFAQ is a registered trademark* - CERTI F 0956.9./07-2020

11 rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex - France - T. +33 (0)1 41 62 80 00 - F. +33 (0)1 49 17 90 00
SAS au capital de 18 187 000 € - 479 076 002 RCS Bobigny - www.afnor.org

6.6. AUTRES ANNEXES

6.7. GLOSSAIRE

Le présent glossaire est établi sur la base des définitions de l'arrêté du 2 mai 2007 et de la circulaire n°12/DE du 28 avril 2008 et de compléments jugés utiles à la compréhension du document.

Abonnement :
L'abonnement désigne le contrat qui lie l'abonné à l'opérateur pour la prestation du service de l'eau ou de l'assainissement conformément au règlement du service. Il y a un abonnement pour chaque point d'accès au service (point de livraison d'eau potable ou de collecte des effluents qui dessert l'abonné, ou installation d'assainissement non collectif).

Assiette de la redevance d'assainissement :
Volume total facturé aux usagers du service.

Arrêté d'autorisation de déversement :
Arrêté autorisant le déversement signé par la collectivité compétente en matière de collecte des eaux usées au lieu où sont rejetés les effluents du bénéficiaire de l'arrêté.

Bilans disponibles :
Sur une usine de dépollution, les bilans disponibles sont les bilans 24h réalisés, exception faite des bilans inutilisables.

Capacité épuratoire :
Capacité de traitement des ouvrages d'épuration donnée par le constructeur. Elle s'exprime en capacité épuratoire (kg de DBO5/jour) et en capacité hydraulique (m3/jour) ou en équivalent-habitants.

Certification ISO 14001 :
Cette norme concerne le système de management environnemental. La certification s'applique aux aspects environnementaux que Veolia Eau peut maîtriser et sur lesquels il est censé avoir une influence. Le système vise à réduire les impacts liés à nos produits, activités et services sur l'environnement et à mettre en place des moyens de prévention des pollutions, en s'intéressant à la fois aux ressources et aux sous-produits du traitement dans le respect de la législation en vigueur et la perspective d'une amélioration continue.

Certification ISO 9001 :
Cette norme concerne le système de management de la qualité. La certification ISO 9001 traduit l'engagement de Veolia Eau à satisfaire les attentes de ses clients par la qualité des produits et des services proposés et l'amélioration continue de ses performances.

Certification ISO 50001 :
Cette norme concerne le système de management de l'énergie. Ce système traduit l'engagement de Veolia eau à analyser ses usages et ses consommations énergétiques pour privilégier la performance énergétique dans le respect de la législation en vigueur et la perspective d'une amélioration continue.

Certification ISO 45001:
Cette norme concerne le système de management de la santé et de la sécurité au travail.

Consommateur – abonné (client) :
Le consommateur abonné est une personne physique ou morale ayant souscrit un ou plusieurs abonnements auprès de l'opérateur du service public (par exemple service de l'eau, de l'assainissement, etc..). Il est par

définition desservi par l'opérateur. Il peut être titulaire de plusieurs abonnements, en des lieux géographiques distincts appelés points de service et donc avoir plusieurs points de service. Pour distinguer les services, on distingue les consommateurs eau, les consommateurs assainissement collectif et les consommateurs assainissement non collectif. Il perd sa qualité de consommateur abonné à un point de service donné lorsque le service n'est plus délivré à ce point de service, de façon définitive, quelle que soit sa situation vis-à-vis de la facturation (il n'est plus desservi, mais son compte peut ne pas encore être soldé). Pour Veolia, un consommateur abonné correspond à un abonnement : le nombre de consommateurs abonnés est égal au nombre d'abonnements.

Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales issues de la Directive sur les Eaux Résiduaires Urbaines (DERU - 1991) [P203.3] :
Cet indicateur permet d'évaluer la conformité du réseau de collecte d'un service d'assainissement, au regard des dispositions règlementaires issues de la DERU.
En attente de la publication de la fiche indicateur sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : http://services.eaufrance.fr/

Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales issues de la de la Directive sur les Eaux Résiduaires Urbaines (DERU - 1991) [P204.3] :
Cet indicateur permet d'évaluer la conformité des équipements de l'ensemble des stations d'épuration d'un service d'assainissement, au regard des dispositions règlementaires issues de la DERU.
En attente de la publication de la fiche indicateur sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : http://services.eaufrance.fr/

Conformité de la performance des ouvrages d'épuration du service aux prescriptions nationales issues de la Directive sur les Eaux Résiduaires Urbaines (DERU - 1991) [P205.3] :
Cet indicateur permet d'évaluer la conformité de la performance de l'ensemble des stations d'épuration d'un service d'assainissement, au regard des dispositions règlementaires issues de la DERU.
En attente de la publication de la fiche indicateur sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : http://services.eaufrance.fr/

Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel [P 254.3] :
Cet indicateur permet de mesurer le pourcentage de bilans 24h conformes de l'ensemble des stations d'épuration d'un service d'assainissement, au regard des prescriptions d'autosurveillance du ou des arrêtés préfectoraux d'autorisation de traitement
Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : http://services.eaufrance.fr/

Conformité réglementaire des rejets :
Il s'agit de la conformité des rejets aux prescriptions réglementaires (nationales ou locales par arrêté préfectoral).

DBO5 :
Demande biochimique en oxygène pendant 5 jours. La DBO5 est l'un des paramètres de caractérisation d'une eau usée.

DCO :
Demande chimique en oxygène. La DCO est l'un des paramètres de caractérisation d'une eau usée.

Développement durable :

Le rapport Brundtland a défini en 1987 la notion de développement durable comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ». La conférence de Rio de 1992 a popularisé cette définition de développement économique efficace, équitable et soutenable, et celle de programme d'action ou « Agenda 21 ». D'autres valeurs sont venues compléter ces notions initiales, en particulier être une entreprise responsable, respecter les droits humains, assurer le droit des habitants à disposer des services essentiels, favoriser l'implication de la société civile, faire face à l'épuisement des ressources et s'adapter aux évolutions climatiques.

Les Objectifs du Développement Durable (ODD) de l'agenda 2030 sont un ensemble de 17 objectifs établis en 2015 par les Nations Unies et concernent tous les pays (développés et en voie de développement), dont l'objectif 6 : Garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement.
Ces nouveaux objectifs succèdent aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD de 2000 à 2015) pour réduire la pauvreté dans les pays en voie de développement (à ce titre Veolia a contribué à l'accès de 6,5 millions de personnes à l'eau potable et a raccordé près de 3 millions de personnes aux services d'assainissement dans les pays émergents).

Equivalent-habitant :
Il s'agit d'une unité de mesure de la pollution. Un équivalent-habitant correspond au flux journalier moyen de pollution produit par un habitant, soit 60 grammes de DBO5 par jour.

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées [P202.2] :
Cet indicateur évalue, sur une échelle de 0 à 120 points, à la fois :

- le niveau de connaissance du réseau et des branchements
- et l'existence d'une politique de renouvellement pluriannuelle du service d'assainissement collectif.

L'échelle est de 0 à 110 points pour les services n'exerçant pas la mission de collecte.
Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : http://services.eaufrance.fr/

Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte [P255.3] :
Cet indicateur permet de mesurer, sur une échelle de 0 à 120 points, le niveau d'implication du service d'assainissement dans la connaissance et le suivi des rejets directs par temps sec et par temps de pluie (hors pluies exceptionnelles des réseaux de collecte des eaux usées au milieu naturel (rejets des déversoirs d'orage, trop-pleins des postes de refoulement, des bassins de pollution…).
Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : http://services.eaufrance.fr/

Matières sèches (boues de dépollution) :
Matières résiduelles après déshydratation complète des boues, mesurées en tonnes de MS.

MES :
Matières en suspension. Les MES sont l'un des paramètres de caractérisation d'une eau usée.

Nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif (Estimation du) [D201.0] :
Le nombre d'habitants desservis correspond à la population disposant d'un accès ou pouvant accéder au réseau d'assainissement collectif, que cette population soit permanente ou présente une partie de l'année seulement. Il s'agit de la population totale (avec 'double compte') desservie par le service, estimée par défaut à partir des populations authentifiées annuellement par décret pour les communes du service et des taux de couverture du service sur ces communes. Conformément à la réglementation en vigueur, l'exercice de l'année N donne le recensement de l'année N-3.

Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau [P252.2] :
L'indicateur recense, pour 100 km de réseau d'assainissement, le nombre de sites d'intervention, dits "points noirs", nécessitant au moins deux interventions par an pour entretien (curage, lavage, mise en sécurité).
Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : http://services.eaufrance.fr/

Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration [D203.0] :
Cet indicateur évalue, en tonnes de matière sèche, la quantité de boues évacuées par la ou les stations d'épuration.
Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : http://services.eaufrance.fr/

Réseau de collecte des eaux usées :
Ensemble des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant de manière gravitaire ou sous pression les eaux usées et unitaires issues des abonnés, du domaine public ou d'autres services de collecte jusqu'aux unités de dépollution. Il est constitué de la partie publique des branchements, des canalisations de collecte, des canalisations de transport, des ouvrages et équipements hydrauliques.

Station d'épuration (ou usine de dépollution) :
Ensemble des installations chargées de traiter les eaux collectées par le réseau de collecte des eaux usées avant rejet au milieu naturel et dans le respect de la réglementation (appelée aussi usine de traitement, STEP).

Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation [P206.3] :
Cet indicateur mesure la proportion des boues évacuées par l'ensemble des stations d'épuration d'un service d'assainissement, et traitées ou valorisées conformément à la réglementation.
Une filière est dite « conforme » si la filière de traitement est déclarée ou autorisée selon sa taille et si le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur. Les refus de dégrillage et les boues de curage ne sont pas pris en compte.
Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : http://services.eaufrance.fr/

Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif [P301.3] :
Cet indicateur évalue le pourcentage d'installations d'assainissement non collectif conformes, après contrôle, à la réglementation sur l'ensemble des installations contrôlées depuis la création du service. L'indicateur traduit la proportion d'installations d'assainissement non collectif ne nécessitant pas de travaux urgents à réaliser. Il s'agit du ratio correspondant à la somme du nombre d'installations neuves ou à réhabiliter contrôlées conformes à la réglementation et du nombre d'installations existantes qui ne présentent pas de danger pour la santé des personnes ou de risque avéré de pollution de l'environnement rapportée au nombre total d'installations contrôlées (arrêté du 2 décembre 2013).
Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : http://services.eaufrance.fr/

Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers [P251.1] :
Cet indicateur mesure le nombre de demandes d'indemnisation suite à un incident dû à l'impossibilité de rejeter les effluents dans le réseau public de collecte des eaux usées (débordement/inondation dans la partie

privée), rapporté à 1 000 habitants desservis. Les débordements résultant d'une obstruction du réseau due à l'usager ne sont pas pris en compte.
Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : http://services.eaufrance.fr/

Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées [P201.1] :
Cet indicateur précise le pourcentage d'abonnés raccordables et raccordés au réseau d'assainissement, par rapport au nombre d'abonnés résident en zone d'assainissement collectif.

Taux d'impayés [P257.0] :
Il correspond au taux d'impayés au 31/12 de l'année N sur les factures émises au titre de l'année N-1. Le montant facturé au titre de l'année N-1 comprend l'ensemble de la facture, y compris les redevances prélèvement et pollution, la taxe Voies Navigables de France et la TVA liée à ces postes. Pour une facture donnée, les montants impayés sont répartis au prorata hors taxes et redevances de la part « eau » et de la part « assainissement ». Sont exclues les factures de réalisation de branchements et de travaux divers. (Arrêté du 2 mai 2007)

Taux de réclamations [P258.1] :
Ces réclamations peuvent être reçues par l'opérateur ou directement par la collectivité. Un dispositif de mémorisation et de suivi des réclamations écrites est mis en œuvre. Le taux de réclamations est le nombre de réclamations écrites rapporté au nombre d'abonnés divisé par 1 000. Sont prises en compte les réclamations relatives à des écarts ou à des non-conformités vis-à-vis d'engagements contractuels, d'engagements de service, notamment au regard du règlement de service, ou vis-à-vis de la réglementation, à l'exception de celles relatives au niveau de prix. (Arrêté du 2 mai 2007)



Veolia
30 rue Madeleine Vionnet • 93300 Aubervilliers
www.veolia.com
